PT. Len Industri (Persero)	Halaman: 1 dari 18
POP-101 **PENETAPAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI**	Revisi: 16

Disiapkan Oleh:		Disetujui Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua GM Business Process Management T. Tangan/Tgl. : 26-01-2024 (Syafrudin)	**Anggota Tim** SGM Supply Chain Management T. Tangan/Tgl. : 29/1/2024 (Priono Joni Hartanto) GM Legal T. Tangan/Tgl. : 29/01/2024 (Amalul Arifin)	Management Representative T. Tangan/Tgl. : 01-02-2024 (Nurman Setiawan)	Direktur Operasi T. Tangan/Tgl. : 02-02-2024 (Tazar Marta Kurnlawan)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
04	26-06-2006	Semua Halaman	WJ
05	27-02-2008	Halaman 1 dan 4	WJ
06	01-09-2009	Semua halaman	AP
07	08-07-2010	Poin 5.2 dan 5.3	AP
08	28-03-2013	Halaman 4, 5, dan 6	NH
09	10-03-2014	Halaman 5	NH
10	31-05-2018	Semua Halaman	YA
11	30-01-2019	Semua Halaman	YS
12	11-05-2020	Semua Halaman	YS
13	04-09-2020	Halaman 5 dan 6	YS
14	08-07-2021	Halaman 1, 3-5, 9-15	YS & YA
15	01-08-2022	Halaman 1,3,8-16	FA
16	02-02-2023	Halaman 4-7,10-14	FA

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI **1**
DAFTAR ISI **2**
1.0 TUJUAN **3**
2.0 RUANG LINGKUP **3**
3.0 DEFINISI **3**
3.1 Perusahaan 3
3.2 Harga Perkiraan Sendiri 3
3.3 Barang 3
3.4 Pekerjaan Konstruksi 3
3.5 Jasa Konsultansi 3
3.6 Jasa Lainnya 4
3.7 Rencana Kerja dan Anggaran Operasional (RKAO) 4
3.8 Informasi Marketing 4
3.9 Proyek 4
3.10 Pengadaan Proyek 4
3.11 Penelitian dan Pengembangan 4
3.12 Pengadaan Penelitian dan Pengembangan 5
3.13 Produk *Resale* 5
3.14 Produk Ritel 5
3.15 Pengadaan Persediaan Produk *Resale*/Ritel 5
3.16 Aset 5
3.17 Pengadaan Investasi 5
3.18 Investasi Proyek 6
3.19 Investasi Penelitian dan Pengembangan 6
3.20 Investasi Rutin 6
3.21 Pengadaan Rutin 6
3.22 Perencanaan Pengadaan 6
4.0 DOKUMEN TERKAIT **6**
5.0 PROSEDUR **7**
5.1 Ketentuan Penggunaan HPS 7
5.2 Penyusunan HPS 7
5.2.1 HPS untuk Pengadaan Baru 8
5.2.2 Penyusunan HPS untuk Pengadaan Berulang 10
5.3 Penetapan HPS 10
5.4 Persetujuan Kenaikan HPS 11
6.0 FORMULIR TERKAIT **12**
7.0 FLOWCHART **13**
LAMPIRAN **14**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

1.0 TUJUAN

Perusahaan mempunyai harga perkiraan (estimasi/standar) untuk mendapatkan harga pembelian yang wajar.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya di lingkungan Perusahaan.

3.0 DEFINISI

3.1 Perusahaan

Perusahaan adalah PT Len Industri (Persero), suatu Badan Usaha Milik Negara yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 442, Bandung.

3.2 Harga Perkiraan Sendiri

Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perkiraan harga barang/jasa yang disusun oleh Fungsi Perencanaan Pengadaan dengan melibatkan Unit Kerja Terkait dengan memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai serta berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.3 Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

3.4 Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan dan wujud fisik lainnya.

3.5 Jasa Konsultansi

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

3.6 Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang.

3.7 Rencana Kerja dan Anggaran Operasional (RKAO)

RKAO adalah dokumen perusahaan yang memuat rencana aktivitas Perusahaan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas tersebut pada periode tahun berjalan (1 tahun).

3.8 Informasi Marketing

Informasi Marketing adalah sekumpulan informasi/data yang didapatkan oleh perusahaan dari pasar terkait mengenai adanya proyek atau pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh instansi/entitas lain pada waktu tertentu.

3.9 Proyek

Proyek adalah kegiatan yang bersifat profit untuk mengerjakan, membangun, atau menghasilkan sesuatu barang/jasa dengan waktu dan sasaran yang ditentukan dari Pelanggan.

3.10 Pengadaan Proyek

Pengadaan Proyek adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk menyelesaikan suatu Proyek yang mengutamakan pada ketepatan waktu penyelesaian dan ketepatan fungsi/sistem sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan oleh Pelanggan serta pelaksanaan berdasarkan Rencana Anggaran Proyek (RAP).

3.11 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan untuk selanjutnya dapat disebut Litbang adalah kegiatan rekayasa dan/atau inovasi teknologi, kajian pengembangan bisnis Perusahaan untuk menghasilkan suatu *Prototype*, Hasil Desain dan/atau Hasil Kajian.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

3.12 Pengadaan Penelitian dan Pengembangan

Pengadaan Penelitian dan Pengembangan adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk kebutuhan Litbang yang mengutamakan pada aspek kesesuaian teknologi dan teknis barang/produk.

3.13 Produk *Resale*

Produk *Resale* adalah produk dari *prinsipal*/penyedia barang yang akan dijual kepada pelanggan tanpa melalui proses produksi atau modifikasi terlebih dahulu oleh Perusahaan.

3.14 Produk Ritel

Produk Ritel adalah produk dari *prinsipal*/penyedia barang atau produk Perusahaan yang akan dijual kepada Pelanggan dengan melalui proses produksi atau modifikasi terlebih dahulu oleh Perusahaan.

3.15 Pengadaan Persediaan Produk *Resale*/Ritel

Pengadaan Persediaan Produk *Resale*/Ritel adalah Pengadaan Produk *Resale* atau pengadaan Barang/material untuk Produk Ritel yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan persediaan Perusahaan pada waktu tertentu.

3.16 Aset

Aset adalah sarana atau sumber daya yang memiliki nilai dan manfaat ekonomi dan diperhitungkan menjadi kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, serta dipergunakan untuk operasional Perusahaan.

3.17 Pengadaan Investasi

Pengadaan Investasi adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk dijadikan aset/inventaris Perusahaan dan/atau untuk peningkatan kapasitas usaha, yang mempunyai manfaat ekonomi baik secara langsung atau tidak langsung, yang dikategorikan dalam pengadaan :

a. Investasi Proyek;
b. Investasi Produksi;
c. Investasi Penelitian dan Pengembangan; dan
d. Investasi Rutin.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

3.18 Investasi Proyek

Investasi Proyek adalah Pengadaan Investasi untuk mendukung pelaksanaan suatu Proyek.

3.19 Investasi Penelitian dan Pengembangan

Investasi Penelitian dan Pengembangan adalah Pengadaan Investasi kebutuhan Litbang Teknologi atau Bisnis untuk menghasilkan suatu *Prototype* dan/atau Hasil Desain dan/atau Hasil Kajian.

3.20 Investasi Rutin

Investasi Rutin adalah Pengadaan Investasi untuk kebutuhan operasional Perusahaan yang akan digunakan oleh Unit Kerja.

3.21 Pengadaan Rutin

Pengadaan Rutin adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan operasional Perusahaan termasuk pengadaan untuk kebutuhan Unit Kerja yang sifat barangnya habis pakai.

3.22 Perencanaan Pengadaan

Perencanaan Pengadaan adalah Proses Perencanaan Pengadaan yang dilakukan oleh Fungsi terkait Perencanaan Pengadaan untuk menyusun kebutuhan Korporasi/Proyek dalam perencanaan anggaran terhadap rencana pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen Perencanaan Pengadaan.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Peraturan Direksi PT Len Industri (Persero) No: 008A/PERDIR/DU/IV/2021 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang/Jasa PT Len Industri (Persero) (Perubahan 2)***
- ***Informasi Terdokumentasi*** (***COP-002***)***;***
- ***Data primer dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

5.0 PROSEDUR

5.1 Ketentuan Penggunaan HPS

Ketentuan penggunaan HPS adalah sebagai berikut :

1. Harga Perkiraan Sendiri ditetapkan menjelang dilaksanakannya proses Pengadaan Barang/Jasa kecuali untuk pengadaan tertentu yang dilakukan tanpa adanya penentuan HPS, yaitu sebagai berikut :
   a. Pengadaan yang HPS nya sulit ditentukan maka dilakukan melalui *beauty contest.*
   b. Pengadaan retail/*resale* sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan Pabrikan atau *Principal.*
2. Harga Perkiraan Sendiri terdiri dari 2 (dua) macam yaitu: harga perkiraan untuk barang/jasa yang dihitung *per item* (satuan) dan/atau harga perkiraan untuk pekerjaan borongan (lumpsum).
3. Pada dokumen HPS, nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rincian harga satuannya bersifat rahasia.
4. HPS dapat digunakan sebagai:
   a) Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
   b) Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan Barang/Jasa.
   c) Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah nilai total HPS.
5. HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Perusahaan.
6. HPS bukan merupakan satu-satunya dasar untuk menggugurkan penawaran.

HPS untuk barang/jasa dituangkan dalam ***formulir Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)***.

5.2 Penyusunan HPS

Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan penetapan proyek pada RKAO atau Informasi Marketing atau Pengumuman Lelang/Penunjukan Langsung dari Pemberi Kerja, atau berdasarkan proses *sourching* dengan *Beauty Contest* atau berdasarkan data Perencanaan Pengadaan/*Procurement Plan* saat pembuatan RAP untuk keperluan Review Order/Review Kontrak. Penyusunan HPS dapat dibedakan menjadi:

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

5.2.1 HPS untuk Pengadaan Baru

Penyusunan HPS untuk Pengadaan Barang/Jasa baru yang belum ada pada *Material Master SAP* atau rekam jejak pembelian/kontrak sebelumnya, didasarkan pada data harga pasar yang diperoleh berdasarkan salah satu survei berikut :

a. *Sourcing*

Metode penyusunan HPS dengan cara *Sourcing* dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

- Unit Kerja terkait (Tim Teknis Proyek atau Anggota Tim Teknis Proyek /Tim Teknis Program atau Anggota Tim Teknis Program/Pengguna Barang/Jasa) memberikan spesifikasi teknis yang lengkap baik barang/jasa kepada Fungsi Perencana Pengadaan.
- Fungsi Perencanaan Pengadaan mengirimkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) kepada **1 (satu) calon penyedia untuk pengadaan di bawah Rp. 200 Juta,** dan **sekurang-kurangnya 2 (dua) calon penyedia untuk pengadaan di atas Rp. 200 Juta.**
  SPPH memuat setidaknya informasi mengenai :
  - Ruang Lingkup Pekerjaan
  - Spesifikasi atau Deskripsi Barang
  - Cara Pembayaran (T/T, SKBDN/LC)
  - Termin Pembayaran
  - Cara Penyerahan (Exwork, CIF/DDP)
  - Waktu Penyerahan
- Menerima Surat Penawaran Harga (SPH).
- Melakukan Evaluasi Penawaran yang meliputi evaluasi teknis dan harga bersama Fungsi Pengadaan.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) diambil dari hasil evaluasi penawaran (poin ketiga sebelumnya).
- Hasil evaluasi dilaporkan ke pejabat pemeriksa HPS
- Hasil *Sourcing* yang telah dievaluasi dituangkan kedalam ***formulir Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023).***
- Mengajukan permohonan pembuatan kode material menggunakan ***formulir Pengajuan Registrasi Master Data Material (PFR-028)*** (untuk pengadaan barang) ke Fungsi Pengadaan, dengan melampirkan salinan ***formulir Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)*** yang telah ditandatangani oleh pejabat terkait. Dokumen

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

asli disimpan oleh Fungsi Terkait sesuai Prosedur ***Informasi Terdokumentasi (COP-002).***

b. Informasi Biaya dari Lembaga Pemerintah

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Lembaga Pemerintah.

c. Informasi Biaya dari Asosiasi

Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Daftar Harga Pabrikan

Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;

e. Kondisi Perekonomian

Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia.

f. Biaya Kontrak/PO

Biaya Kontrak/PO yang telah selesai atau yang sedang berjalan yang sejenis dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya.

g. Hasil Perbandingan Kontrak Sejenis

Hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain.

h. Engineer's Estimate

Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan atau oleh tim teknis perusahaan yang dapat berasal dari tim *project* atau tim program atau tim *engineer*, atau tim yang ditunjuk secara khusus oleh Kepala Kerja fungsi terkait (*Engineer's Estimate*). Hasil perhitungan biaya kemudian disahkan sesuai dengan ketentuan pada **Subbab 5.3** tentang Penetapan HPS.

i. Informasi Lain Yang Dapat Dipertanggungjawabkan

Informasi lainnya yang dipublikasikan secara resmi di media cetak/elektronik terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

5.2.2 Penyusunan HPS untuk Pengadaan Berulang

HPS untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang berulang ditetapkan berdasarkan data harga pembelian terakhir yang dapat terekam dalam sistem SAP maupun informasi terdokumentasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unit Kerja yang terkait dalam Penyusunan HPS bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

5.3 Penetapan HPS

HPS ditetapkan dengan menggunakan formulir ***Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)*** atau formulir ***Procurement Plan (PFR-034)*** berdasarkan klasifikasi nilai sebagai berikut:

a. HPS dengan nilai total pembelian sampai dengan **Rp 1 (satu) Miliar** dengan menggunakan formulir ***Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)*** untuk:
   - Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel; atau Investasi Proyek **Fase Perencanaan**;
   - Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel; atau Investasi Proyek **Fase Pelaksanaan**;
   - Pengadaan Rutin; atau Pengadaan Litbang; atau Pengadaan Investasi Rutin/Litbang.

b. HPS dengan nilai total pembelian **di atas Rp 1 (satu) Miliar sampai dengan Rp 5 (lima) Miliar** dengan menggunakan formulir ***Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)*** untuk:
   - Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel; atau Investasi Proyek **Fase Perencanaan**;
   - Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel; atau Investasi Proyek **Fase Pelaksanaan**;
   - Untuk Pengadaan Rutin; atau Pengadaan Litbang; atau Pengadaan Investasi Rutin/Litbang.

c. HPS dengan nilai total pembelian **di atas Rp 5 (lima) Miliar** dengan menggunakan formulir ***Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)*** untuk:
   - Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel; atau Investasi Proyek **Fase Perencanaan**;

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

- Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel; atau Investasi Proyek **Fase Pelaksanaan**;
- Untuk Pengadaan Rutin; atau Pengadaan Litbang; atau Pengadaan Investasi Rutin/Litbang.

Resume dari uraian klasifikasi penetapan & kenaikan HPS oleh pejabat yang berwenang berdasarkan nilai dapat dilihat pada **Lampiran Penetapan & Kenaikan HPS**.

d. Penetapan HPS dalam proses Tender/Seleksi Umum dilaksanakan secara khusus. HPS disusun oleh Panitia Tender yang selanjutnya ditetapkan oleh Direktur Utama.

e. Penetapan HPS berdasarkan formulir ***Procurement Plan (PFR-034)***, penyusunan formulir ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan RAP Proyek. Formulir ***Procurement Plan (PFR-034)*** disiapkan, diperiksa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan **Lampiran *Procurement Plan***.

Unit Kerja yang menetapkan HPS bertanggung jawab dalam penyimpanan dokumen HPS.

5.4 Persetujuan Kenaikan HPS

Bila pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut melebihi HPS, maka Fungsi Pengadaan dapat menginformasikan perubahan harga barang/jasa tersebut kepada Fungsi Perencanaan Pengadaan menggunakan formulir ***Pemberitahuan Kenaikan HPS (PFR-033)***. Selanjutnya Fungsi Perencanaan Pengadaan dapat melakukan proses Kenaikan HPS dengan menggunakan ***Permohonan Persetujuan Kenaikan Harga (PFR-016).*** Adapun ketentuan kenaikan HPS serupa dengan Penetapan HPS sebagaimana tercantum di dalam **Lampiran Penetapan & Kenaikan HPS**.

Jika kenaikan HPS tidak disepakati maka dilakukan Penetapan Ulang HPS sesuai dengan prosedur pada **Subbab 5.3**.


Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***Permohonan Persetujuan Kenaikan Harga*** (***PFR-016***)
- ***Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)***
- ***Pemberitahuan Kenaikan HPS (PFR-033)***
- ***Procurement Plan (PFR-034)***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

7.0 FLOWCHART

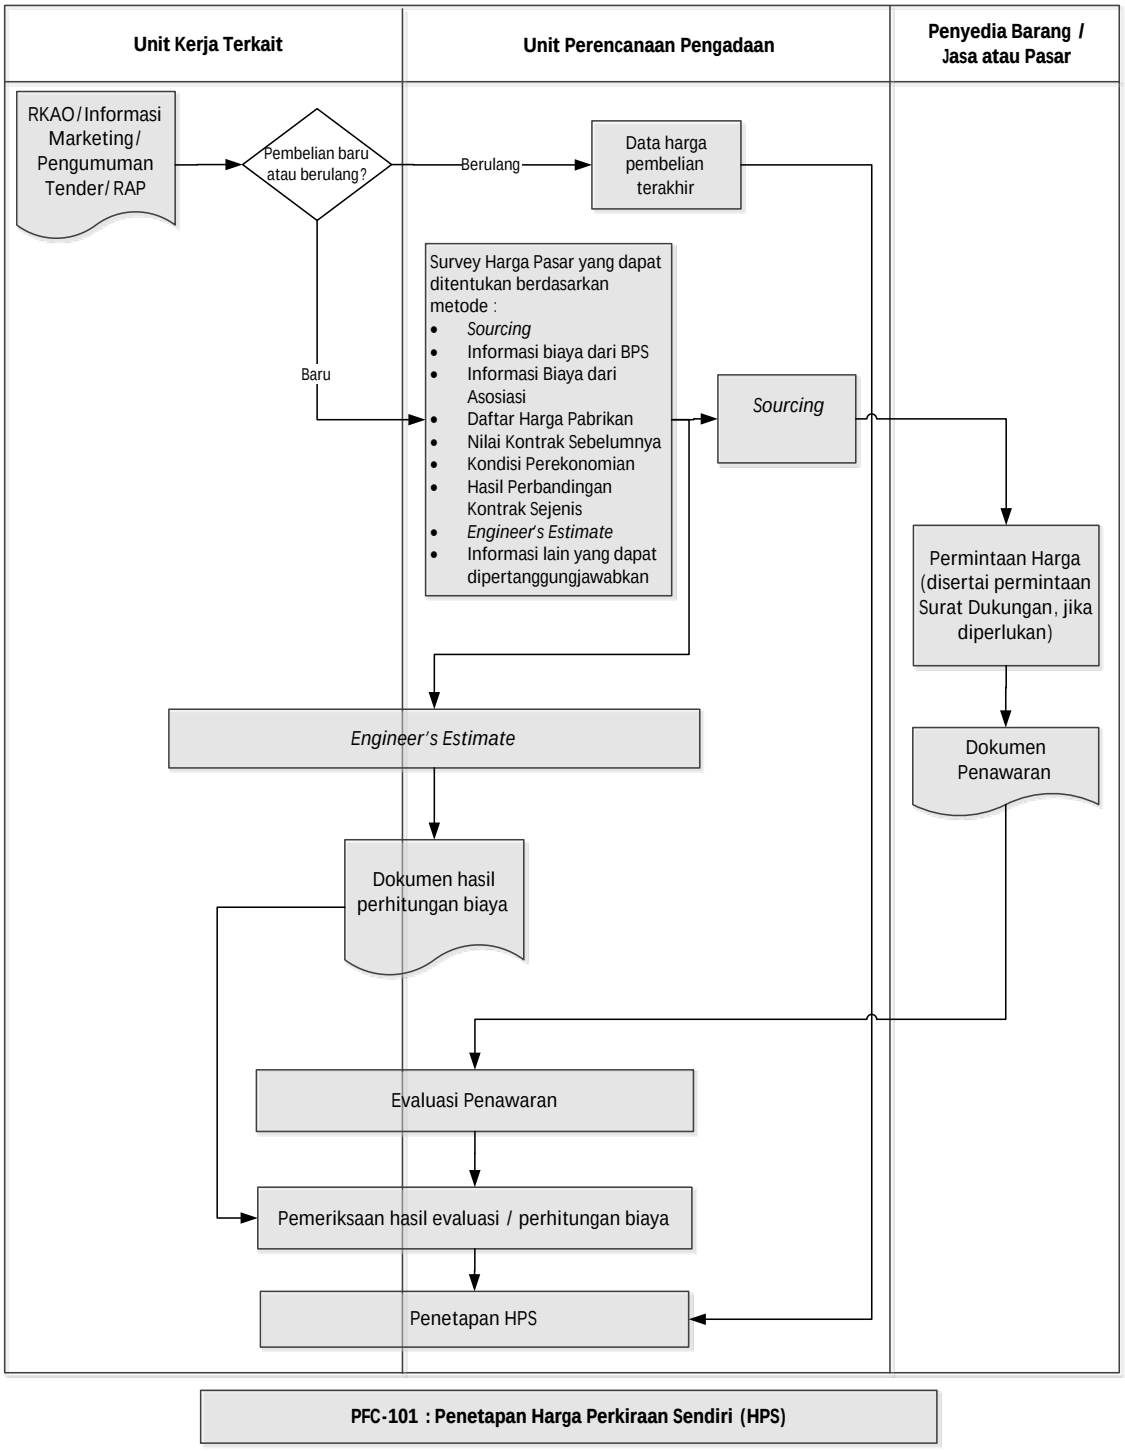

PFC-101 : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

LAMPIRAN

➢ Penetapan dan Kenaikan HPS

Klasifikasi Pengadaan	Jenis HPS	Nilai HPS	Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Ditetapkan Oleh
Pengadaan Proyek/ Persediaan Produk Retail/ Pengadaan Investasi Proyek	Fase Perencanaan	s.d Rp. 1 M	Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan	Es. II Fungsi Perencanaan Proyek	Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan
		Rp. 1 M s.d Rp 5 M	Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan	Es. II FungsiPerencanaan Proyek	Es. I Fungsi Pengadaan
		Di atas Rp 5 M	Es. I Fungsi Pengadaan	Es. I Fungsi Perencanaan Proyek	Direktur yang Membidangi Pengadaan
	Fase Pelaksanaan	s.d Rp. 1 M	Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan	Pimpinan Proyek/Koordinator Program	Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan
		Rp. 1 M s.d Rp 5 M	Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan	Es. II Fungsi Manajemen Proyek	Es. I Fungsi Pengadaan
		Di atas Rp 5 M	Es. I Fungsi Pengadaan	Es. I Fungsi Manajemen Proyek	Direktur yang Membidangi Pengadaan
Pengadaan Rutin/ Litbang dan Pengadaan Investasi Rutin/ Litbang	Semua	s.d Rp. 1 M	Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan	Es. II Unit Kerja Terkait	Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan
		Rp. 1 M s.d Rp 5 M	Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan	Es. I Unit Kerja Terkait	Es. I Fungsi Pengadaan
		Di atas Rp 5 M	Es. I Fungsi Pengadaan	Es. I Unit Kerja Terkait	Direktur yang Membidangi Pengadaan

➢ Penetapan Procurement Plan

Klasifikasi Pengadaan	Jenis HPS	Nilai HPS	Disiapkan Oleh	Diperiksa Oleh	Ditetapkan Oleh
Semua Jenis Pengadaan	Procurement Plan	Semua Nilai Pengadaan	Es. I Fungsi Perencanaan Pengadaan	Es. I Fungsi Perencanaan Proyek	Direktur yang Membidangi Perencanaan Pengadaan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

MATRIKS PERUBAHAN

Dasar Revisi :

- Memorandum 141-M-DO-VI-2023 Mengenai Penyempurnaan Ketentuan Proses Perencanaan Pengadaan

No	Poin Perubahan	POP-101 rev 15 (Lama)	POP-101 rev 16 (Baru)
1	Kolom Validasi (Hal. 1)	Disiapkan Oleh: - Ketua: VP Management System & Business Process Transformation - Anggota Tim: SGM Supply Chain Management; GM Legal & Contract Administration Disetujui Oleh: Management Representative Disahkan Oleh: Direktur Keuangan & SDM	Disiapkan Oleh: - Ketua: VP Business Process Management - Anggota Tim: SGM Supply Chain Management; GM Legal & Contract Administration Disetujui Oleh: Management Representative Disahkan Oleh: Direktur Operasi
2	Bab 3.0 Penghapusan Definisi Pengadaan Produksi (Hal. 4-6)	**3.11 Produksi** Produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang/produk Perusahaan untuk kebutuhan Proyek, Persediaan Produk Ritel, Produksi Massa untuk Produk Pengembangan Bisnis/Usaha, atau Produk Penelitian & Pengembangan. **3.12 Pengadaan Produksi** Pengadaan Produksi adalah Pengadaan Barang/Jasa untuk kebutuhan Produksi yang mengutamakan pada aspek harga, ketersediaan, dan waktu pengiriman (*Delivery Time*). **3.21 Investasi Produksi** Investasi Produksi adalah Pengadaan Investasi untuk kebutuhan Produksi atau peningkatan kapasitas Produksi.	Dihapus

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

<table>
<tr><th>No</th><th>Poin Perubahan</th><th>POP-101 rev 15 (Lama)</th><th>POP-101 rev 16 (Baru)</th></tr>
<tr><td>2</td><td>Bab 3.0
Penambahan Definisi Perencanaan Pengadaan
(Hal. 4-6)</td><td>-</td><td>3.22 Perencanaan Pengadaan
Perencanaan Pengadaan adalah Proses Perencanaan Pengadaan yang dilakukan oleh Fungsi terkait Perencanaan Pengadaan untuk menyusun kebutuhan Korporasi/Proyek dalam perencanaan anggaran terhadap rencana pengadaan Barang/Jasa yang menghasilkan dokumen Perencanaan Pengadaan.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Bab 5.2
Penyesuaian Narasi Penyusunan HPS
(Hal. 7)</td><td>5.2 Penyusunan HPS
Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan penetapan proyek pada RKAO atau Informasi Marketing atau Pengumuman Lelang dari Pemberi Kerja, atau saat pembuatan RAP untuk keperluan Review Order/Review Kontrak.</td><td>5.2 Penyusunan HPS
Penyusunan HPS dilakukan berdasarkan penetapan proyek pada RKAO atau Informasi Marketing atau Pengumuman Lelang/Penunjukan Langsung dari Pemberi Kerja, atau saat pembuatan RAP untuk keperluan Review Order/Review Kontrak atau berdasarkan data Perencanaan Pengadaan/Procurement Plan.</td></tr>
<tr><td></td><td>Bab 5.3
Penyesuaian Jenis HPS
(Hal. 10-11)</td><td>
<table>
<tr><th rowspan="2">Nilai HPS</th><th colspan="6">Klasifikasi Pengadaan</th></tr>
<tr><th colspan="3">Pengadaan Rutin/Produksi/Litbang dan Pengadaan Investasi Rutin/Produksi/Litbang</th><th colspan="3">Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel/Pengadaan Investasi Proyek</th></tr>
<tr><th>Disiapkan oleh</th><th>Diperiksa oleh</th><th>Ditetapkan oleh</th><th>Disiapkan oleh</th><th>Diperiksa oleh</th><th>Ditetapkan oleh</th></tr>
<tr><td>s.d Rp. 1 M</td><td>Staf Unit Pengadaan</td><td>Ka. Unit Es. II terkait</td><td>Ka. Unit Es. II Pengadaan</td><td>Staf Unit Perencanaan Pengadaan Proyek</td><td>Pimpinan Proyek/ Koordinator Program</td><td>Ka. Unit Es. II Perencanaan Pengadaan Proyek</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp. 1 M s.d Rp 5 M</td><td>Ka. Unit Es. II Pengadaan</td><td>Ka. Unit Es. I terkait</td><td>Ka. Unit Es. I Pengadaan</td><td>Ka. Unit Es. II Perencanaan Pengadaan Proyek</td><td>Ka. Unit Es. II terkait</td><td>Ka. Unit Es. I Litbang</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp. 5 M</td><td>Ka. Unit Es. I Pengadaan</td><td>Ka. Unit Es. I terkait</td><td>Direktur Keuangan & SDM</td><td>Ka. Unit Es. I Litbang</td><td>Kepala Unit Eselon I Terkait</td><td>Direktur Teknologi</td></tr>
</table>
</td><td>Penyesuaian narasi untuk penetapan HPS:
<table>
<tr><th>Klasifikasi Pengadaan</th><th>Jenis HPS</th><th>Nilai HPS</th><th>Disiapkan Oleh</th><th>Diperiksa Oleh</th><th>Ditetapkan Oleh</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Pengadaan Proyek/ Persediaan Produk Retail/ Pengadaan Investasi Proyek</td><td rowspan="3">Fase Perencanaan</td><td>s.d Rp. 1 M</td><td>Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Proyek</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Rp. 1 M s.d Rp 5 M</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. II FungsiPerencanaan Proyek</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp 5 M</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td><td>Es. I Fungsi Perencanaan Proyek</td><td>Direktur yang Membidangi Pengadaan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Fase Pelaksanaan</td><td>s.d Rp. 1 M</td><td>Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Pimpinan Proyek/Koordinator Program</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Rp. 1 M s.d Rp 5 M</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. II Fungsi Manajemen Proyek</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp 5 M</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td><td>Es. I Fungsi Manajemen Proyek</td><td>Direktur yang Membidangi Pengadaan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pengadaan Rutin/ Litbang dan Pengadaan Investasi Rutin/ Litbang</td><td rowspan="3">Semua</td><td>s.d Rp. 1 M</td><td>Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. II Unit Kerja Terkait</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Rp. 1 M s.d Rp 5 M</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. I Unit Kerja Terkait</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp 5 M</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td><td>Es. I Unit Kerja Terkait</td><td>Direktur yang Membidangi Pengadaan</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

No	Poin Perubahan	POP-101 rev 15 (Lama)	POP-101 rev 16 (Baru)
4	Bab 5.3 Penyesuaian Jenis HPS (Hal. 10-11)	-	Penyesuaian Jenis HPS: • Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel; atau Investasi Proyek **Fase Perencanaan**; • Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel; atau Investasi Proyek **Fase Pelaksanaan**; • Pengadaan Rutin; atau Pengadaan Litbang; atau Pengadaan Investasi Rutin/Litbang.
5	Bab 5.3 Penambahan Formulir *Procurement Plan* (PFR-034) (Hal. 11)	-	e. Penetapan HPS berdasarkan formulir *Procurement Plan* (PFR-034), penyusunan formulir ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan RAP Proyek. Formulir *Procurement Plan* (PFR-034) disiapkan, diperiksa dan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Lampiran *Procurement Plan*.
6	Bab 5.4 Persetujuan Kenaikan Harga (Hal. 11)	Bila pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk Pengadaan Proyek, harga barang/jasa tersebut melebihi HPS, maka Fungsi Pengadaan dapat menginformasikan perubahan harga barang/jasa tersebut kepada Fungsi Perencanaan Pengadaan Proyek berdasarkan ***formulir Pemberitahuan Kenaikan HPS Proyek (PFR-033)***. Selanjutnya Fungsi Perencana Pengadaan Proyek dapat melakukan proses Kenaikan HPS dengan menggunakan ***formulir Permohonan Persetujuan Kenaikan Harga (PFR-016)***. Kemudian untuk Pengadaan Non-Proyek, maka Fungsi Pengadaan dapat langsung melakukan proses Kenaikan HPS menggunakan ***formulir Permohonan Persetujuan Kenaikan Harga (PFR-016)***.	Bila pada saat pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut melebihi HPS, maka Fungsi Pengadaan dapat menginformasikan perubahan harga barang/jasa tersebut kepada Fungsi Perencanaan Pengadaan menggunakan formulir ***Pemberitahuan Kenaikan HPS (PFR-033)***. Selanjutnya Fungsi Perencanaan Pengadaan dapat melakukan proses Kenaikan HPS dengan menggunakan ***Permohonan Persetujuan Kenaikan Harga (PFR-016).*** Adapun ketentuan kenaikan HPS serupa dengan Penetapan HPS sebagaimana tercantum di dalam **Lampiran Penetapan & Kenaikan HPS**. Jika kenaikan HPS tidak disepakati maka dilakukan Penetapan Ulang HPS sesuai dengan prosedur pada **Subbab 5.3**.
7	Bab 6.0 Penyesuaian	• ***Permohonan Persetujuan Kenaikan Harga*** (***PFR-***	• ***Permohonan Persetujuan Kenaikan Harga*** (***PFR-016***)

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28

<table>
<tr><th>No</th><th>Poin Perubahan</th><th>POP-101 rev 15 (Lama)</th><th>POP-101 rev 16 (Baru)</th></tr>
<tr><td></td><td>Formulir Terkait
(Hal. 12)</td><td>016)
• Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)
• Pemberitahuan Kenaikan HPS Proyek (PFR-033)</td><td>• Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (PFR-023)
• Procurement Plan (PFR-024)</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Flowchart
(Hal. 13)</td><td>-</td><td>Penyesuaian flowchart sesuai dengan isi Prosedur</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Penambahan Lampiran
(Hal. 14)</td><td>Tabel Penetapan dan Kenaikan HPS
<table>
<tr><th rowspan="2">Nilai HPS</th><th colspan="6">Klasifikasi Pengadaan</th></tr>
<tr><th colspan="3">Pengadaan Rutin/Produksi/Litbang dan Pengadaan Investasi Rutin/Produksi/Litbang</th><th colspan="3">Pengadaan Proyek/Persediaan Produk Ritel/Pengadaan Investasi Proyek</th></tr>
<tr><th>Disiapkan oleh</th><th>Diperiksa oleh</th><th>Ditetapkan oleh</th><th>Disiapkan oleh</th><th>Diperiksa oleh</th><th>Ditetapkan oleh</th></tr>
<tr><td>s.d Rp. 1 M</td><td>Staf Unit Pengadaan</td><td>Ka. Unit Es. II terkait</td><td>Ka. Unit Es. II Pengadaan</td><td>Staf Unit Perencanaan Pengadaan Proyek</td><td>Pimpinan Proyek/ Koordinator Program</td><td>Ka. Unit Es. II Perencanaan Pengadaan Proyek</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp. 1 M s.d Rp 5 M</td><td>Ka. Unit Es. II Pengadaan</td><td>Ka. Unit Es. I terkait</td><td>Ka. Unit Es. I Pengadaan</td><td>Ka. Unit Es. II Perencanaan Pengadaan Proyek</td><td>Ka. Unit Es. II terkait</td><td>Ka. Unit Es. I Litbang</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp. 5 M</td><td>Ka. Unit Es. I Pengadaan</td><td>Ka. Unit Es. I terkait</td><td>Direktur Keuangan & SDM</td><td>Ka. Unit Es. I Litbang</td><td>Kepala Unit Eselon I Terkait</td><td>Direktur Teknologi</td></tr>
</table></td><td>➢ Penetapan dan Kenaikan HPS
<table>
<tr><th>Klasifikasi Pengadaan</th><th>Jenis HPS</th><th>Nilai HPS</th><th>Disiapkan Oleh</th><th>Diperiksa Oleh</th><th>Ditetapkan Oleh</th></tr>
<tr><td rowspan="6">Pengadaan Proyek/ Persediaan Produk Retail/ Pengadaan Investasi Proyek</td><td rowspan="3">Fase Perencanaan</td><td>s.d Rp. 1 M</td><td>Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Proyek</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Rp. 1 M s.d Rp 5 M</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. II FungsiPerencanaan Proyek</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp 5 M</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td><td>Es. I Fungsi Perencanaan Proyek</td><td>Direktur yang Membidangi Pengadaan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Fase Pelaksanaan</td><td>s.d Rp. 1 M</td><td>Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Pimpinan Proyek/Koordinator Program</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Rp. 1 M s.d Rp 5 M</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. II Fungsi Manajemen Proyek</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp 5 M</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td><td>Es. I Fungsi Manajemen Proyek</td><td>Direktur yang Membidangi Pengadaan</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Pengadaan Rutin/ Litbang dan Pengadaan Investasi Rutin/ Litbang</td><td rowspan="3">Semua</td><td>s.d Rp. 1 M</td><td>Staf Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. II Unit Kerja Terkait</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Rp. 1 M s.d Rp 5 M</td><td>Es. II Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. I Unit Kerja Terkait</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td></tr>
<tr><td>Di atas Rp 5 M</td><td>Es. I Fungsi Pengadaan</td><td>Es. I Unit Kerja Terkait</td><td>Direktur yang Membidangi Pengadaan</td></tr>
</table>
➢ Penetapan Procurement Plan
<table>
<tr><th>Klasifikasi Pengadaan</th><th>Jenis HPS</th><th>Nilai HPS</th><th>Disiapkan Oleh</th><th>Diperiksa Oleh</th><th>Ditetapkan Oleh</th></tr>
<tr><td>Semua Jenis Pengadaan</td><td>Procurement Plan</td><td>Semua Nilai Pengadaan</td><td>Es. I Fungsi Perencanaan Pengadaan</td><td>Es. I Fungsi Perencanaan Proyek</td><td>Direktur yang Membidangi Perencanaan Pengadaan</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:28
