PT Len Industri (Persero)	Halaman **1 dari 32**
SOP-001 **PENANGANAN PELUANG & ORDER BISNIS**	Revisi: **18**

Disusun oleh :		Direviu oleh :	Disetujui oleh :
SVP Bid Management Tanggal : 18-12-2025 Tanda Tangan : (Sihmanto)	**SVP Marketing & Sales Center** Tanggal : 19-12-2025 Tanda Tangan : (Rita Dwi Handayani)	**Management Representative** Tanggal : 23-12-2025 Tanda Tangan : (Muhamad Daud Fahreza)	**Direktur Bisnis & Kerjasama** Tanggal : 05-01-2026 Tanda Tangan : (Irwan Ibrahim)
SVP Business Development & Global Partnership Tanggal : 18-12-2025 Tanda Tangan : (Sena Maulana)	**SVP Engineering & Project Planning** Tanggal : 22-12-2025 Tanda Tangan : (Laksono Widyo Isworo)	**GM Business Process Management** Tanggal : 23-12-2025 Tanda Tangan : (Yunika Sopandi)	

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Halaman yang terkait	Paraf
17	27-09-2024	Penyelarasan Nomenklatur Organisasi berdasarkan SK No. 144/SKEP/DU/VII/2024 dan perubahan lainnya (*detail pada matrix perubahan*)	IS
18	05-01-2026	Penambahan kegiatan *vendor manufacturing assesment* dan perubahan lainnya (detail pada matrix perubahan)	IS

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI **1**
1.0 TUJUAN **4**
2.0 RUANG LINGKUP **4**
3.0 DEFINISI **4**
3.1 *Business Model Canvas* (BMC) 4
3.2 Daftar Prospek Bisnis (*Pipeline*) 4
3.3 Dokumen Proposal Bisnis 4
3.4 *Downside* 4
3.5 Fase *Marketing* 4
3.6 Fase Pengembangan Bisnis 5
3.7 Harga Estimasi Awal *(Initial Price)* 5
3.8 Fase *Sales* 5
3.9 *Forecast* 5
3.10 Kajian Risiko Peluang Bisnis 5
3.11 Kontrak 5
3.12 Lini Bisnis Perusahaan (*Core Competence*) 5
3.13 Non-Daftar Prospek Bisnis (*Non-Pipeline*) 6
3.14 *Order* 6
3.15 Perusahaan 6
3.16 Pelanggan 6
3.17 Peluang Bisnis 6
3.18 Pembukaan Kode Anggaran 6
3.19 Pemimpin Rapat Tinjauan 6
3.20 Peninjau Rapat Tinjauan 6
3.21 Penyelenggara Rapat Tinjauan 7
3.22 Perwakilan Struktural 7
3.23 *Proof of Concept* (POC) 7
3.24 Proyek 7
3.25 Profil Peluang Bisnis 7
3.26 Profil Proyek 7
3.27 Profil Risiko Proyek 8
3.28 Program Pra-Proyek 8
3.29 Rapat Tinjauan Order 8
3.30 Rapat Tinjauan Peluang Bisnis 8
3.31 Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP 8
3.32 *Request For Information* (RFI) 8
3.33 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 8
3.34 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 9
3.35 Surat Penawaran Harga (SPH) 9
3.36 Uji Kelayakan SMAP 9
3.37 *Upside* 9
3.38 *Project Income Statement* (PIS) 9
4.0 DOKUMEN TERKAIT **9**
5.0 PROSEDUR/ISI **10**
5.1 Fase Pengembangan Bisnis 10
5.1.1 Rapat Tinjauan Peluang Bisnis 11
5.2 Fase *Marketing* 12
5.2.1 Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP 13

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.2.2 Program Pra-Proyek 14
5.2.3 Penyusunan Draft Proposal Penawaran 14
5.2.4 Penyusunan Dokumen *Request For Information* (RFI) 15
5.2.5 Catatan *Order* dan Tender 15
5.3 Fase Sales 15
5.3.1 Tinjauan *Order* 15
5.3.1.1 Rapat Tinjauan *Order* – Teknis 16
5.3.1.2 Rapat Tinjauan *Order* – *Costing* 17
5.3.1.3 Rapat Tinjauan *Order* - *Go/No Go* 18
5.3.1.3.1 Persetujuan *Order* Kelas Kecil (*Order* < Rp25 miliar) 19
5.3.1.3.2 Tinjauan *Order* - *Go/No Go* Kelas Sedang (Rp25 miliar < *Order* < Rp100 miliar) 19
5.3.1.3.3 Tinjauan *Order* - *Go/No Go* Kelas Besar (*Order* > Rp100 miliar) 20
5.3.2 Hasil Tinjauan *Order* - *Go/No Go* 21
5.3.3 Klarifikasi & Negosiasi 21
5.4 Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data 22
5.5 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 22
5.6 Informasi Terdokumentasi 22
6.0 FORMULIR TERKAIT 23
7.0 ALUR / FLOW 24
8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN 27

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

1.0 TUJUAN

Menjamin pemenuhan semua permintaan Pelanggan sesuai dengan kemampuan Perusahaan serta sarana dan prasarana yang tersedia.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan sebagai acuan bagi Perusahaan dalam menangani setiap Peluang Bisnis dan Order yang diterima hingga tahap keputusan penawaran harga.

3.0 DEFINISI

3.1 *Business Model Canvas* (BMC)

Business Model Canvas (BMC) adalah kerangka kerja strategis yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan mengembangkan model bisnis suatu Perusahaan secara visual.

3.2 Daftar Prospek Bisnis (*Pipeline*)

Daftar Prospek Bisnis (*Pipeline*) adalah daftar sistematis yang mencatat Peluang Bisnis potensial yang sedang dievaluasi, dinegosiasikan, atau dalam proses pengembangan untuk dikonversi menjadi Proyek atau Kontrak bisnis.

3.3 Dokumen Proposal Bisnis

Dokumen Proposal Bisnis adalah dokumen formal yang menjelaskan ide atau rencana bisnis yang diusulkan oleh Perusahaan dengan tujuan untuk meyakinkan pihak lain, seperti calon Pelanggan, investor, mitra bisnis, atau manajemen, untuk mendukung atau berinvestasi dalam ide tersebut. Proposal ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk tujuan, strategi, pasar sasaran, analisis keuangan, serta rencana operasional guna memastikan kelayakan dan potensi keberhasilan bisnis.

3.4 *Downside*

Downside adalah potensi kontrak yang masih di tahap awal atau sekadar prospek, bergantung pada faktor eksternal (kebutuhan user, anggaran, kebijakan user, dll). Dengan kemungkinan realisasi rendah.

3.5 Fase *Marketing*

Fase *Marketing adalah* tahap dimana Peluang Bisnis dengan solusi yang telah diterima oleh Pelanggan mendorong pengalokasian anggaran, sehingga dapat dimasukkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.6 Fase Pengembangan Bisnis

Fase Pengembangan Bisnis adalah tahap inisiasi dan identifikasi Peluang Bisnis yang diusulkan dan/atau diterima oleh Pelanggan, Fase ini mencakup pengembangan bisnis untuk teknologi atau bisnis baru serta pengembangan bisnis untuk teknologi atau bisnis yang sudah ada.

3.7 Harga Estimasi Awal *(Initial Price)*

Harga Estimasi Awal *(Initial Price)* adalah harga awal yang dihitung berdasarkan analisis biaya langsung dan tidak langsung dalam suatu Proyek, termasuk biaya sumber daya, material, tenaga kerja, overhead, serta margin keuntungan yang diusulkan dalam dokumen proposal kepada Pelanggan

3.8 Fase *Sales*

Fase *Sales* adalah tahap dimana proses terhadap Order yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) agar dapat dikonversi menjadi Kontrak.

3.9 *Forecast*

Forecast adalah potensi kontrak yang paling realistis yang diharapkan dapat tercapai berdasarkan kondisi dan informasi terkini. Dengan kemungkinan realisasi tinggi

3.10 Kajian Risiko Peluang Bisnis

Kajian Risiko Peluang Bisnis adalah proses identifikasi, analisis, dan evaluasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Peluang Bisnis.

3.11 Kontrak

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban dalam penyediaan produk, jasa, atau hasil dalam suatu Proyek

3.12 Lini Bisnis Perusahaan (*Core Competence*)

Lini Bisnis Perusahaan (*Core Competence*) adalah kapabilitas utama yang menjadi keunggulan kompetitif suatu Perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi Pelanggan dan membedakannya dari pesaing

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.13 Non-Daftar Prospek Bisnis (*Non-Pipeline*)

Non-Daftar Prospek Bisnis (*Non-Pipeline*) adalah Peluang Bisnis potensial yang belum tercantum dalam Daftar Prospek Bisnis (*Pipeline*) Perusahaan tetapi memiliki kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut.

3.14 *Order*

Order adalah informasi dari Pelanggan yang disampaikan melalui telepon, faks, surat pos, surat kabar, kunjungan langsung, atau media lainnya, yang berisi pesanan produk atau pekerjaan, pengumuman tender, dan sebagainya.

3.15 Perusahaan

Perusahaan adalah PT Len Industri (Persero), sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 442, Bandung.

3.16 Pelanggan

Pelanggan adalah individu atau organisasi yang menerima dan menggunakan produk, layanan, atau hasil yang dihasilkan dari suatu Proyek.

3.17 Peluang Bisnis

Peluang Bisnis adalah kemungkinan atau kondisi yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja, mencapai tujuan strategis, menciptakan nilai tambah, dan mendapatkan keuntungan dengan mengidentifikasi serta merespons kebutuhan pasar, inovasi, atau perubahan eksternal dan internal.

3.18 Pembukaan Kode Anggaran

Pembukaan Kode Anggaran adalah proses administratif dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan mengalokasikan anggaran pada suatu Proyek, program, atau kegiatan tertentu dalam sistem keuangan Perusahaan.

3.19 Pemimpin Rapat Tinjauan

Pemimpin Rapat Tinjauan adalah pihak yang memimpin jalannya rapat, mengarahkan diskusi, dan mengambil keputusan terhadap isu-isu yang muncul selama tinjauan.

3.20 Peninjau Rapat Tinjauan

Peninjau Rapat Tinjauan adalah pihak yang diundang untuk memberikan masukan terkait aspek yang dibahas serta membubuhkan paraf pada formulir terkait.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.21 Penyelenggara Rapat Tinjauan

Penyelenggara Rapat Tinjauan adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat, termasuk mengundang peserta, membuka dan menutup rapat, serta mengelola administrasi rapat. Tugasnya mencakup pembuatan daftar hadir, notulensi, sirkulasi notulensi, pengarsipan, dan pemantauan tindak lanjut keputusan rapat.

3.22 Perwakilan Struktural

Perwakilan Struktural adalah staf yang ditunjuk untuk mewakili struktural yang berhalangan hadir dalam rapat tinjauan. Staf yang ditunjuk memiliki wewenang yang sama dengan atasannya serta kompetensi yang memadai agar dapat memberikan pendapat dan keputusan sesuai dengan aspek yang menjadi tanggung jawabnya dalam tinjauan.

Penunjukan perwakilan harus disampaikan oleh struktural yang berhalangan kepada Penyelenggara Rapat Tinjauan sebelum rapat berlangsung. Selain itu, staf yang ditunjuk harus berbeda dengan staf yang menyusun dokumen yang akan ditinjau.

3.23 *Proof of Concept* (POC)

Proof of Concept (POC) adalah eksperimen yang bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu konsep, ide, atau solusi teknis dapat diterapkan dalam situasi nyata dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan.

3.24 Proyek

Proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik

3.25 Profil Peluang Bisnis

Profil Peluang Bisnis adalah dokumen yang berisi informasi lengkap mengenai suatu Peluang Bisnis, termasuk deskripsi bisnis, ruang lingkup pekerjaan, kebutuhan Pelanggan, alokasi anggaran, analisis pasar, risiko, serta aspek teknis dan finansial yang relevan

3.26 Profil Proyek

Profil Proyek adalah deskripsi menyeluruh mengenai aktivitas Proyek yang mencakup proses inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, serta penutupan Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.27 Profil Risiko Proyek

Profil Risiko Proyek adalah analisis dan evaluasi potensi risiko yang dapat mengancam Proyek, yang disusun oleh Fungsi Perencanaan Proyek.

3.28 Program Pra-Proyek

Program Pra-Proyek adalah serangkaian kegiatan khusus yang diperlukan untuk mendukung pemasaran dan penjualan sistem atau produk Perusahaan hingga tercapainya Kontrak Proyek atau penjualan produk.

3.29 Rapat Tinjauan Order

Rapat Tinjauan Order adalah rapat evaluasi terhadap persyaratan Pelanggan untuk memastikan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi permintaan tersebut secara efektif dan sesuai dengan kapasitas yang tersedia.

3.30 Rapat Tinjauan Peluang Bisnis

Rapat Tinjauan Peluang Bisnis adalah rapat evaluasi terhadap Peluang Bisnis untuk memastikan kesesuaiannya dengan model dan strategi bisnis Perusahaan.

3.31 Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP

Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP adalah rapat evaluasi terhadap kelayakan Peluang Bisnis untuk menentukan apakah dapat ditindaklanjuti serta menetapkannya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

3.32 *Request For Information* (RFI*)*

Request For Information (RFI*)* adalah proses bisnis di mana calon Pelanggan meminta informasi tertulis mengenai produk atau jasa yang ditawarkan oleh Perusahaan.

3.33 Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat strategi, program kerja, serta alokasi anggaran Perusahaan dalam satu tahun buku. RKAP disusun sebagai pedoman operasional dan keuangan untuk memastikan pencapaian target bisnis, efisiensi penggunaan sumber daya, serta keberlanjutan pertumbuhan Perusahaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.34 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) adalah sistem manajemen yang dirancang untuk membantu Perusahaan dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan.

3.35 Surat Penawaran Harga (SPH)

Surat Penawaran Harga (SPH) adalah dokumen yang disampaikan oleh Fungsi Pemasaran kepada calon Pelanggan sebagai tanggapan atas Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH). SPH berisi informasi mengenai produk atau pekerjaan yang ditawarkan, termasuk harga, syarat dan ketentuan, waktu pemenuhan pekerjaan, serta masa berlaku penawaran.

3.36 Uji Kelayakan SMAP

Uji Kelayakan SMAP adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko penyuapan dalam suatu kegiatan, transaksi, Proyek, atau hubungan bisnis.

3.37 *Upside*

Upside adalah potensi tambahan dari kontrak yang belum pasti, tetapi memiliki peluang cukup besar untuk direalisasikan jika situasi berjalan positif. Dengan kemungkinan realisasi sedang

3.38 *Project Income Statement* (PIS)

Project Income Statement (PIS) adalah rencana anggaran biaya Proyek yang disusun untuk memperkirakan total biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian Proyek, mencakup biaya langsung dan tidak langsung.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Memorandum Direktur Bisnis dan Kerjasama Nomor : 004/M/DB/IV/2022 perihal Peningkatan Aspek Keamanan Data Pada Tinjauan Order/Kontrak;***
- ***Keputusan Direksi Nomor : 103/SKEP.HC/DU/VI/2025 tentang Struktur Organisasi PT Len Industri (Persero) beserta Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi;***
- ***Memorandum Direktur Keuangan, SDM, & Manajemen Risiko Nomor : 062/M/DS/II/2025 perihal Revisi - Kebijakan Anggaran Tahun 2025 PT Len Industri (Persero);***
- ***Nota Management Representative Nomor : 003/N/UN/II/2024 perihal Pembaharuan Pemetaan Fungsi Generik terhadap Unit Aktual;***
- ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002);***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- ***Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700);***
- ***Prosedur Uji Kelayakan SMAP (GOP-1103);***
- ***Prosedur Kajian Risiko Proyek (ROP-911);***

5.0 PROSEDUR/ISI

Terdapat 3 (tiga) fase dalam Penanganan Peluang dan Order Bisnis, yaitu Fase Pengembangan Bisnis, Fase *Marketing*, dan Fase *Sales*.

5.1 Fase Pengembangan Bisnis

Fungsi Pengembangan Bisnis melakukan identifikasi atas Peluang Bisnis untuk teknologi baru atau model bisnis baru yang sesuai dengan lini bisnis Perusahaan yang dapat diperoleh berdasarkan informasi dari Pelanggan dan/atau pasar. Informasi Peluang Bisnis tersebut dapat berupa prospek, perencanaan, ataupun kesempatan terkait suatu bisnis yang sedang dikembangkan atau akan dimulai.

Fungsi Pengembangan Bisnis dengan dukungan Fungsi Pemasaran melakukan komunikasi dengan calon Pelanggan atau menggali informasi dari pasar untuk mendapatkan profil Peluang Bisnis tersebut. Informasi Peluang Bisnis dapat didokumentasikan dalam bentuk dokumen profil pasar, profil Pelanggan, *business model canvas* (BMC), atau dokumen lain yang berisi tentang ruang lingkup pekerjaan, anggaran, dan informasi lainnya.

Fungsi Pengembangan Bisnis juga menyusun secara umum terkait profil Proyek menggunakan ***Formulir Profil Proyek (RFR-004)*** dan kajian resiko Proyek menggunakan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)***.

Dalam hal Peluang Bisnis tersebut ada dalam portofolio Perusahaan, maka Peluang Bisnis tersebut dimasukan ke dalam kategori pengembangan teknologi/bisnis eksisting dan Fungsi Pengembangan Bisnis dapat langsung mengajukan Peluang Bisnis tersebut ke dalam daftar prospek bisnis (*pipeline*).

Sedangkan untuk pengembangan teknologi/bisnis baru maka dilakukan proses pendalaman informasi profil dan jika diperlukan dukungan teknis, maka Fungsi Pengembangan Bisnis dapat memintanya dari Fungsi Rekayasa Sistem dengan menyampaikan nota permintaan dukungan teknis dari Eselon I Fungsi Pengembangan Bisnis.

Apabila ruang lingkup pekerjaan dari Peluang Bisnis telah terdefinisi dengan jelas, maka Fungsi Pengembangan Bisnis berkoordinasi dengan Fungsi Pengawasan Pra-Proyek untuk menyelenggarakan rapat Tinjauan Peluang Bisnis.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.1.1 Rapat Tinjauan Peluang Bisnis

Rapat Tinjauan Peluang Bisnis dipimpin dan diselenggarakan oleh Fungsi Pengawasan Pra-Proyek untuk mengevaluasi kesesuaian Peluang Bisnis dengan model bisnis dan Lini Bisnis Perusahaan (*Core Competence*).

Rapat ini dihadiri oleh fungsi terkait sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Aspek yang dievaluasi dalam rapat meliputi, namun tidak terbatas pada :

- Aspek Profil (Pasar, Pelanggan)
- Aspek Bisnis
- Aspek Teknis
- Aspek Risiko

Rapat Tinjauan Peluang Bisnis dapat diselenggarakan lebih dari satu kali sesuai dengan keperluan dimana dalam rapat tersebut dapat dibahas beberapa Peluang Bisnis sekaligus.

Rapat Tinjauan Peluang Bisnis dihadiri oleh para peserta dari fungsi terkait seperti tercantum pada tabel berikut, dimana apabila terdapat struktural yang berhalangan hadir, maka harus mendelegasikannya kepada Perwakilan Struktural :

Tabel 1. Peserta Rapat Tinjauan Peluang Bisnis

No	Peran	Peserta
1	Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek
2	Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengembangan Bisnis
3	Peninjau Aspek Profil	Eselon I/II Fungsi Pemasaran
4	Peninjau Aspek Bisnis	Eselon I/II Fungsi Perencanaan Perusahaan
5	Peninjau Aspek Teknis	Eselon I/II Fungsi Rekayasa Sistem
6	Peninjau Aspek Risiko	Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko

Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan apabila dibutuhkan.

Hasil Rapat Tinjauan Peluang Bisnis (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam ***Formulir Tinjauan Peluang Bisnis (SFR-023)****, yang* diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Peluang Bisnis.

Jika hasil rapat Tinjauan Peluang Bisnis memutuskan Peluang Bisnis layak dilanjutkan ke Fase Marketing, maka Peluang Bisnis tersebut ditetapkan ke dalam daftar prospek bisnis (*pipeline*).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Tetapi jika hasil rapat tersebut memutuskan Peluang Bisnis tidak layak dilanjutkan ke Fase Marketing, maka Fungsi Pengembangan Bisnis dapat mengidentifikasi kembali profil yang telah dibuat apakah ada kemungkinan diperbaiki atau diperbarui dan memulai komunikasi kembali dengan calon Pelanggan, atau tidak dilanjutkan sesuai keputusan rapat Tinjauan Peluang Bisnis.

Setelah Tinjauan Peluang Bisnis selesai, jika diperlukan pembuatan dokumen Proposal Bisnis maka Fungsi Pengembangan Bisnis mengkoordinir penyusunan dokumen Proposal Bisnis tersebut dibantu oleh fungsi terkait lainnya. Apabila di dalam Proposal Bisnis tersebut terdapat permintaan Harga Estimasi Awal *(Initial Price)* dari calon Pelanggan, maka Fungsi Pengembangan Bisnis berkoordinasi dengan Fungsi Pemasaran dan fungsi terkait lainnya untuk menyusun dokumen Harga Estimasi Awal (*Initial Price)* tersebut.

5.2 Fase *Marketing*

Fungsi Pemasaran berkomunikasi dengan calon Pelanggan untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan untuk setiap Peluang Bisnis yang ada dalam daftar prospek bisnis (*pipeline*).

Fungsi Pemasaran juga melakukan Analisis Kelayakan Bisnis menggunakan ***Formulir Analisis Kelayakan Bisnis (SFR-026)*** untuk melihat apakah suatu *pipeline* Proyek termasuk ke dalam kategori *upside*, *downside*, atau *forecast* didasarkan pada penilaian berbagai aspek. Hasil analisis kelayakan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis.

Fungsi Pemasaran juga bertanggung jawab untuk membuat (apabila belum ada) dan/atau memperbarui ***Formulir Profil Proyek (RFR-004)*** dan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*** yang sudah disusun oleh Fungsi Pengembangan Bisnis pada tahap sebelumnya, baik untuk *Pipeline* yang telah disahkan maupun yang belum disahkan dalam RKAP (dapat mengacu pada dokumentasi Profil Proyek).

Setelah mendapatkan informasi kebutuhan Pelanggan dan semua formulir telah lengkap, maka rapat Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis RKAP dapat diselenggarakan oleh Fungsi Pengawasan Pra-Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.2.1 Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP

Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP diselenggarakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu Peluang Bisnis guna menentukan apakah dapat ditindaklanjuti dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Rapat ini dihadiri oleh fungsi terkait sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Adapun aspek yang dievaluasi meliputi namun tidak terbatas pada :

- Aspek Profil (Pasar, Pelanggan),
- Aspek Bisnis,
- Aspek Risiko
- Aspek lainnya jika diperlukan.

Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP dihadiri oleh para peserta dari fungsi terkait seperti tercantum pada tabel berikut, dan tidak dapat diwakilkan :

Tabel 2. Peserta Rapat Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis

No	Peran	Peserta
1	Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek
2	Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pemasaran
3	Peninjau Aspek Profil	Eselon I/II Fungsi Pengembangan Bisnis
4	Peninjau Aspek Bisnis	Eselon I/II Fungsi Perencanaan Perusahaan
5	Peninjau Aspek Risiko	Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko

Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan.

Jika hasil rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP memutuskan bisnis layak diambil, maka bisnis tersebut ditetapkan ke dalam RKAP.

Tetapi jika hasil rapat tersebut memutuskan terdapat *pipeline* bisnis yang tidak layak diambil, maka Fungsi Pemasaran dapat mengidentifikasi kembali *pipeline* Bisnis tersebut apakah ada kemungkinan diperbaiki atau diperbarui dan memulai komunikasi kembali dengan calon Pelanggan atau tidak dilanjutkan sesuai Keputusan rapat.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Hasil Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam ***Formulir Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis RKAP (SFR-029)***, yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait, sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP.

5.2.2 Program Pra-Proyek

Dalam hal terdapat Peluang Bisnis yang mengharuskan adanya kegiatan khusus, maka Fungsi Pemasaran melakukan proses pembukaan kode anggaran Program Pra-Proyek (*prospect project*) sesuai **Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700)** dengan ketentuan sebagai berikut:

- Program Pra-Proyek disiapkan untuk mendukung kegiatan khusus yang diperlukan dalam proses pemasaran atau penjualan sistem/produk Len, hingga tercapainya Kontrak Proyek atau penjualan produk.
- Cakupan kegiatan mencakup, namun tidak terbatas pada, pengembangan dan pengujian *Proof of Concept* (POC) sistem atau produk, pengadaan persediaan barang, atau kombinasi dari keduanya.
- Fungsi Pemasaran bertanggung jawab atas pengelolaan Program Pra-Proyek dan anggarannya, termasuk pembukaan dan penutupan, serta pemantauan dan pelaporan secara berkala.
- Koordinator Program Pra-Proyek adalah Fungsi Pemasaran.
- Eksekusi dapat dilakukan dengan cara *internal Order/transfer load* ke satu atau lebih fungsi lain (Fungsi Rekayasa Sistem, Fungsi Produksi, atau Fungsi Manajemen Proyek) tergantung jenis kegiatannya.
- Untuk meningkatkan efektivitas proses, tinjauan pembukaan *transfer load* dapat diselenggarakan sekaligus dalam tinjauan pembukaan Program Pra-Proyek.
- Jangka waktu Program Pra-Proyek disesuaikan dengan jangka waktu kegiatan.
- Program dapat diperpanjang jika diperlukan dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 3 (tiga) tahun.
- Jika Kontrak Proyek atau penjualan produk terkait dapat diwujudkan, maka seluruh (atau sebagian) pengeluaran dalam Program Pra-Proyek akan dibebankan ke Kontrak tersebut.
- Jika Program Pra-Proyek telah berakhir dan sampai akhir tahun anggaran, Kontrak yang diharapkan tidak dapat terwujud, maka seluruh (sisa) pengeluaran dalam program akan dibebankan sebagai biaya pemasaran.

5.2.3 Penyusunan Draft Proposal Penawaran

Fungsi Pemasaran mengkoordinasikan penyusunan/pembaharuan draft proposal penawaran terhadap Peluang Bisnis yang telah ditetapkan dalam RKAP bersama terkait lainnya. Selanjutnya Fungsi Pemasaran melakukan komunikasi dengan calon Pelanggan dan/atau menunggu informasi terkait terbitnya Order resmi dari calon Pelanggan tersebut.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.2.4 Penyusunan Dokumen *Request For Information* (RFI)

Fungsi Pemasaran mengkoordinir penyusunan dokumen *Request For Information* (RFI) produk/jasa Perusahaan apabila terdapat permintaan dari calon Pelanggan. Dalam penyusunan dokumen RFI tersebut Fungsi Pemasaran didukung oleh fungsi terkait lainnya.

5.2.5 Catatan *Order* dan Tender

Fungsi Pemasaran bertanggung jawab membuat catatan Order untuk setiap Order yang diterima dari calon Pelanggan, baik Order yang tertulis, tidak tertulis, dan juga untuk setiap kegiatan tender yang diikuti.

5.3 Fase Sales

Fungsi Pemasaran memastikan informasi Order telah diperoleh dari calon Pelanggan, kemudian melakukan analisis kelayakan Proyek menggunakan ***Formulir Analisis Kelayakan Proyek (SFR-027)*** untuk menilai kelayakan Proyek didasarkan pada berbagai aspek. Analisis kelayakan Proyek ini kemudian diperiksa oleh Fungsi Pengawasan Pra-Proyek dan akan ditinjau bersama dalam Rapat Tinjauan Order.

Fungsi Pemasaran melakukan pembaruan terhadap ***Formulir Profil Proyek (RFR-004)***, kemudian Fungsi Perencanaan Proyek melakukan pembaruan terhadap ***Formulir Project Risk Register (RFR-002).***

Apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan telah lengkap, maka Fungsi Pemasaran mengajukan kepada Fungsi Pengawasan Pra-Proyek untuk menyelenggarakan Rapat Tinjauan Order.

Dalam hal informasi Order yang diperoleh dari Pelanggan belum masuk ke dalam RKAP maka informasi Order tersebut dikategorikan **Order non RKAP** dan Fungsi Pemasaran harus melengkapi data-data yang dibutuhkan termasuk ***Formulir Profil Proyek (RFR-004)*** dan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)***. Tetapi jika informasi Order tersebut telah masuk ke dalam RKAP maka dikategorikan Order RKAP.

5.3.1 Tinjauan *Order*

Rapat Tinjauan Order diselenggarakan setelah adanya Order dari calon Pelanggan dan dapat dilakukan beberapa kali disesuaikan dengan tingkat kepentingan Perusahaan sampai dengan sebelum pemasukan dokumen tender atau Surat Penawaran Harga (SPH).

Rapat Tinjauan Order dibagi menjadi 3 lingkup, yaitu :

- Tinjauan *Order* – Teknis
- Tinjauan *Order* – *Costing*
- Tinjauan *Order* – *Go/No Go*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.3.1.1 Rapat Tinjauan *Order* – Teknis

Rapat Tinjauan Order – Teknis diselenggarakan untuk mengevaluasi semua aspek non-keuangan oleh fungsi terkait sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, adapun aspek yang dievaluasi meliputi namun tidak terbatas pada :

- Aspek Teknis (Rekayasa Sistem)
- Aspek Mutu
- Aspek Pengadaan & Penilaian Rekanan Manufaktur (apabila ada)
- Aspek Legal
- Aspek Risiko
- Aspek SDM
- Aspek Tata Kelola
- Aspek K3L
- Aspek Operasional Proyek (*Lesson Learned)*
- Aspek lainnya jika diperlukan

Rapat Tinjauan *Order* – Teknis dihadiri oleh para peserta dari fungsi terkait seperti tercantum pada tabel berikut, dimana apabila terdapat struktural yang berhalangan hadir, maka harus mendelegasikannya kepada Perwakilan Struktural :

Tabel 3. Peserta Rapat Tinjauan Order - Teknis

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek
2	Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek
3	Pendukung Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pemasaran
4	Peninjau Aspek Teknis	Eselon I/II Fungsi Rekayasa Sistem
5	Peninjau Aspek Mutu	Eselon II Fungsi Penjaminan Mutu
6	Peninjau Aspek Pengadaan & Penilaian Rekanan Manufaktur (apabila ada)	Eselon I/II Fungsi Pengadaan
7	Peninjau Aspek Legal	Eselon II Fungsi Legal
8	Peninjau Aspek Risiko	Eselon II Fungsi Manajemen Risiko
9	Peninjau Aspek SDM	Eselon I/II Fungsi SDM
10	Peninjau Aspek Tata Kelola	Eselon II Fungsi Tata Kelola
11	Peninjau Aspek K3L	Eselon II Fungsi K3L
12	Peninjau Aspek Operasional Proyek (*lesson learned*)	• Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek • Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek

Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan sesuai dengan tingkat risiko Proyek atau klasifikasi Proyek yang membutuhkan peninjauan dari fungsi terkait.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Hasil Rapat Tinjauan Order - Teknis, termasuk seluruh usulan dan pendapat, dicatat dalam ***Formulir Tinjauan Order - Teknis (SFR-003)***, yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Order – Teknis yang terlibat.

Apabila suatu Proyek teridentifikasi memiliki konten manufaktur, maka Fungsi Pengadaan bersama dengan tim penilai teknis manufaktur penyedia eksternal (Fungsi Penjaminan Mutu dan fungsi terkait lainnya) melakukan identifikasi terhadap penyedia eksternal yang berpotensi menjadi pelaksana manufaktur. Selanjutnya, ditetapkan apakah penyedia eksternal tersebut perlu menjalani *Vendor Assessment* atau tidak, guna menilai mutu penyedia eksternal dari berbagai aspek.

5.3.1.2 Rapat Tinjauan *Order – Costing*

Rapat Tinjauan *Order - Costing* diselenggarakan untuk mengevaluasi semua aspek keuangan oleh fungsi terkait sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dimana nilai yang dibahas dalam Rapat *Tinjauan Order - Costing* adalah nilai tanpa PPN.

Dalam rapat Tinjauan *Order - Costing* ini hasil Tinjauan Order - Teknis sebelumnya yang tercatat dalam ***Formulir Tinjauan Order - Teknis (SFR-003***) kembali dibacakan dalam forum.

Aspek yang dievaluasi dalam Rapat Tinjauan *Order - Costing* meliputi, namun tidak terbatas pada :

- Aspek Beban Langsung/*Direct Cost*
- Aspek Beban Tak Langsung/*Indirect Cost & Overhead*

Penyusunan dokumen *costing* (termasuk PIS) menjadi tanggung jawab dan kewenangan khusus Fungsi Perencanaan Proyek dan diverifikasi oleh Fungsi Pengawasan Pra-Proyek dengan mengacu kepada hasil *sourcing* pengadaan dan spesifikasi teknis oleh Fungsi Rekayasa Sistem dan Fungsi Pengadaan. Sedangkan hak akses dan tanggung jawab peredaran dan penggunaan dokumen *costing* (termasuk PIS) mengacu pada ketentuan sub-bab 5.4 Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data.

Penyusunan anggaran beban langsung (*direct cost*) dilakukan berdasarkan kebijakan anggaran yang berlaku dan masukan dari fungsi terkait.

Penyusunan anggaran beban tidak langsung (*indirect cost/overhead cost/ variable cost*) dilakukan berdasarkan kebijakan anggaran yang berlaku dan data pendukung yang disediakan oleh Fungsi Pengendali Anggaran.

Rapat Tinjauan *Order – Costing* dihadiri oleh para peserta dari fungsi terkait dan tidak dapat diwakilkan seperti tercantum pada tabel berikut :

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Tabel 4. Peserta Rapat Tinjauan Order – Costing

No	Peran	Peserta
1	Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek
2	Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek
3	Pendukung Pemapar	• Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Pengadaan
4	Peninjau Aspek Keuangan	• Eselon I/II Fungsi Keuangan • Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran
5	Peninjau Aspek Risiko	Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko
6	Peninjau Aspek Operasional Proyek (*lesson learned*)	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek

Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan.

Hasil Rapat Tinjauan *Order - Costing*, termasuk seluruh usulan dan pendapat, dicatat dalam ***Formulir Tinjauan Order – Costing (SFR-020)***, yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan *Order – Costing*.

5.3.1.3 Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go*

Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* diselenggarakan untuk pengambilan keputusan oleh Direksi berdasarkan data yang valid dari aspek komersial (harga jual/nilai kontrak, HPP, dan laba) dengan memperhatikan hasil rapat Tinjauan *Order* - Teknis & *Costing* di tahap sebelumnya serta mitigasi risiko dan strategi efisiensinya.

Dalam hal Perusahaan melakukan kerjasama dengan Perusahaan lain untuk mendapatkan *Order*, maka batasan Tinjauan *Order - Go/No Go* ditentukan berdasarkan porsi Perusahaan terhadap *Order* yang didapat.

Rapat Tinjauan *Order – Go/No Go* diselenggarakan berdasarkan klasifikasi Tinjauan *Order – Go/No Go*, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 5. Klasifikasi Tinjauan Order - Go/No Go

No.	Nilai *Order**	Kelas *Order*	Tinjauan *Order – Go/No Go*
1	< Rp25 miliar	Kecil	Tidak dilakukan tinjauan
2	Rp25 miliar – Rp100 miliar	Sedang	Kelas Sedang
3	> Rp100 miliar	Besar	Kelas Besar

**) Nilai Order tersebut di atas adalah tanpa PPN (pajak pertambahan nilai)*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.3.1.3.1 Persetujuan *Order* Kelas Kecil (*Order* < Rp25 miliar)

Dalam hal nilai Order kurang dari Rp25 miliar (tanpa PPN), Fungsi Pemasaran dan Fungsi Pengawasan Pra-Proyek langsung meminta persetujuan kepada Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran untuk menyetujui atau menolak order berdasarkan pertimbangan dari hasil Rapat Tinjauan Order - Teknis & Costing yang telah dilakukan dan divalidasi sebelumnya.

Persetujuan atau penolakan Order oleh Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran dilakukan menggunakan ***Formulir Persetujuan Order Kecil (SFR-024)***, Fungsi Pengawasan Pra-Proyek dan Fungsi Pemasaran memberikan tembusan formulir tersebut kepada Fungsi Perencanaan Proyek.

5.3.1.3.2 Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Sedang (Rp25 miliar < *Order* < Rp100 miliar)

Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Sedang diselenggarakan untuk Order senilai Rp25 miliar hingga Rp100 miliar (tanpa PPN).

Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Sedang dihadiri oleh para peserta dari Direksi dan fungsi terkait seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel 6. Peserta Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Sedang

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin Rapat Tinjauan	Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran *)
2	Peninjau Aspek Keuangan dan Ketersediaan Sumber Daya	Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM *)
3	Peninjau Aspek Teknis, Manajemen Proyek, Pengadaan, dan Produksi (apabila ada)	Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi *)
4	Peninjau Aspek Risiko dan Tata Kelola	Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola *)
5	Penyelenggara & Pemapar Resume Rapat Tinjauan *Order* – Teknis & *Costing*	• Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek **) • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek • Eselon I/II Fungsi Pemasaran

Keterangan :

**) Sedikitnya 2 (dua) Direksi yang menghadiri Rapat Tinjauan Order – Go/No go Kelas Sedang (Pemimpin Rapat dan Peninjau Aspek.*

***) Sebagai Penyelenggara Rapat Tinjauan*

Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan.

Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Sedang dapat diselenggarakan jika telah mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh fungsi terkait dan minimal 2 (dua) orang Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

1. Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran sebagai Pemimpin Rapat Tinjauan.
2. Salah satu atau lebih dari Direktur berikut sebagai peninjau aspek:
   - Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan/Pengendali Anggaran/SDM.
   - Direktur yang membidangi Fungsi Perencanaan Proyek/Rekayasa Sistem/Pengadaan/Manajemen Proyek/Produksi.
   - Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko/Tata Kelola.

Apabila terdapat Direksi yang berhalangan maka dapat mewakilkannya pada Pejabat Eselon I Fungsi terkait sesuai dengan aspek yang ditinjau.

Hasil Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Sedang, termasuk seluruh usulan dan pendapat, dicatat dalam ***Formulir Tinjauan Order - Go/No Go (SFR-028)***, yang ditanda-tangani sesuai format formulir dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Sedang.

5.3.1.3.3 Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Besar (*Order* > Rp100 miliar)

Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Besar diselenggarakan untuk order senilai lebih dari Rp100 miliar (tanpa PPN).

Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Besar dihadiri oleh para peserta dari Direksi dan fungsi terkait seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel 7. Peserta Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Besar

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin Rapat Tinjauan	Direktur Utama
2	Penyelenggara Rapat Tinjauan	Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran *)
3	Peninjau Aspek Keuangan dan Ketersediaan Sumber Daya	Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM **)
4	Peninjau Aspek Teknis, Manajemen Proyek, Pengadaan, dan Produksi (apabila ada)	Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi **)
5	Peninjau Aspek Risiko dan Tata Kelola	Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola **)
6	Penyelenggara dan Pemapar Resume Rapat Tinjauan Order - Teknis & *Costing*	• Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek ***) • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek • Eselon I/II Fungsi Pemasaran

Keterangan :
** Pihak yang mengundang, membuka dan menutup rapat*
*** Minimal salah satu Direksi*
**** Pihak yang melakukan aktivitas administrasi rapat seperti membuat daftar hadir rapat, membuat notulensi rapat, mengarsipkan dan memonitor tindak-lanjut keputusan rapat.*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan.

Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Besar dapat diselenggarakan jika telah mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh fungsi terkait dan minimal 3 (tiga) orang Direksi, sebagai berikut:

1. Direktur utama sebagai Pemimpin Rapat Tinjauan.
2. Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran sebagai Penyelenggara Rapat Tinjauan
3. Salah satu atau lebih dari Direktur berikut sebagai peninjau aspek:
   - Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan/SDM
   - Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem/Pengadaan/Manajemen Proyek/Produksi.
   - Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola.

Apabila terdapat Direksi yang berhalangan maka dapat mewakilkannya pada Pejabat Eselon I Fungsi terkait sesuai dengan aspek yang ditinjau.

Hasil Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Besar, termasuk seluruh usulan dan pendapat, dicatat dalam ***Formulir Tinjauan Order - Go/No Go (SFR-028)***, yang ditanda-tangani sesuai format formulir dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* Kelas Besar.

5.3.2 Hasil Tinjauan *Order - Go/No Go*

Jika *Order* dinyatakan ditolak oleh Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran (untuk *Order* kelas kecil), atau ditolak oleh forum pada Rapat Tinjauan *Order - Go/No Go* (untuk *Order* kelas sedang dan besar), maka *Order* dinyatakan tidak dilanjutkan.

Sedangkan untuk *Order* yang dinyatakan diterima, maka Fungsi Pemasaran membuat Surat Penawaran Harga (SPH) dengan ketentuan sebagai berikut :

- SPH untuk Order Kelas Kecil/Sedang ditandatangani oleh Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran dengan memberikan tembusan kepada Direksi yang lain.
- SPH untuk Order Kelas Besar ditandatangani oleh Direktur Utama.
- Jika terdapat persyaratan khusus yang diminta oleh calon Pelanggan, SPH ditandatangani sesuai dengan persyaratan.

5.3.3 Klarifikasi & Negosiasi

Fungsi Pemasaran dapat mengikutsertakan Fungsi Pengawasan Pra Proyek dan/atau fungsi terkait untuk melakukan klarifikasi dan/atau negosiasi harga, termin pembayaran dan risiko jika terjadi keterlambatan pembayaran dari calon Pelanggan serta klausul lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan identifikasi risiko yang telah dibuat.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.4 Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data

Setiap informasi sensitif (termasuk *costing*) harus dijaga agar tidak dapat diakses oleh pihak lain, termasuk fungsi terkait. Selain itu, setiap peredaran dokumen dalam rangka pelaksanaan tinjauan harus dilakukan dalam format PDF.

Setiap peredaran dokumen yang terkait dengan *costing*, terutama *Project Income Statement* (PIS), harus diberikan *watermark* khusus untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi kebocoran data. Penyimpanan dokumen harus dilakukan hanya pada komputer, *server*, dan *cloud* milik Perusahaan. Peredaran dokumen harus dilakukan melalui saluran komunikasi data yang aman dan dapat ditelusuri (*traceable*).

Fungsi tertentu diberikan hak akses terbatas terhadap dokumen dalam format non-PDF, sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 9. Fungsi yang Mendapatkan Hak Akses PIS Non PDF

No.	Fungsi	Kebutuhan	Lingkup Akses Informasi
1	Fungsi Pemasaran	Pemasaran dan Penjualan	Aspek *costing* tertentu sesuai dengan kebutuhan
2	Fungsi Pengadaan	Pengadaan	HPS/Harga Perkiraan Sendiri
3	Fungsi SDM	Penempatan SDM Proyek	Kelas Proyek
4	Fungsi Manajemen Risiko	Pengelolaan Risiko Proyek	Kelas Proyek
5	Fungsi Keuangan	Monitoring Anggaran	Copy Value
6	Fungsi Pengendali Anggaran	Monitoring Anggaran	Akses Penuh
7	Fungsi Pengawasan Pra-Proyek	Perencanaan Proyek	Akses Penuh

5.5 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Perusahaan pada proses Penanganan Peluang & Order Bisnis ini.

5.6 Informasi Terdokumentasi

Seluruh hasil kegiatan yang tercatat dalam Prosedur ini baik berbentuk formulir, risalah rapat, klarifikasi, negosiasi maupun dokumen dan rekaman lainnya, disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002)***.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).


6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***Project Risk Register (RFR-002)***
- ***Profil Proyek (RFR-004)***
- ***Tinjauan Order - Teknis (SFR-003)***
- ***Tinjauan Order - Costing (SFR-020)***
- ***Tinjauan Peluang Bisnis (SFR-023)***
- ***Persetujuan Order/Kontrak Kecil (SFR-024)***
- ***Analisis Kelayakan Bisnis (SFR-026)***
- ***Analisis Kelayakan Proyek (SFR-027)***
- ***Tinjauan Order/Kontrak (Go-No Go) (SFR-028)***
- ***Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis RKAP (SFR-029)***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).


7.0 ALUR / FLOW

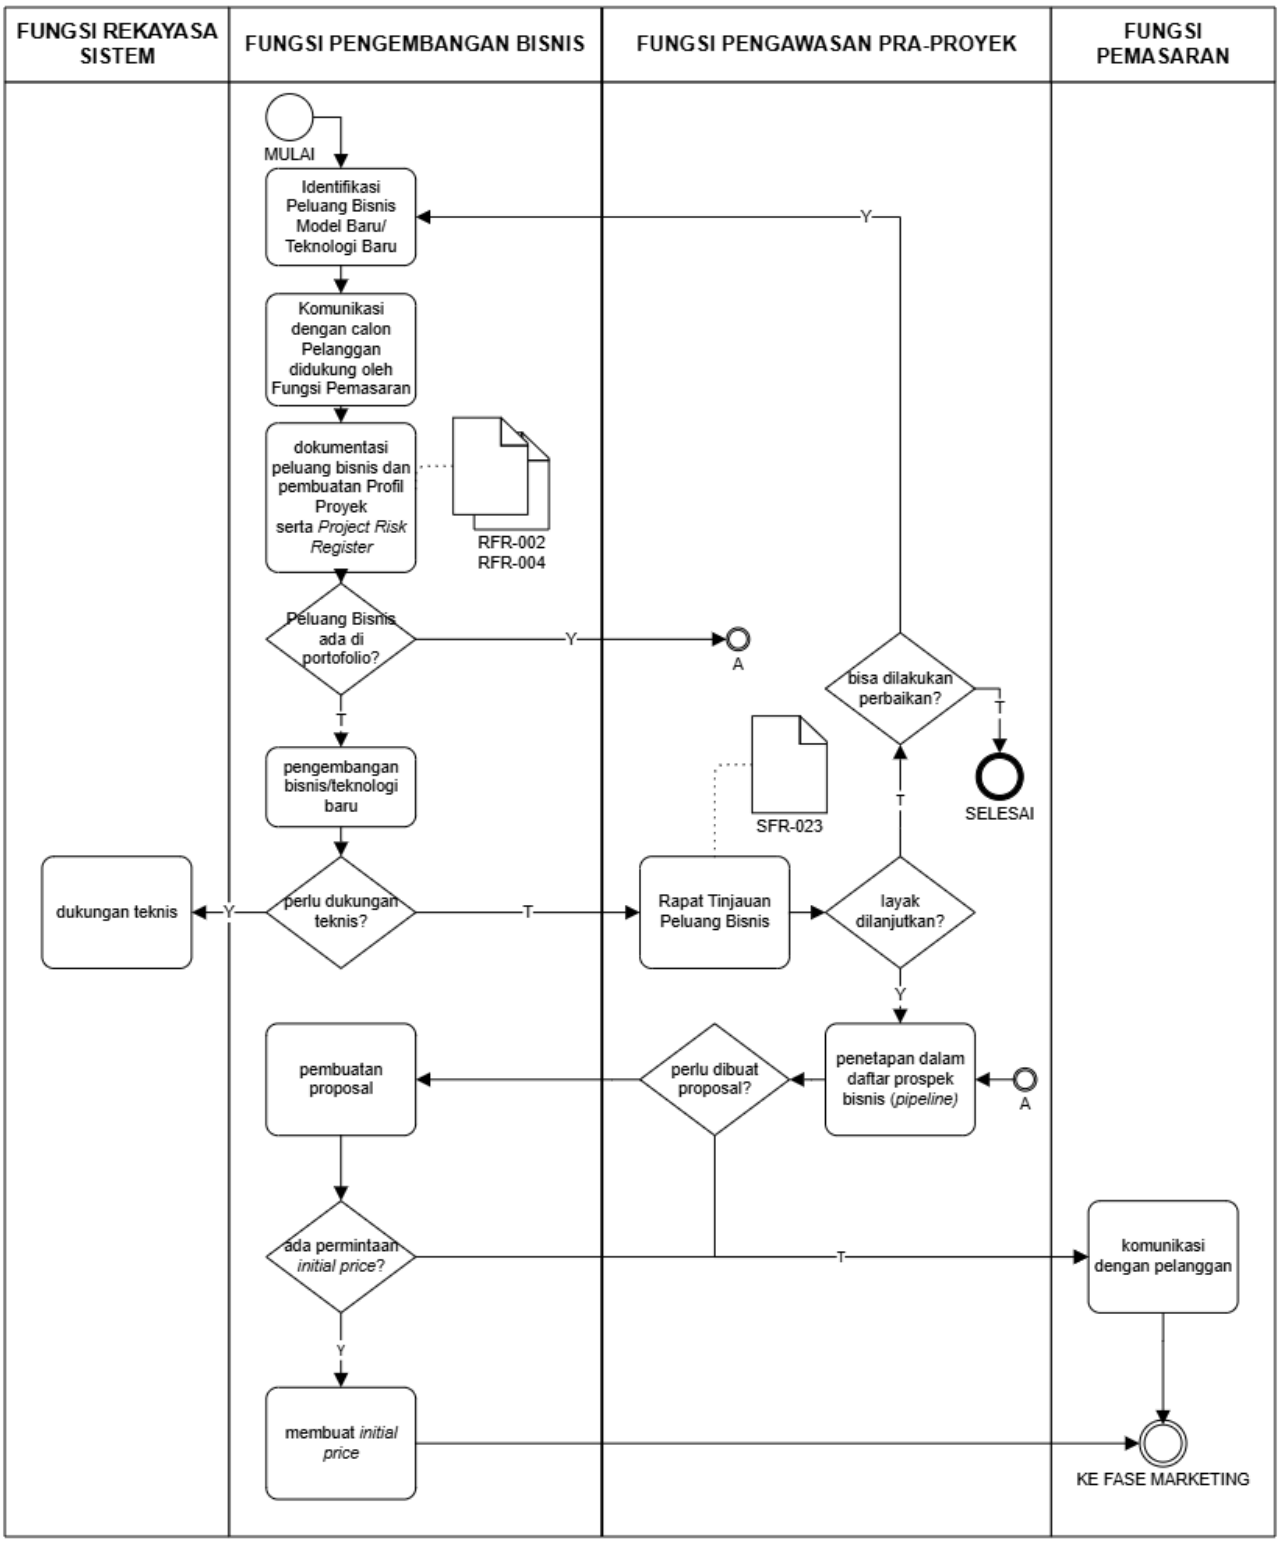

Flowchart 1 : Fase Pengembangan Bisnis

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31


Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

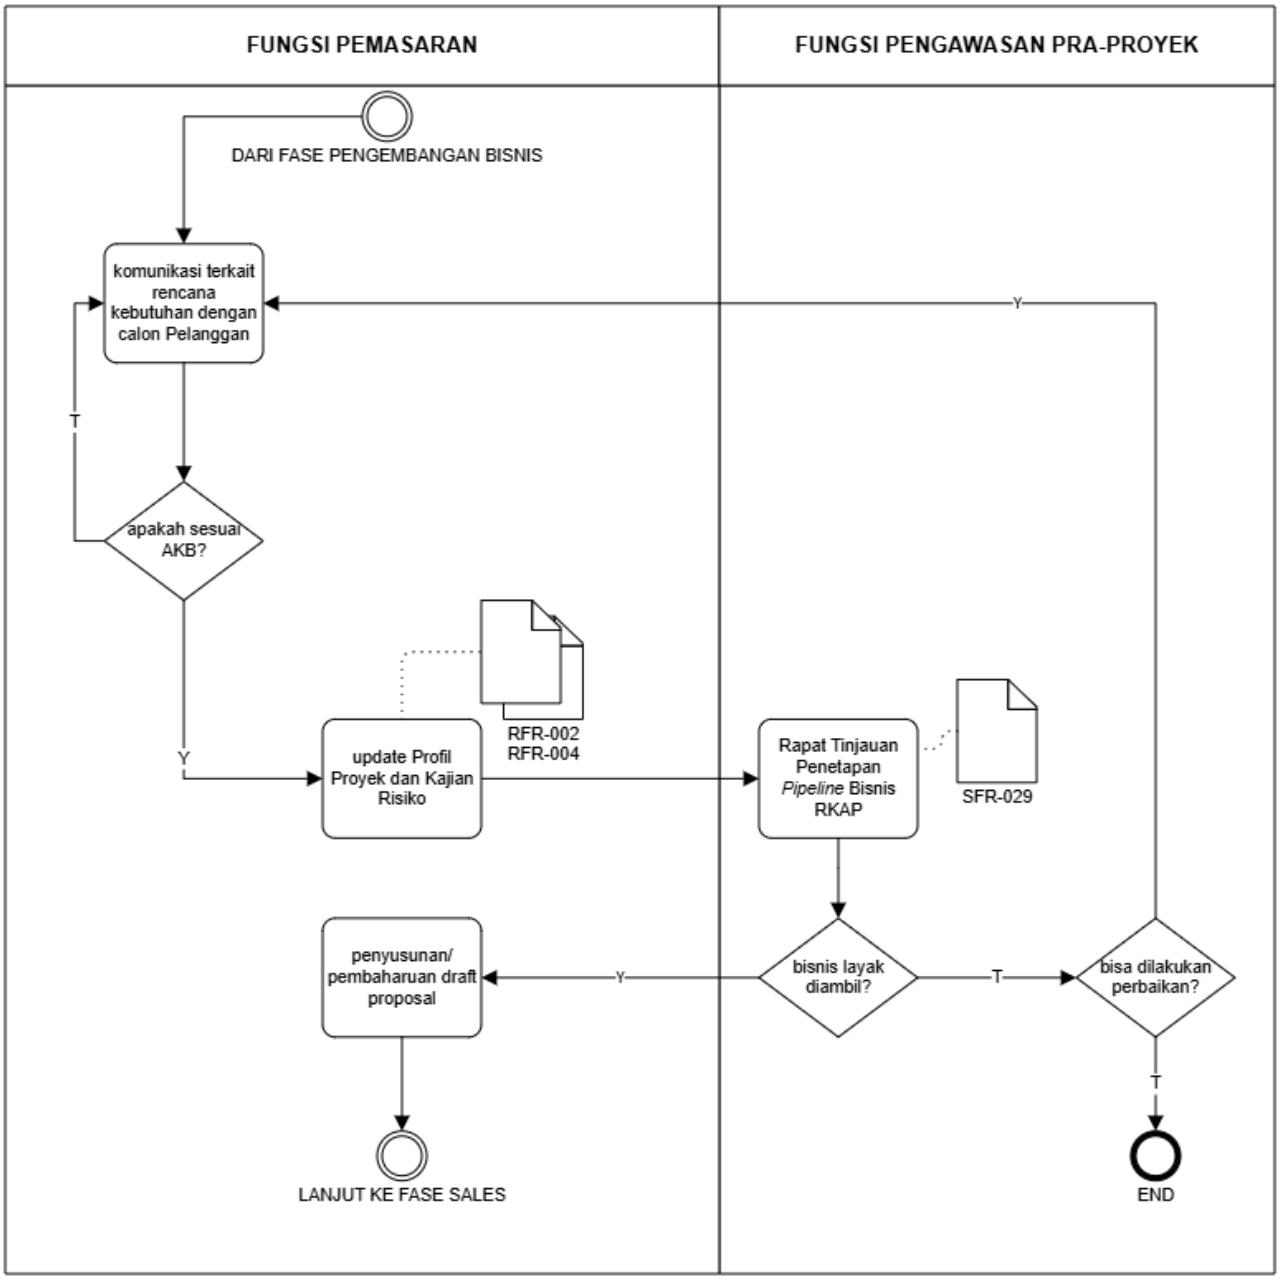

Flowchart 2 : Fase Marketing

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

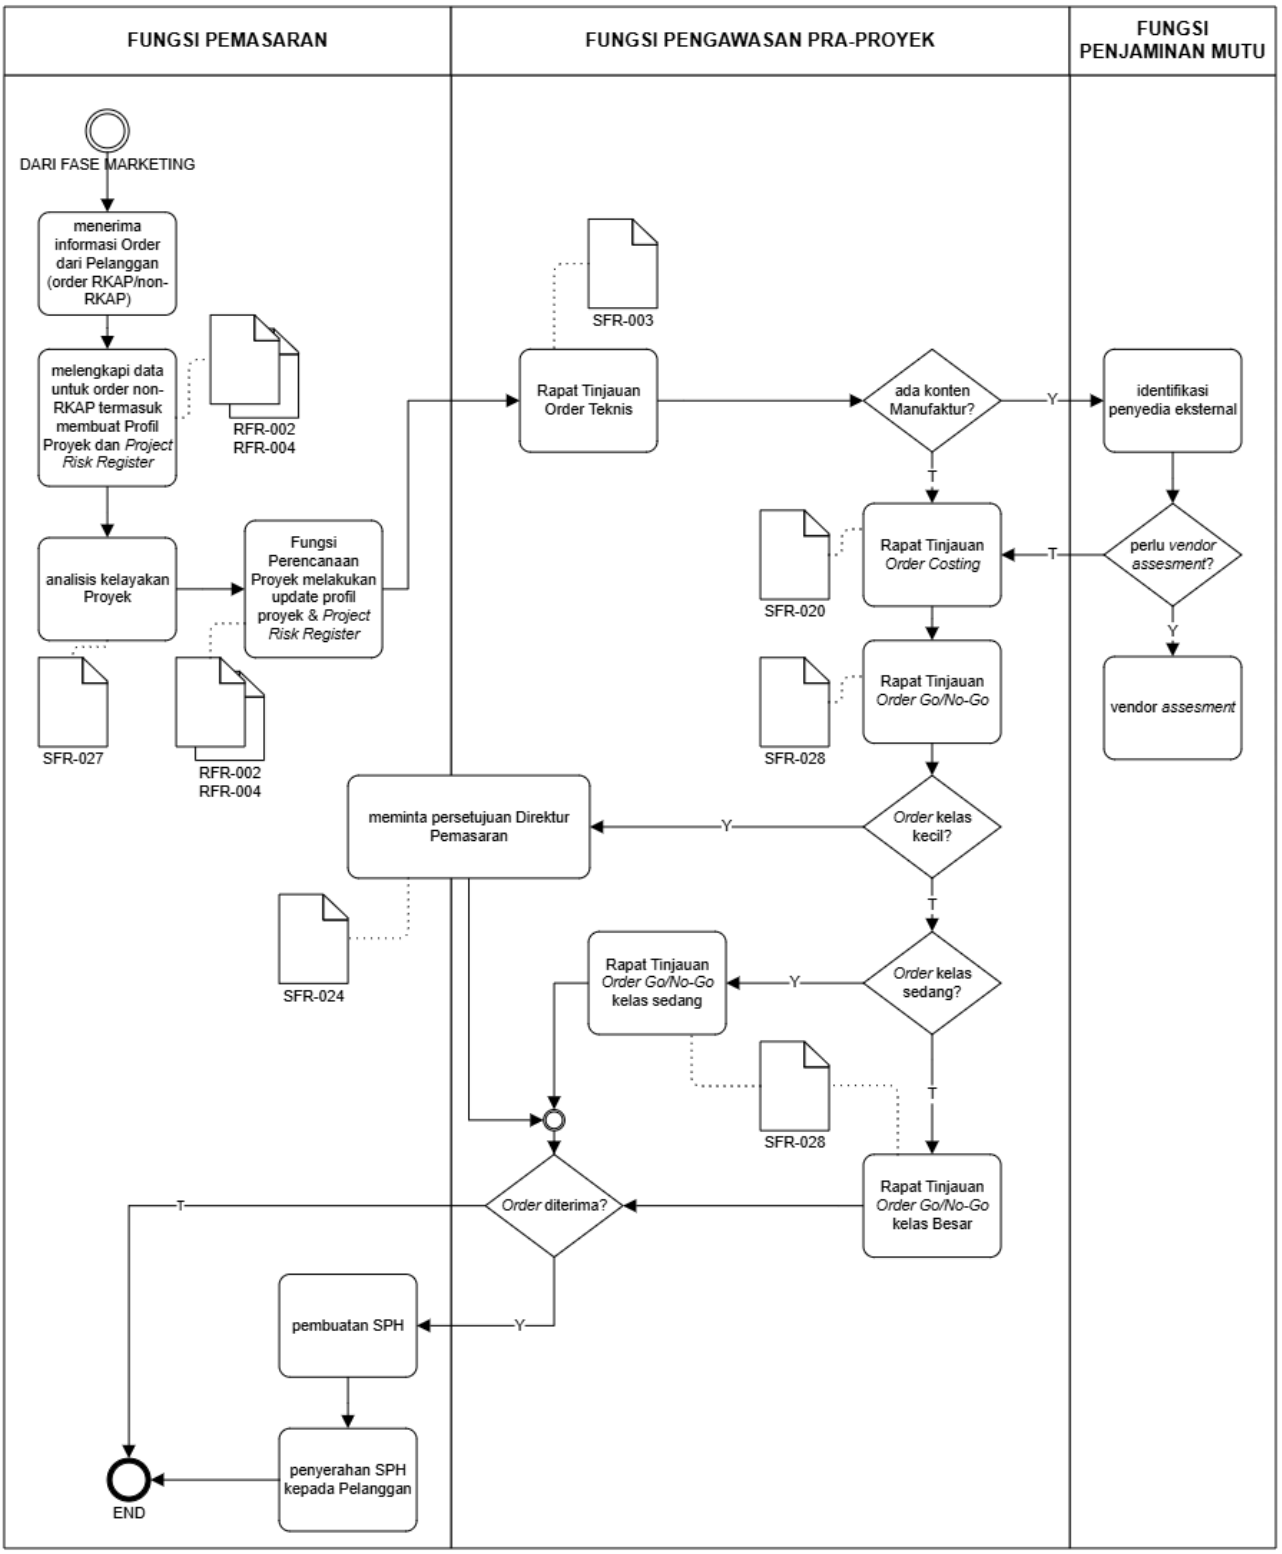

Flowchart 3 : Fase Sales

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN

No.	BAB dan SUB BAB	Versi Baru (Revisi 17)	Versi Baru (Revisi 18)	Keterangan
1	5.1 Fase Pengembangan Bisnis	tidak ada	Fungsi Pengembangan Bisnis juga menyusun secara umum terkait kajian resiko Proyek menggunakan Formulir Project Risk Register (RFR-002) dan profil Proyek menggunakan Formulir Profil Proyek (RFR-004).	
2		Apabila ruang lingkup pekerjaan dari Peluang Bisnis telah dapat didefinisikan, maka Fungsi Pengembangan Bisnis dapat menyelenggarakan rapat Tinjauan Peluang Bisnis.	Apabila ruang lingkup pekerjaan dari Peluang Bisnis telah terdefinisi dengan jelas, maka **Fungsi Pengembangan Bisnis berkoordinasi dengan Fungsi Pengawasan Pra-Proyek** untuk menyelenggarakan Rapat Tinjauan Peluang Bisnis.	
3	5.1.1 Rapat Tinjauan Peluang Bisnis	Aspek yang dievaluasi dalam rapat meliputi, namun tidak terbatas pada : - Aspek Profil (pasar, Pelanggan, Proyek) - Aspek Bisnis (Business Model Canvas) - Aspek Teknis - Aspek Pengadaan - Aspek Risiko	Aspek yang dievaluasi dalam rapat meliputi, namun tidak terbatas pada : Aspek Profil (Pasar, Pelanggan, Proyek) Aspek Bisnis Aspek Teknis Aspek Risiko	
4		tidak ada	Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan apabila dibutuhkan.	
5		Hasil rapat Tinjauan Peluang Bisnis (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir Tinjauan Peluang Bisnis/Tinjauan Penetapan Bisnis RKAP (SFR-023), yang diparaf oleh seluruh peserta rapat secara Sirkuler …..	Hasil Rapat Tinjauan Peluang Bisnis (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam Formulir Tinjauan Peluang Bisnis/Tinjauan Penetapan Bisnis RKAP (SFR-023), yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Peluang Bisnis.	"Sirkuler" dihilangkan
6		…..dan disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).	dipindahkan ke sub-bab 5.6 Penyimpanan dokumen	Informasi terdokumentasi dibuat sub-bab tersendiri
7		Setelah Tinjauan Peluang Bisnis selesai, jika diperlukan pembuatan dokumen Proposal Bisnis maka Fungsi Pengembangan Bisnis mengkoordinir penyusunan dokumen tersebut dibantu oleh fungsi kerja terkait lainnya, dan jika ada permintaan initial price dari calon pelanggan didalam Proposal Bisnis maka Fungsi Perencanaan Proyek menyusun dokumen initial price tersebut dan dikoordinir oleh Fungsi Pemasaran serta dibantu oleh Fungsi Kerja terkait lainnya.	Setelah Tinjauan Peluang Bisnis selesai, jika diperlukan pembuatan dokumen Proposal Bisnis maka Fungsi Pengembangan Bisnis mengkoordinir penyusunan dokumen Proposal Bisnis tersebut dibantu oleh fungsi terkait lainnya, apabila didalam Proposal Bisnis tersebut terdapat permintaan Harga Estimasi Awal (Initial Price) dari calon Pelanggan, maka Fungsi Pengembangan Bisnis berkoordinasi dengan Fungsi Pemasaran dan fungsi terkait untuk menyusun dokumen Harga Estimasi Awal (Initial Price) tersebut.	Fungsi Penyusun initial price diganti dari sebelumnya Fungsi Perencanaan Proyek Menjadi Fungsi Pengembangan Bisnis
8	5.2 Fase marketing	tidak ada	Fungsi Pemasaran juga melakukan Analisis Kelayakan Bisnis menggunakan Formulir Analisis Kelayakan Bisnis (SFR-026) untuk melihat apakah suatu pipeline Proyek termasuk ke dalam kategori upside, downside, atau forecast didasarkan pada penilaian berbagai aspek. Hasil analisis kelayakan ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan Rapat Tinjauan Penetapan *Pipeline* Bisnis RKAP.	
9		tidak ada	Fungsi Pemasaran juga bertanggung jawab untuk membuat (apabila belum ada) dan/atau memperbarui Formulir Project Risk Register (RFR-002) dan Formulir Profil Proyek (RFR-004) yang sudah disusun oleh Fungsi Pengembangan Bisnis pada tahap sebelumnya, baik untuk order yang telah disahkan maupun yang belum disahkan dalam RKAP (dapat mengacu pada dokumentasi Profil Proyek).	

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

<table>
<tr><td>10</td><td>5.2.1 Rapat Tinjauan Penetapan Bisnis RKAP</td><td>5.2.1 Rapat Tinjauan Penetapan Bisnis RKAP</td><td>5.2.1 Rapat Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis RKAP</td><td>Perubahan nama sub-bab</td></tr>
<tr><td>11</td><td></td><td>Tidak ada</td><td>Rapat Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis RKAP diselenggarakan untuk mengevaluasi kelayakan suatu Peluang Bisnis guna menentukan apakah dapat ditindaklanjuti dan ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td></td><td>Tabel 2. Peserta Rapat Tinjauan Penetapan Bisnis RKAP<table><tr><th>No.</th><th>Peran</th><th>Peserta</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemapar Rapat Tinjauan</td><td>• Eselon I/II Fungsi Pengembangan Bisnis
• Eselon I/II Fungsi Pemasaran</td></tr><tr><td>3</td><td>Peninjau Aspek Risiko</td><td>Eselon II Fungsi Manajemen Risiko</td></tr><tr><td>4</td><td>Peninjau Aspek Bisnis</td><td>Eselon I/II Fungsi Perencanaan Perusahaan</td></tr><tr><td>5</td><td>Peninjau Aspek Teknis</td><td>Eselon I/II Fungsi Litbang</td></tr><tr><td>6</td><td>Peninjau Aspek Pengadaan</td><td>• Eselon I/II Fungsi Pengadaan
• Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek</td></tr></table></td><td>Tabel 2. Peserta Rapat Tinjauan Penetapan Bisnis Pipeline<table><tr><th>No</th><th>Peran</th><th>Peserta</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemapar Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Pemasaran</td></tr><tr><td>3</td><td>Peninjau Aspek Profil</td><td>Eselon I/II Fungsi Pengembangan Bisnis</td></tr><tr><td>4</td><td>Peninjau Aspek Bisnis</td><td>Eselon I/II Fungsi Perencanaan Perusahaan</td></tr><tr><td>5</td><td>Peninjau Aspek Risiko</td><td>Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td></td><td>tidak ada</td><td>Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan apabila dibutuhkan.</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td></td><td>Hasil rapat Tinjauan Penetapan Bisnis RKAP (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir Tinjauan Peluang Bisnis/Tinjauan Penetapan Bisnis RKAP (SFR-023) yang diparaf oleh seluruh peserta rapat secara Sirkuler……</td><td>Hasil Rapat Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis RKAP (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam Formulir Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis RKAP (SFR-029), yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait, sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Penetapan Pipeline Bisnis RKAP.</td><td>"Sirkuler" dihilangkan dan Formulir diganti</td></tr>
<tr><td>15</td><td></td><td>……dan disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).</td><td>dipindahkan ke sub-bab 5.6 Penyimpanan dokumen</td><td>Informasi terdokumentasi dibuat sub-bab tersendiri</td></tr>
<tr><td>16</td><td>5.2.4 Penyusunan Dokumen Request For Information (RFI)</td><td>Fungsi Pemasaran mengkoordinasikan penyusunan dokumen Request For Information (RFI) dan initial price produk/jasa perusahaan apabila ada permintaan dari calon pelanggan, dimana dokumen initial price disusun oleh Fungsi Perencanaan Proyek serta dibantu oleh fungsi kerja terkait lainnya.</td><td>Fungsi Pemasaran mengkoordinir penyusunan dokumen Request For Information (RFI) produk/jasa Perusahaan apabila terdapat permintaan dari calon Pelanggan. Dalam penyusunan dokumen RFI tersebut Fungsi Pemasaran didukung oleh fungsi terkait lainnya.</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>5.2.5 Catatan Order dan Tender</td><td>Fungsi Pemasaran bertanggung jawab membuat dan/atau memperbaharui Profil Proyek menggunakan formulir Profil Proyek (RFR-004) dan membuat/memperbaharui Profil Risiko Proyek menggunakan formulir Kajian Risiko Proyek (RFR-002), baik untuk Order yang telah disahkan maupun yang belum disahkan dalam RKAP</td><td>Fungsi Pemasaran bertanggung jawab membuat catatan Order untuk setiap Order yang diterima dari calon Pelanggan, baik Order yang tertulis, tidak tertulis, dan juga untuk setiap kegiatan tender yang diikuti.</td><td></td></tr>
<tr><td>18</td><td></td><td>Fungsi Pemasaran mengkoordinasikan penyusunan/pembaharuan Profil Proyek dan Profil Risiko Proyek bersama Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kerja lainnya bilamana diperlukan</td><td>dihilangkan</td><td></td></tr>
<tr><td>19</td><td>5.3 Fase Sales</td><td>Fungsi Pemasaran memastikan informasi Order telah diperoleh dari calon pelanggan, kemudian melakukan rapat Tinjauan Order.</td><td>Fungsi Pemasaran memastikan informasi Order telah diperoleh dari calon Pelanggan, kemudian melakukan analisis kelayakan Proyek menggunakan Formulir Analisis Kelayakan Proyek (SFR-027) untuk menilai kelayakan Proyek didasarkan pada berbagai aspek. Analisis</td><td></td></tr>
</table>

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

			kelayakan Proyek ini kemudian diperiksa oleh Fungsi Pengawasan PraProyek dan akan ditinjau bersama dalam Rapat Tinjauan Order.	
20		Tidak ada	Fungsi Perencanaan Proyek berkoordinasi dengan Fungsi Manajemen Risiko dan fungsi terkait lainnya melakukan pembaharuan terhadap Formulir Project Risk Register (RFR002) dan Formulir Profil Proyek (RFR-004) yang sudah diperbarui oleh Fungsi Pemasaran pada tahap sebelumnya.	
21	5.3.1.1 Rapat Tinjauan Order-Teknis	■ Aspek Bisnis (termasuk kesesuaian model & lini bisnis perusahaan) ■ Aspek Profil Proyek ■ Aspek Teknis (manajemen proyek dan rekayasa) ■ Aspek Mutu ■ Aspek Pengadaan ■ Aspek Ketersediaan Sumber Daya ■ Aspek Legal ■ Aspek K3L & Sosial ■ Aspek Risiko Proyek ■ Aspek Tata Kelola	■ Aspek Teknis (manajemen proyek dan rekayasa) ■ Aspek Mutu ■ Aspek Pengadaan & Penilaian Manufaktur (apabila ada) ■ Aspek Legal ■ Aspek Risiko Teknis Proyek ■ Aspek SDM ■ Aspek Tata Kelola ■ Aspek K3L ■ Aspek Operasional Proyek (*lesson learned*) ■ Aspek lainnya jika diperlukan	
22		*Tabel 4. Peserta Rapat Tinjauan Order - Teknis* **No. / Peran / Peserta** 1 — Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek 2 — Pemapar Rapat Tinjauan — • Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek 3 — Peninjau Aspek Mutu — Eselon II Fungsi Penjaminan Mutu 4 — Peninjau Aspek Teknis — • Eselon I/II Fungsi Litbang • Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek • Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek 5 — Peninjau Aspek Tata Kelola — Eselon II Fungsi Tata Kelola 6 — Peninjau Aspek Pengadaan — Eselon I/II Fungsi Pengadaan 7 — Peninjau Aspek Ketersediaan Sumber Daya — Eselon I/II Fungsi SDM 8 — Peninjau Aspek Legal — Eselon II Fungsi Legal 9 — Peninjau Aspek K3L & Sosial — • Eselon II Fungsi K3L • Eselon II Fungsi Pengamanan 10 — Peninjau Aspek Risiko — Eselon II Fungsi Manajemen Risiko	*Tabel 3. Peserta Rapat Tinjauan Order - Teknis* **No. / Peran / Peserta** 1 — Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek 2 — Pemapar Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek 3 — Pendukung Pemapar Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Pemasaran 4 — Peninjau Aspek Teknis — Eselon I/II Fungsi Rekayasa Sistem 5 — Peninjau Aspek Mutu — Eselon II Fungsi Penjaminan Mutu 6 — Peninjau Aspek Pengadaan & Penilaian Rekanan Manufaktur (apabila ada) — Eselon I/II Fungsi Pengadaan 7 — Peninjau Aspek Legal — Eselon II Fungsi Legal 8 — Peninjau Aspek Risiko Teknis Proyek — Eselon II Fungsi Manajemen Risiko 9 — Peninjau Aspek SDM — Eselon I/II Fungsi SDM 10 — Peninjau Aspek Tata Kelola — Eselon II Fungsi Tata Kelola 11 — Peninjau Aspek K3L — Eselon II Fungsi K3L 12 — Peninjau Aspek Operasional Proyek (*lesson learned*) — • Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek • Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek	
23		Rapat Tinjauan Order – Teknis dapat dihadiri juga oleh narasumber dari fungsi kerja lain jika diperlukan.	Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan sesuai dengan tingkat risiko Proyek atau klasifikasi Proyek yang membutuhkan peninjauan dari fungsi terkait.	
24		Hasil Rapat Tinjauan Order - Teknis (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir Tinjauan Order - Teknis (SFR-003), yang diparaf oleh seluruh peserta rapat secara Sirkuler……..	Hasil Rapat Tinjauan Order - Teknis, termasuk seluruh usulan dan pendapat, dicatat dalam Formulir Tinjauan Order - Teknis (SFR-003), yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Order – Teknis yang terlibat.	"Sirkuler" dihilangkan
25		…….dan disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002)	dipindahkan ke sub-bab 5.6 Penyimpanan dokumen	Informasi terdokumentasi dibuat sub-bab tersendiri
26		tidak ada	Apabila suatu Proyek teridentifikasi memiliki konten manufaktur, maka Fungsi Penjaminan Mutu bersama fungsi terkait melakukan identifikasi terhadap penyedia eksternal yang berpotensi menjadi pelaksana manufaktur. Selanjutnya, ditetapkan apakah penyedia eksternal tersebut perlu menjalani Vendor Assessment atau tidak, guna menilai mutu penyedia dari berbagai aspek.	paragraf baru terkait proses asesmen vendor manufakturing
27	5.3.1.2 Rapat Tinjauan Order-	Rapat Tinjauan Order – Costing dihadiri oleh para peserta dari fungsi terkait seperti tercantum pada Tabel berikut :	Rapat Tinjauan Order – Costing dihadiri oleh para peserta dari fungsi terkait dan tidak bisa diwakilkan seperti tercantum pada tabel berikut :	penambahan kalimat "dan tidak bisa diwakilkan"

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	Costing			
28		*Tabel 5. Peserta Rapat Tinjauan Order – Costing* **No.** / **Peran** / **Peserta** 1 — Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek 2 — Pemapar Rapat Tinjauan — • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek • Eselon I/II Fungsi Pemasaran 3 — Peninjau Aspek Pengadaan — Eselon I/II Fungsi Pengadaan 4 — Peninjau Aspek Keuangan — • Eselon I/II Fungsi Keuangan • Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran 5 — Peninjau Aspek Risiko — Eselon II Fungsi Manajemen Risiko	*Tabel 4. Peserta Rapat Tinjauan Order – Costing* **No** / **Peran** / **Peserta** 1 — Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek 2 — Pemapar Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek 3 — Pendukung Pemapar — • Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Pengadaan 4 — Peninjau Aspek Keuangan — • Eselon I/II Fungsi Keuangan • Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran 5 — Peninjau Aspek Risiko Keuangan Proyek — Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko 6 — Peninjau Aspek Operasional Proyek (*lesson learned*) — Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek	
29		Struktural yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada Subbab 3.12.	dihilangkan	
30		tidak ada	Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan.	
31		Hasil rapat Tinjauan Order - Costing (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam ***formulir Tinjauan Order - Costing (SFR-020)***, yang diparaf oleh seluruh peserta rapat secara Sirkuler ……	Hasil Rapat Tinjauan Order - Costing, termasuk seluruh usulan dan pendapat, dicatat dalam Formulir Tinjauan Order – Costing (SFR-020), yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Order – Costing.	"Sirkuler" dihilangkan
32		….dan Seluruh formulir disimpan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, mengacu pada Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).	dipindahkan ke sub-bab 5.6 Penyimpanan dokumen	Informasi terdokumentasi dibuat sub-bab tersendiri
33	5.3.1.3.1 Persetujuan Order Kelas Kecil	Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran memastikan pelaksanaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan perusahaan pada proses penanganan Order kelas kecil	dipindahkan ke sub-bab tersendiri	SMAP dibuat sub-bab tersendiri
34	5.3.1.3.2 Persetujuan Order Kelas Sedang	*Tabel 7. Peserta Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Sedang* **No.** / **Peran** / **Peserta*** 1 — Pemimpin Rapat Tinjauan — Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran 2 — Peninjau Aspek Keuangan — Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan Pengendali Anggaran 3 — Peninjau Aspek Ketersediaan Sumber Daya — • Direktur yang membidangi Fungsi SDM • Direktur yang membidangi Fungsi Perencanaan Proyek 4 — Peninjau Aspek Teknis — Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Operasi Produksi (jika ada) 5 — Peninjau Aspek Risiko — Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola 6 — Pemapar Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Pemasaran 7 — Pemapar Rapat Tinjauan — Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek 8 — Penyelenggara & Pemapar Resume Rapat Tinjauan Order – Teknis & *Costing* — Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek *) *Sedikitnya 2 (dua) orang Direksi yang menghadiri Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Sedang (Pemimpin Rapat dan Peninjau Aspek).*	*Tabel 6. Peserta Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Sedang* **No.** / **Peran** / **Peserta** 1 — Pemimpin Rapat Tinjauan — Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran *) 2 — Peninjau Aspek Keuangan dan Ketersediaan Sumber Daya — Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM *) 3 — Peninjau Aspek Teknis, Manajemen Proyek, Pengadaan, dan Produksi (apabila ada) — Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi *) 4 — Peninjau Aspek Risiko dan Tata Kelola — Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola *) 5 — Penyelenggara & Pemapar Resume Rapat Tinjauan *Order* – Teknis & *Costing* — • Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek **) • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek • Eselon I/II Fungsi Pemasaran *Keterangan :* *) *Sedikitnya 2 (dua) Direksi yang menghadiri Rapat Tinjauan Order – Go/No go Kelas Sedang (Pemimpin Rapat dan Peninjau Aspek.* **) *Sebagai Penyelenggara Rapat Tinjauan*	
35		Tidak ada	Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan.	

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

36		Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Sedang dapat terselenggara jika telah mencapai kuorum, dihadiri oleh fungsi kerja terkait dan sedikitnya 2 (dua) orang direksi, yaitu (1) Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran sebagai pemimpin rapat tinjauan, serta (2) Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan/Pengendali Anggaran/SDM/Manajemen Risiko dan/atau Direktur yang membidangi Fungsi Perencanaan Proyek/Rekayasa Sistem /Pengadaan/Manajemen Proyek sebagai peninjau aspek.	Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Sedang dapat diselenggarakan jika telah mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh fungsi terkait dan minimal 2 (dua) orang direksi, dengan susunan sebagai berikut: 1.Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran sebagai Pemimpin Rapat Tinjauan. 2.Salah satu atau lebih dari direktur berikut sebagai peninjau aspek: □ - Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM - Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi - Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola.	
37		tidak ada	Hasil Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Sedang, termasuk seluruh usulan dan pendapat, dicatat dalam Formulir Tinjauan Order - Go/No Go (SFR-028), yang ditanda-tangani sesuai format formulir dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Sedang.	
38		Direksi memastikan pelaksanaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan perusahaan pada proses penanganan Order kelas sedang	dipindahkan ke sub-bab tersendiri	SMAP dibuat sub-bab tersendiri
39	5.3.1.3.3 Persetujuan Order Kelas Besar	*Tabel 8. Peserta Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Besar* **No. / Peran / Peserta*** 1 / Pemimpin Rapat Tinjauan / Direktur Utama 2 / Penyelenggara Rapat Tinjauan / Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran 3 / Peninjau Aspek Keuangan / Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan Pengendali Anggaran 4 / Peninjau Aspek Ketersediaan Sumber Daya / • Direktur yang membidangi Fungsi SDM • Direktur yang membidangi Fungsi Perencanaan Proyek 5 / Peninjau Aspek Teknis / Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Operasi Produksi (jika ada) 6 / Peninjau Aspek Risiko / Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola 7 / Pemapar Rapat Tinjauan / • Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek 8 / Penyelenggara & Pemapar Resume Rapat Tinjauan Order - Teknis & *Costing* / Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek *) *Sedikitnya 3 (tiga) orang Direksi yang menghadiri Rapat Tinjauan Order – Go/No Go Kelas Besar (Pemimpin Rapat, Penyelenggara Rapat, dan Peninjau Aspek).*	*Tabel 7. Peserta Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Besar* **No. / Peran / Peserta** 1 / Pemimpin Rapat Tinjauan / Direktur Utama 2 / Penyelenggara Rapat Tinjauan / Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran *) 3 / Peninjau Aspek Keuangan dan Ketersediaan Sumber Daya / Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM **) 4 / Peninjau Aspek Teknis, Manajemen Proyek, Pengadaan, dan Produksi (apabila ada) / Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi **) 5 / Peninjau Aspek Risiko dan Tata Kelola / Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola **) 6 / Penyelenggara dan Pemapar Resume Rapat Tinjauan Order - Teknis & *Costing* / • Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek ***) • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek • Eselon I/II Fungsi Pemasaran *Keterangan :* ** Pihak yang mengundang, membuka dan menutup rapat* *** Minimal salah satu Direksi* **** Pihak yang melakukan aktivitas administrasi rapat seperti membuat daftar hadir rapat, membuat notulensi rapat, mengarsipkan dan memonitor tindak-lanjut keputusan rapat.*	
40		Tidak ada	Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan (termasuk Direksi) apabila dibutuhkan.	
41		Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Besar dapat terselenggara jika telah mencapai kuorum, dihadiri oleh Fungsi Kerja terkait dan sedikitnya 3 (tiga) orang Direksi, yaitu (1) Direktur Utama sebagai pemimpin rapat tinjauan, (2) Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran sebagai penyelenggara rapat tinjauan, serta (3) Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan/Pengendali Anggaran/SDM dan/atau Direktur yang membidangi Fungsi Perencanaan Proyek/Rekayasa Sistem/Pengadaan/Manajemen Proyek dan/atau Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko/Tata Kelola sebagai peninjau aspek.	Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Besar dapat diselenggarakan jika telah mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh fungsi-fungsi terkait dan minimal 3 (tiga) orang direksi, dengan susunan sebagai berikut: 1.Direktur utama sebagai Pemimpin Rapat Tinjauan. 2.Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran sebagai Penyelenggara Rapat Tinjauan 3.Salah satu atau lebih dari direktur berikut sebagai peninjau aspek: - Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM - Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi - Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola	
42		tidak ada	Penyelenggara Rapat dapat mengundang pihak lain di luar daftar peserta Rapat Tinjauan apabila dibutuhkan.	

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

43		tidak ada	Hasil Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Besar, termasuk seluruh usulan dan pendapat, dicatat dalam Formulir Tinjauan Order - Go/No Go (SFR-028), yang ditanda-tangani sesuai format formulir dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Order - Go/No Go Kelas Besar.	
44		Direksi memastikan pelaksanaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan perusahaan pada proses penanganan Order kelas sedang	dipindahkan ke sub-bab tersendiri	SMAP dibuat sub-bab tersendiri
45	5.3.2 Hasil Tinjauan Order - Go/No Go	Hasil Rapat Tinjauan Order - Go/No Go (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir Risalah Rapat (CFR-022) yang diparaf oleh seluruh peserta rapat secara Sirkuler dan disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).	dihilangkan	
46	5.3.3 Tim Tender	.....seluruh ini sub-bab.....	Sub-bab ini dihilangkan	
47	5.3.4 Klarifikasi & Negosiasi	Fungsi Pemasaran memastikan pelaksanaan dan pengawasan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada proses klarifikasi dan/atau negosiasi.	dipindahkan ke sub-bab tersendiri	SMAP dibuat sub-bab tersendiri
48	5.4 Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data	tidak ada tabel	*Tabel 9. Fungsi yang Mendapatkan Hak Akses PIS Non PDF* **No.** / **Fungsi** / **Kebutuhan** / **Lingkup Akses Informasi** 1 / Fungsi Pemasaran / Pemasaran dan Penjualan / Aspek *costing* tertentu sesuai dengan kebutuhan 2 / Fungsi Pengadaan / Pengadaan / HPS/Harga Perkiraan Sendiri 3 / Fungsi SDM / Penempatan SDM Proyek / Kelas Proyek 4 / Fungsi Manajemen Risiko / Pengelolaan Risiko Proyek / Kelas Proyek 5 / Fungsi Perencanaan Proyek / Perencanaan Proyek / Akses Penuh 6 / Fungsi Pengendali Anggaran / Monitoring Anggaran / Akses Penuh 7 / Fungsi Pengawasan Pra-Proyek / Perencanaan Proyek / Akses Penuh 8 / Fungsi Keuangan / Monitoring Anggaran / Copy Value	Penambahan Tabel
49	5.5 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	tidak ada	Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan perusahaan pada proses Penanganan Peluang & Order Bisnis ini.	
50	5.6 Informasi terdokumentasi	tidak ada	Seluruh hasil kegiatan yang tercatat dalam Prosedur ini baik berbentuk formulir, risalah rapat, klarifikasi, negosiasi maupun dokumen dan rekaman lainnya, disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).	

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).
