| | |
|---|---|
| PT Len Industri (Persero) | Halaman<br>**1 dari 28** |
| **ROP-910**<br>**PENGELOLAAN RISIKO OPERASIONAL UNIT KERJA** | Revisi:<br>**03** |

| Disusun oleh : | Direviu oleh: | | Disetujui oleh : |
|---|---|---|---|
| SGM Governance, Risk Management & Compliance | GM Business Process Management | Management Representative | Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko |
| Tanggal : 07/02/2025<br>Tanda Tangan : | Tanggal : 07/2/2025<br>Tanda Tangan : | Tanggal : 07/02/2025<br>Tanda Tangan : | Tanggal : 10/02/2025<br>Tanda Tangan : |
| (Nia Herminanti Mustopa) | (Yunika Sopandi) | (Atih Nurhayati) | (Amalia Maya Fitri) |

## DAFTAR REVISI

| No Revisi | Tanggal revisi | Halaman yang terkait | Paraf |
|---|---|---|---|
| 00 | 14/10/2016 | Semua halaman terbitan pertama | FN |
| 01 | 29/01/2020 | Semua halaman | AF |
| 02 | 02/07/2020 | Halaman 8,9 dan 11 | TH |
| 03 | 10/02/2025 | Semua halaman | FB |
| | | | |
| | | | |

# DAFTAR ISI

**DAFTAR REVISI .......... 1**

**DAFTAR ISI.......... 2**

**1.0 TUJUAN.......... 4**

**2.0 RUANG LINGKUP .......... 4**

**3.0 DEFINISI .......... 4**

3.1 Bagian .......... 4

3.2 Batas Risiko *(Risk Limit)*.......... 4

3.3 Dampak.......... 4

3.4 Divisi .......... 4

3.5 Kemungkinan .......... 4

3.6 Kontrol Yang Ada (*Existing Control*) .......... 5

3.7 Level Risiko.......... 5

3.8 Manajemen Risiko.......... 5

3.9 Peta Risiko .......... 5

3.10 Proses Risiko .......... 5

3.11 Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan atau disingkat RKAP.......... 5

3.12 Risiko (*Risk*) .......... 5

3.13 Risiko Inheren .......... 5

3.14 Risiko Positif.......... 5

3.15 Risiko Residual.......... 5

3.16 Risiko Unit Kerja.......... 6

3.17 Risiko Utama.......... 6

3.18 *Risk Ambassador* .......... 6

3.19 Risk Register.......... 6

3.20 Skala Dampak.......... 6

3.21 Skala Kemungkinan .......... 6

3.22 Unit Kerja .......... 6

**4.0 DOKUMEN TERKAIT .......... 6**

**5.0 PROSEDUR.......... 7**

5.1. Perencanaan ........ 7

5.1.1. Pemetaan Konteks ........ 7

5.1.2. Penilaian Risiko ........ 9

5.1.3. Penetapan Risiko Awal Tahun ........ 15

5.2. Pemantauan dan Evaluasi ........ 16

5.2.1. Pelaksanaan dan Pemantauan Perlakuan Risiko ........ 16

5.2.2. Pelaporan ........ 17

5.2.3. Evaluasi ........ 18

**6.0 FORMULIR TERKAIT ........ 18**

**7.0 ALUR PROSES ........ 19**

**Lampiran 1. Matriks Perubahan ROP-910 ........ 20**

## 1.0 TUJUAN

- Mendorong tercapainya sasaran Unit Kerja dan sasaran perusahaan melalui perencanaan berbasis Risiko dan pengelolaan Risiko yang efektif.
- Menjadi acuan bagi Unit Kerja dalam penerapan Manajemen Risiko di dalam lingkup Unit Kerja yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

## 2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi proses Manajemen Risiko di Unit Kerja, yaitu:

- Proses perencanaan, yang terdiri dari proses pemetaan konteks, proses penilaian Risiko, dan proses penetapan Risiko Unit Kerja awal tahun.
- Proses pemantauan dan evaluasi, yang terdiri dari proses pelaksanaan dan pemantauan perlakuan Risiko, proses pelaporan, dan proses evaluasi.

## 3.0 DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam proses pengelolaan Risiko Unit Kerja.

### 3.1 Bagian

Unit Kerja yang dipimpin oleh seorang Eselon-2 yang memiliki atasan Eselon-1.

### 3.2 Batas Risiko *(Risk Limit)*

Nilai batasan Risiko yang menjadi acuan bagi Unit Kerja yang ditetapkan setiap tahun oleh perusahaan.

### 3.3 Dampak

Konsekuensi atau potensi kerugian baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat dinyatakan secara kuantitatif atau kualitatif.

### 3.4 Divisi

Unit Kerja yang dipimpin oleh seorang Eselon-1 dan Unit Kerja yang dipimpin oleh seorang Eselon-2 yang tidak memiliki atasan Eselon-1.

### 3.5 Kemungkinan

Peluang atau kemungkinan suatu kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang dengan derajat antara tidak mungkin terjadi (0%) sampai dengan pasti terjadi (100%).

## 3.6 Kontrol Yang Ada (*Existing Control*)

Pengendalian/kontrol yang sudah terbangun dalam upaya mengurangi atau menghindari terjadinya Risiko.

## 3.7 Level Risiko

Tingkatan Risiko yang terdiri dari 5 (lima) level yaitu *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High* atau *High*.

## 3.8 Manajemen Risiko

Serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, memantau dan mengevaluasi, serta mencatat dan melaporkan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha.

## 3.9 Peta Risiko

Matriks berdimensi 5x5 yang memetakan antara Skala Dampak dengan Skala Kemungkinan.

## 3.10 Proses Risiko

Proses pengelolaan Risiko yang terdiri dari proses perencanaan dan proses pemantauan dan evaluasi.

## 3.11 Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan atau disingkat RKAP

Rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang.

## 3.12 Risiko (*Risk*)

Suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada sasaran perusahaan.

## 3.13 Risiko Inheren

Risiko yang masih melekat setelah memperhitungkan Kontrol Yang Ada (*existing* control) yang dijalankan dalam aktivitas proses bisnis.

## 3.14 Risiko Positif

Efek positif dari ketidakpastian terhadap sasaran dan/atau manfaat dari realisasi rencana perlakuan Risiko.

## 3.15 Risiko Residual

Risiko yang masih melekat setelah dilakukan perlakuan Risiko.

### 3.16 Risiko Unit Kerja

Risiko yang berdampak pada sasaran Unit Kerja.

### 3.17 Risiko Utama

Risiko yang berkontribusi secara signifikan memengaruhi pencapaian sasaran perusahaan dan/atau sesuai diskresi pemegang saham dan/atau manajemen yang perlu mendapat perhatian utama.

### 3.18 *Risk Ambassador*

Individu yang ditunjuk untuk membantu kepala Unit Kerja dalam proses pengelolaan Risiko Unit Kerja, yang menjadi bagian dari tim *counterpart* sistem manajemen.

### 3.19 Risk Register

Tabel yang berisi informasi mengenai Risiko Unit Kerja, yang digunakan sebagai alat bantu pengelolaan Risiko Unit Kerja, dan diformulasikan sebagai formulir standard pengelolaan Risiko Unit Kerja yakni ***Risk Register Unit Kerja (RFR-001)***.

### 3.20 Skala Dampak

Rentang Dampak yang dinyatakan dalam angka 1 (satu) sampai 5 (lima)..

### 3.21 Skala Kemungkinan

Rentang Kemungkinan yang dinyatakan dalam angka 1 (satu) sampai 5 (lima).

### 3.22 Unit Kerja

Unit pemilik Risiko (*risk owner*) dalam struktur organisasi perusahaan yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan mengelola Risiko dalam proses bisnis.

## 4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002)***
- ***Prosedur Sasaran Kerja Unit (QOP – 810)***
- ***Template RKAP***

# 5.0 PROSEDUR

Proses pengelolaan Risiko Unit Kerja terdiri dari dua proses besar, yaitu proses perencanaan dan proses pemantauan dan evaluasi, yang diuraikan lebih lanjut menjadi proses pemetaan konteks, proses penilaian Risiko, proses penetapan Risiko awal tahun, proses pelaksanaan dan pemantauan perlakuan Risiko, proses pelaporan, serta proses evaluasi. Keseluruhan proses ini memiliki siklus periode tahunan yang dimulai bersama dengan proses penyusunan rencana strategis RKAP berbasis Risiko.

Siklus periode tahunan proses pengelolaan Risiko Unit Kerja untuk tahun Y dimulai bersamaan dengan penyebaran *template* RKAP oleh Fungsi Perencanaan Perusahaan yang harus dilengkapi setiap Unit Kerja pada triwulan III atau IV tahun Y-1, dan berlangsung sepanjang tahun Y.

## 5.1. Perencanaan

### 5.1.1. Pemetaan Konteks

Pemetaan Konteks perlu dilakukan untuk memahami lingkungan eksternal dan internal yang merefleksikan kondisi spesifik Unit Kerja.
Pemetaan Konteks terdiri dari:

1. **Analisis SWOT** untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap Unit Kerja.

    a. **Kekuatan (*strength*)** yaitu hal-hal yang sudah berjalan baik di Unit Kerja, hal-hal unik yang menjadi kelebihan Unit Kerja, serta hal-hal yang dipandang para pemangku kepentingan sebagai kelebihan Unit Kerja.

    b. **Kelemahan (*weakness*)** yaitu hal-hal yang masih dapat diperbaiki/ditingkatkan dalam Unit Kerja, hal-hal yang tidak/belum dimiliki Unit Kerja, serta hal-hal yang dipandang para pemangku kepentingan sebagai kekurangan Unit Kerja.

    c. **Peluang (*opportunity*)** yaitu kesempatan yang bisa diambil, tren yang bisa dimanfaatkan, serta kekuatan yang bisa diubah menjadi peluang.

    d. **Ancaman (*threat*)** yaitu hal-hal yang dapat membahayakan Unit Kerja dan perusahaan secara umum, kompetisi, serta kelemahan yang terekspos.

## 2. Identifikasi Sasaran, Proses Bisnis, dan Pemangku Kepentingan

a. **Sasaran** adalah sasaran yang perlu dicapai oleh Unit Kerja, sebagai bagian dari sasaran perusahaan yang lebih besar. Sasaran ini perlu memiliki dasar/landasan, antara lain:

- KPI (*Key Performance Indicators*) / SKU (Sasaran Kerja Unit), baik berupa usulan dalam *template* RKAP, rancangan untuk dilakukan pembahasan, ataupun sudah ditetapkan. Penyusunan SKU diatur secara tersendiri dalam Prosedur ***Sasaran Kerja Unit (QOP-810)***.
- Tugas Pokok dan Fungsi yang melekat pada masing-masing Unit Kerja sesuai struktur organisasi perusahaan.
- Arahan pimpinan dan/atau harapan pemangku kepentingan lainnya.
- Pemenuhan standar ISO ataupun standar-standar lain yang terkait dengan Unit Kerja.
- Kepatuhan terhadap regulasi, kebijakan, dan/atau aturan lainnya yang berlaku terhadap Unit Kerja dan perusahaan secara umum, baik berasal dari eksternal maupun internal perusahaan.
- Dasar lain selain dari yang sudah disebutkan di atas.

Dalam menyusun sasaran, Unit Kerja juga perlu memperhatikan kaidah SMART, yaitu spesifik (*specific*), dapat terukur (*measurable*), mungkin dicapai (*achievable*), relevan dengan sasaran besar perusahaan (*relevant*), serta memiliki tenggat waktu yang jelas (*time-bound*).

b. **Proses bisnis** adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan Unit Kerja sesuai tugas dan wewenangnya, untuk mencapai setiap sasaran yang sudah disusun sebelumnya. Perlu diperhatikan juga apa saja masukan (input) yang dibutuhkan dari sebuah proses bisnis (misalnya: Fungsi Perencanaan Proyek membutuhkan masukan data spesifikasi teknis proyek dan harga barang) serta keluaran (*output*) yang dihasilkan dari proses tersebut (misalnya: sebuah kajian atau laporan tertentu).

c. **Pemangku kepentingan (*stakeholders*)** adalah pihak-pihak yang terkait dengan proses bisnis di Unit Kerja, baik eksternal maupun internal perusahaan (misalnya: pemegang saham, anak perusahaan, pelanggan, pemasok, mitra, unit kerja lain, karyawan).

### 5.1.2. Penilaian Risiko

Setiap sasaran dan proses bisnis harus dilakukan Penilaian Risiko oleh Unit Kerja, yang terdiri dari identifikasi Risiko, kuantifikasi Risiko, rencana perlakuan Risiko, dan penyelarasan Risiko.

#### 1. Identifikasi Risiko

Setiap Unit Kerja mengidentifikasi Risiko yang dapat mengganggu sasaran dan proses bisnis menggunakan Formulir ***Risk Register Unit Kerja (RFR-001)***. Dalam prosesnya, Unit Kerja dapat berkoordinasi/berkonsultasi dengan Fungsi Manajemen Risiko. Hasil identifikasi Risiko mencakup Peristiwa Risiko, Taksonomi Risiko, Penyebab Risiko, Dampak dan perkiraan waktu terpapar oleh Risiko, serta Kontrol Yang Ada (*existing control*).

**a. Peristiwa Risiko**

Yakni suatu peristiwa atau kejadian yang dianggap sebagai Risiko. Peristiwa Risiko yang dimaksud mencakup Risiko yang memang melekat pada proses bisnis, Risiko yang muncul karena Unit Kerja dan/atau perusahaan mengambil sasaran dan strategi sebagai inisiatif untuk *unlock value*, dan Risiko karena adanya gejala perubahan lingkungan bisnis. Oleh karena itu, dalam mengidentifikasi Peristiwa Risiko Unit Kerja perlu memperhatikan:

1) Konteks yang sudah dipetakan;
2) Pengelolaan Risiko Unit Kerja periode sebelumnya;
3) Harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan;
4) Kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, baik aturan eksternal maupun internal;
5) Risiko terkait aktivitas yang memengaruhi laporan keuangan;
6) Risiko terkait mutu, K3L, keamanan siber dan perlindungan data, serta penyuapan, *fraud* dan gratifikasi;
7) Risiko terkait perubahan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, iklim dan lingkungan.

Peristiwa Risiko yang diidentifikasi bukan merupakan Penyebab Risiko ataupun Dampak Risiko dan juga bukan berupa negasi atau kalimat kebalikan dari sasaran.

**b. Taksonomi Risiko**

Yakni mengelompokkan Peristiwa Risiko yang sudah diidentifikasi ke dalam klasifikasi pada Taksonomi Risiko sebagaimana dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1 Taksonomi Risiko

| Tema Risiko (T1) | | Kategori Risiko (T2) | | Kelompok Peristiwa Risiko (T3) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portofolio BUMN | 1.1 | Fiskal | 1.1.1 | Terkait Dividen |
| | | | | 1.1.2 | Terkait Penyertaan Modal Negara |
| | | | | 1.1.3 | Terkait Subsidi dan Kompensasi |
| | | 1.2 | Kebijakan | 1.2.1 | Terkait Kebijakan Sumber Daya Manusia |
| | | | | 1.2.2 | Terkait Kebijakan Sektoral |
| | | 1.3 | Komposisi | 1.3.1 | Terkait Konsentrasi Portofolio |
| 2 | Struktur Korporasi dan Organisasi | 2.1 | Struktur Korporasi | 2.1.1 | Terkait Struktur Korporasi |
| | | 2.2 | Restrukturisasi dan Reorganisasi | 2.2.1 | Terkait Penggabungan, Pengambilalihan, Peleburan, Pemisahan, Pembubaran, Likuidasi, Kemitraan, dan Restrukturisasi |
| 3 | Bisnis BUMN | 3.1 | Industri Pertahanan | 3.1.1 | Terkait Formulasi Strategis |
| | | | | 3.1.2 | Terkait Pasar dan Makroekonomi |
| | | | | 3.1.3 | Terkait Keuangan |
| | | | | 3.1.4 | Terkait Hukum, Reputasi, dan Kepatuhan |
| | | | | 3.1.5 | Terkait Proyek |
| | | | | 3.1.6 | Terkait Teknologi Informasi dan Keamanan Siber |
| | | | | 3.1.7 | Terkait Sosial dan Lingkungan |
| | | | | 3.1.8 | Terkait Operasional |
| 4 | Lainnya | 4.1 | Lainnya | 4.1.1 | Terkait Lainnya |

a. **Penyebab Risiko**

Yakni hal-hal yang dapat menyebabkan munculnya suatu Peristiwa Risiko. Untuk memastikan tidak ada Penyebab Risiko yang terlewat, uji dengan pertanyaan, “Jika penyebab Risiko tersebut ditangani/tidak ada, apakah Risiko tersebut masih mungkin terjadi?” Jika jawabannya “Ya”, maka tuliskan kembali Penyebab Risiko lainnya.

Dokumen [illegible]
26 OKT 2026 09:30

b. **Dampak Risiko**

Yakni akibat/dampak apa saja yang mungkin timbul jika Peristiwa Risiko terjadi dalam periode pengelolaan Risiko Unit Kerja. Jelaskan juga perkiraan waktu Unit Kerja akan terpapar oleh Risiko tersebut.

Dampak Risiko dibedakan menjadi Dampak Kualitatif dan Dampak Kuantitatif. Untuk Dampak Kuantitatif, maka uraian dampak harus dapat dikuantifikasi ke dalam nilai rupiah, misalnya dengan menggunakan potensi laba yang hilang untuk Unit Kerja *profit generator* atau potensi penambahan biaya untuk Unit Kerja non-*profit generator*. Dasar yang akhirnya digunakan sebagai perhitungan nilai rupiah Dampak ini agar disertakan untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi di kemudian hari.

c. **Kontrol Yang Ada**

Yakni kebijakan, prosedur, sistem informasi dan komunikasi, atau sistem lainnya yang dapat mendeteksi, mencegah, atau memperbaiki timbulnya Risiko.

Unit Kerja perlu melakukan *control self-assessment* (CSA) atas kecukupan desain/rancangan kontrol dan atas efektivitas pelaksanaan kontrol dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1) Pertanyaan untuk menguji kecukupan desain kontrol:
   - Apakah desain kontrol telah mampu membuat manajemen dan karyawan menjalankan tugasnya untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya Risiko?
   - Apakah desain kontrol telah dirancang untuk memitigasi Risiko?
   - Apakah kontrol yang sudah dijalankan telah terdapat dokumen desain kontrolnya secara memadai?
   - Apakah terdapat Risiko Unit Kerja yang belum memiliki desain kontrol?

   Kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah desain kontrol cukup atau tidak cukup.

2) Pertanyaan untuk menguji efektivitas pelaksanaan kontrol:
   - Apakah pelaksanaan kontrol telah efektif mencapai tujuan kontrol?
   - Apakah kontrol telah dilaksanakan sesuai dengan desain kontrolnya secara konsisten?
   - Apakah manajemen dan karyawan telah melaksanakan tugas sesuai dengan kontrol untuk memitigasi Risiko?

Kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pelaksanaan kontrol efektif, efektif sebagian, atau tidak efektif.

Dengan demikian hasil *control self-assessment* (CSA) adalah kombinasi dari dua kesimpulan di atas, yaitu: 1) cukup dan efektif, 2) cukup dan efektif sebagian, 3) cukup dan tidak efektif, 4) tidak cukup dan efektif sebagian, dan 5) tidak cukup dan tidak efektif.

## 2. Kuantifikasi Risiko

Atas Risiko yang sudah diidentifikasi, perlu dilakukan kuantifikasi untuk mendapatkan Skala Dampak, Skala Kemungkinan, dan Level Risiko, baik untuk Risiko Inheren (yang telah memperhitungkan Kontrol Yang Ada), target Risiko Residual (memperhitungkan rencana perlakuan Risiko), dan realisasi Risiko Residual (memperhitungkan realisasi perlakuan Risiko).

a. **Skala Dampak** didapat dengan menggunakan salah satu kriteria Dampak Kuantitatif atau kriteria Dampak Kualitatif yang dapat dilihat pada petunjuk pengisian Risk Register Unit Kerja. Kriteria yang kemudian dipilih untuk digunakan mendapatkan Skala Dampak perlu dipastikan tercatat agar memudahkan pemantauan dan evaluasi di kemudian hari.

   Nilai Batas Risiko yang digunakan Unit Kerja dalam menentukan Skala Dampak Kuantitatif ditetapkan setiap tahun oleh perusahaan sebagai bagian dari strategi Risiko perusahaan. Apabila Batas Risiko belum ditetapkan saat Unit Kerja melakukan penilaian Risiko, maka Unit Kerja dapat menggunakan Batas Risiko tahun sebelumnya dan direvisi kemudian setelah Batas Risiko ditetapkan.

b. **Skala Kemungkinan** didapat dengan menggunakan salah satu Kriteria Kemungkinan yang dapat dilihat pada petunjuk pengisian Risk Register Unit Kerja. Kriteria yang kemudian dipilih untuk digunakan mendapatkan Skala Kemungkinan perlu dipastikan tercatat agar memudahkan pemantauan dan evaluasi di kemudian hari.

c. **Level Risiko** didapat dari pemetaan Skala Dampak dan Skala Kemungkinan dengan ketentuan sebagaimana tergambar dalam Peta Risiko dan Kriteria Level Risiko sebagai berikut:

Diagram 5.1 Peta Risiko

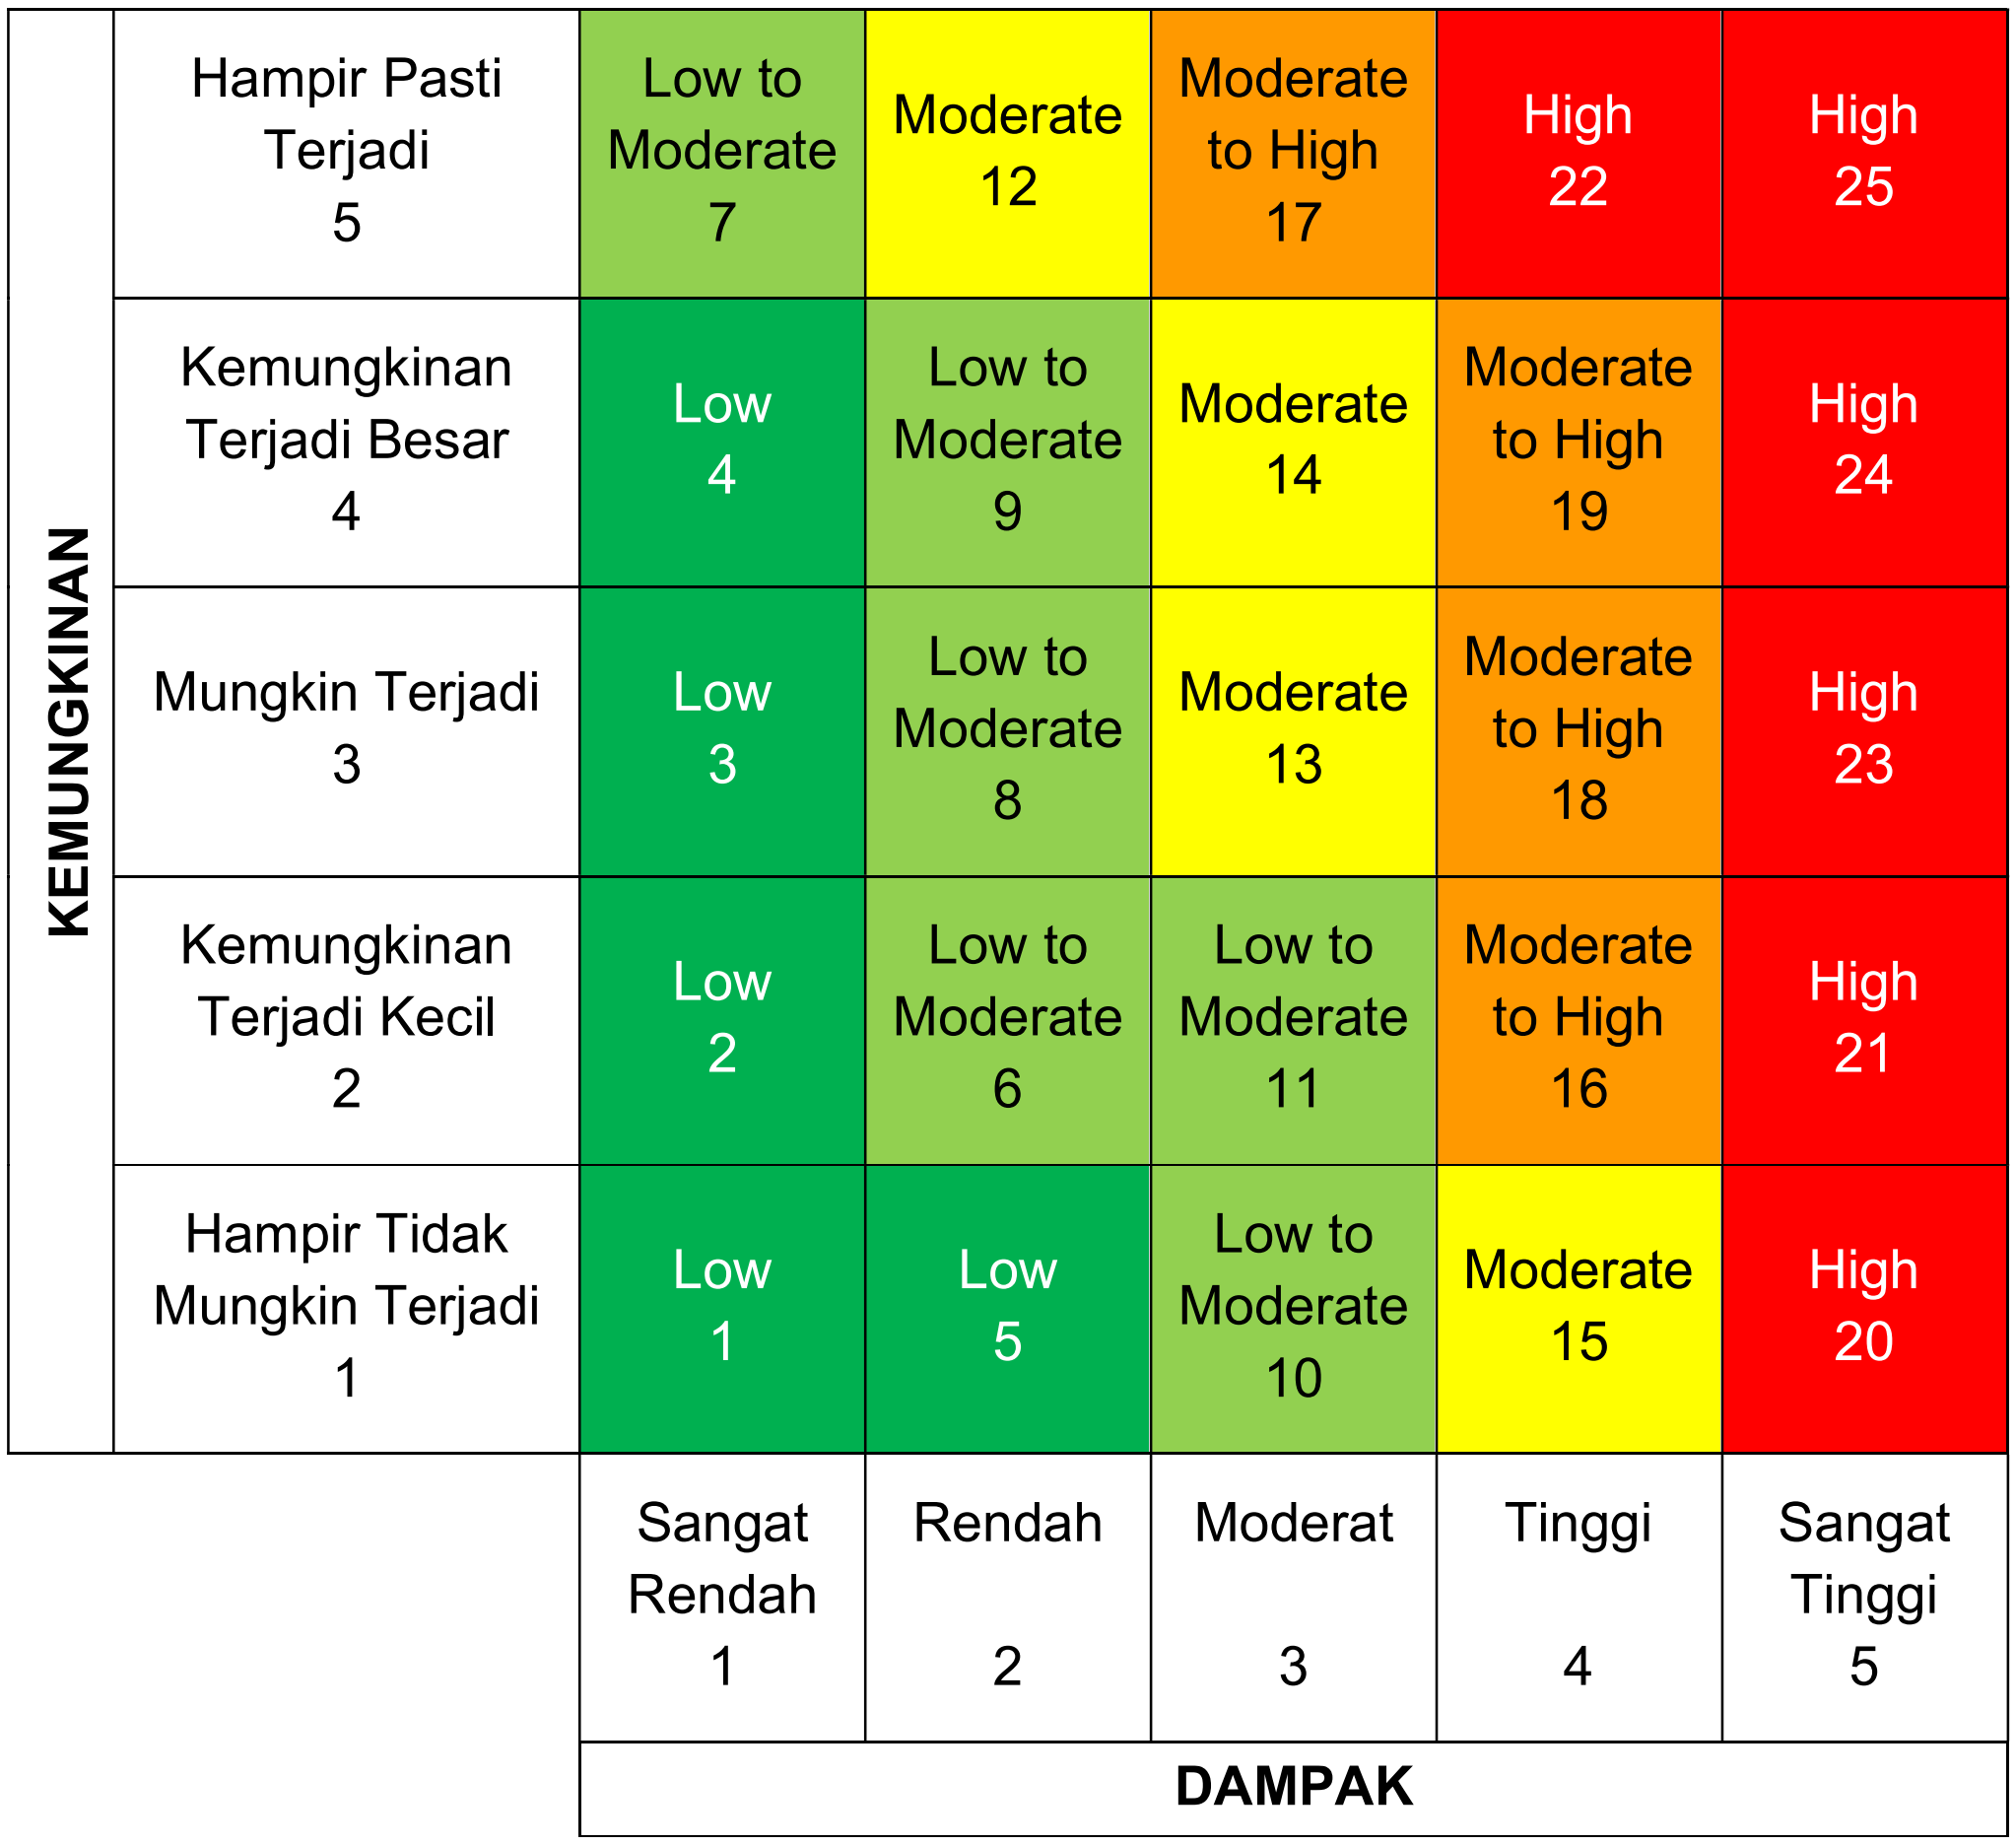

| **KEMUNGKINAN** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Hampir Pasti Terjadi 5 | Low to Moderate 7 | Moderate 12 | Moderate to High 17 | High 22 | High 25 |
| | Kemungkinan Terjadi Besar 4 | Low 4 | Low to Moderate 9 | Moderate 14 | Moderate to High 19 | High 24 |
| | Mungkin Terjadi 3 | Low 3 | Low to Moderate 8 | Moderate 13 | Moderate to High 18 | High 23 |
| | Kemungkinan Terjadi Kecil 2 | Low 2 | Low to Moderate 6 | Low to Moderate 11 | Moderate to High 16 | High 21 |
| | Hampir Tidak Mungkin Terjadi 1 | Low 1 | Low 5 | Low to Moderate 10 | Moderate 15 | High 20 |
| | | Sangat Rendah 1 | Rendah 2 | Moderat 3 | Tinggi 4 | Sangat Tinggi 5 |
| | | **DAMPAK** | | | | |

Tabel 5.2 Kategori Skala Risiko dan Level Risiko

| **Skala Risiko** | **Level Risiko** |
|---|---|
| 1–5 | Low |
| 6–11 | Low to Moderate |
| 12–15 | Moderate |
| 16–19 | Moderate to High |
| 20–25 | High |

## 3. Rencana Perlakuan Risiko

Atas Risiko Inheren yang telah dikuantifikasi, Unit Kerja menyusun rencana perlakuan Risiko yang dituangkan dalam **program kerja** untuk mencapai target Risiko Residual, dengan kriteria opsi perlakuan Risiko sebagai berikut:

Tabel 5.3 Pilihan Opsi Perlakuan Risiko

| Level Risiko | Pilihan Opsi Perlakuan Risiko |
|---|---|
| *Low* | ***Accept/Monitor***.<br>Rencana perlakuan Risiko cukup dengan Kontrol Yang Ada. |
| *Low to Moderate* | ***Reduce/Mitigate*** atau ***Accept/Monitor***<br>Rencana perlakuan Risiko dengan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi Dampak dan/atau Kemungkinan terjadinya Risiko, atau cukup dengan Kontrol Yang Ada. |
| *Moderate* | ***Reduce/Mitigate***<br>Rencana perlakuan Risiko dengan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi Dampak dan/atau Kemungkinan terjadinya Risiko. |
| *Moderate to High* | ***Reduce/Mitigate*** atau ***Transfer/Sharing***<br>Rencana perlakuan Risiko dengan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi Dampak dan/atau Kemungkinan terjadinya Risiko, atau dengan membagi tanggung jawab Risiko bersama Unit Kerja lain/pihak eksternal perusahaan. |
| *High* | ***Reduce/Mitigate*** atau ***Avoid/*Hindari**<br>Rencana perlakuan Risiko dengan membagi tanggung jawab Risiko bersama Unit Kerja lain/pihak eksternal perusahaan, atau dengan tidak memulai/melanjutkan aktivitas yang menimbulkan Risiko. |

Dalam menyusun rencana perlakuan Risiko yang dituangkan dalam program kerja, Unit Kerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rencana perlakuan Risiko yang disusun harus dapat meningkatkan Kontrol Yang Ada, yakni kecukupan desain pengendalian dan efektivitas pelaksanaan pengendalian, serta perbaikan terhadap proses bisnis yang lebih efektif dan efisien melalui *breakthrough project*.
2. Rencana perlakuan Risiko dapat secara efektif menurunkan Dampak Risiko

dan/atau tingkat Kemungkinan terjadinya Risiko.

3. Anggaran biaya perlakuan Risiko tidak melebihi nilai Risiko yang akan diturunkan sesuai dengan nilai target Risiko Residual.
4. Anggaran biaya perlakuan Risiko telah masuk dalam program kerja dan diusulkan dalam *template* RKAP yang diisi Unit Kerja.
5. Setiap Penyebab Risiko memiliki minimal 1 (satu) kegiatan perlakuan Risiko.
6. Setiap kegiatan perlakuan Risiko disusun target *output* dan *timeline* pelaksanaannya secara bulanan.

#### 4. Penyelarasan Risiko

Risiko yang sudah diidentifikasi, dikuantifikasi, dan disusun rencana perlakuannya oleh Divisi perlu dipastikan sudah selaras dengan Risiko pada Bagian-Bagian yang berada di bawah koordinasinya, karena tidak menutup kemungkinan terdapat Risiko Divisi yang penanganannya perlu diturunkan (*cascading*) ke tingkat Bagian. Untuk Risiko yang seperti ini maka perlu dipastikan tercatat juga dalam Risk Register Bagian (sebagai *assigned risk*) dan masuk ke dalam program kerja Bagian untuk rencana perlakuan Risikonya.

Sebaliknya, tidak menutup kemungkinan juga terdapat Risiko Bagian yang penanganannya perlu dieskalasi ke Divisi atasannya. Risiko-Risiko demikian perlu dipastikan sudah tercatat dalam Risk Register Divisi dan masuk dalam program kerja Divisi untuk rencana perlakuan Risikonya.

Atas Risiko-Risiko lintas level Unit Kerja sebagaimana dijelaskan di atas, Peristiwa Risiko yang tercatat pada Risk Register Divisi dan Bagian tidak harus sama, tetapi harus masuk dalam klasifikasi Taksonomi Risiko yang sama.

Selain itu, Fungsi Manajemen Risiko akan menurunkan (*cascading*) Risiko Utama Perusahaan kepada Divisi-Divisi terkait (sebagai *assigned risk*), apabila Risiko-Risiko yang sudah diidentifikasi oleh Divisi-Divisi tersebut masih belum mencakup Risiko Utama Perusahaan terkait. Penanganan Risiko yang diturunkan dari Risiko Utama Perusahaan tersebut menjadi tanggung jawab Divisi fungsi terkait dan dapat diturunkan (*cascading*) kembali ke Bagian di bawahnya secara proporsional.

### 5.1.3. Penetapan Risiko Awal Tahun

Unit Kerja mengirimkan rancangan Risk Register dalam Formulir ***Risk Register Unit Kerja (RFR-001)*** yang berisi hasil Penilaian Risiko kepada Fungsi Manajemen Risiko.

Dalam periode sampai dengan RKAP disahkan pada awal tahun Y, Risk Register dapat dilakukan iterasi untuk penyempurnaan, baik karena masukan dari Fungsi Manajemen Risiko maupun pertimbangan lain.

Setelah RKAP disahkan, Unit Kerja dapat melakukan penyesuaian kembali Risk Register sesuai dengan RKAP yang disahkan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu dari tanggal penetapan RKAP. Risk Register versi final ini kemudian ditetapkan sebagai Risk Register Unit Kerja Awal Tahun yang perlu dilaksanakan dan dipantau sepanjang tahun.

## 5.2. Pemantauan dan Evaluasi

### 5.2.1. Pelaksanaan dan Pemantauan Perlakuan Risiko

Unit Kerja melaksanakan perlakuan Risiko yang dituangkan dalam program kerja sesuai rencana dalam Risk Register Unit Kerja Awal Tahun.

Setiap bulan, kepala Unit Kerja dibantu oleh *Risk Ambassador* memantau dan memastikan perlakuan Risiko yang dilaksanakan berjalan efektif untuk menurunkan Dampak dan/atau Kemungkinan Risiko sesuai target Risiko Residual dari Unit Kerja yang menjadi tanggung jawabnya (tanggung jawab kepala Divisi termasuk Bagian-Bagian di bawah koordinasinya). Bila perlakuan Risiko ternyata dianggap tidak/kurang efektif, maka Unit Kerja dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan perlakuan Risiko yang berbeda dari rencana semula.

Realisasi pelaksanaan perlakuan Risiko, termasuk realisasi biaya, waktu pelaksanaan, dan realisasi Risiko Residual, dituangkan dalam kolom yang disediakan dalam Risk Register.

Unit Kerja juga memantau keterjadian Risiko untuk setiap Risiko yang telah diidentifikasi selama periode pengendalian, serta memberikan catatan pada kolom yang disediakan dalam Risk Register mengenai bagaimana Risiko tersebut terjadi, kronologis, maupun hal-hal yang akan dilakukan terkait kejadian Risiko tersebut.

Selain itu, Unit Kerja juga melengkapi Risk Register pada baris yang disediakan apabila terdapat Risiko yang terjadi tetapi belum teridentifikasi saat proses perencanaan awal. Semua Risiko yang terjadi, baik yang sudah maupun belum teridentifikasi pada proses perencanaan awal, akan masuk ke dalam *loss-event database* yang akan digunakan untuk keperluan analisis lanjutan.

### 5.2.2. Pelaporan

Setiap bulan kepala Bagian melaporkan dan meminta persetujuan atas pelaksanaan dan pemantauan perlakuan Risiko yang sudah dilakukan kepada atasannya. Bagian mengirimkan Risk Register yang sudah ditandatangani oleh kepala Bagian dan atasannya kepada Fungsi Manajemen Risiko paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan periode pengendalian Risiko.

Setiap bulan kepala Divisi melaporkan pelaksanaan dan pemantauan perlakuan Risiko yang sudah dilakukan kepada atasannya dengan menembuskan Risk Register yang sudah ditandatangani kepala Divisi kepada Fungsi Manajemen Risiko paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan periode pengendalian Risiko.

Fungsi Manajemen Risiko mengembalikan Risk Register Bagian yang sudah ditandatangani pada kolom “diterima” paling lambat tanggal 15 (lima belas) apabila penyampaian Risk Register Bagian kepada Fungsi Manajemen Risiko tepat waktu, atau pada akhir bulan penyampaian Risk Register Bagian apabila penyampaian kepada Fungsi Manajemen Risiko terlambat.

Fungsi Manajemen Risiko melakukan verifikasi atas Risk Register Divisi setiap bulan atas:

1. kelengkapan pengisian *field* dalam Risk Register;
2. ketepatan isi Risk Register;
3. realisasi pelaksanaan perlakuan Risiko atas turunan Risiko Utama; dan
4. hal lainnya yang terkait dengan Risiko Divisi dan Risiko Bagian yang berada di bawah koordinasi Divisi tersebut.

Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan, Fungsi Manajemen Risiko memberikan catatan umpan balik (*feedback*) yang perlu ditindaklanjuti kepada Divisi bersama dengan pengembalian Risk Register Divisi yang sudah ditandatangani pada kolom “diterima” dan “diverifikasi” paling lambat pada akhir bulan diterimanya Risk Register Divisi oleh Fungsi Manajemen Risiko.

Pengelolaan rekaman Formulir ***Risk Register Unit Kerja (RFR-001)*** di masing-masing Unit Kerja mengacu pada Prosedur ***Informasi Terdokumentasi (COP-002).***

### 5.2.3. Evaluasi

Evaluasi dilakukan secara berjenjang mengikuti model tata kelola Risiko tiga lini, yakni oleh Fungsi Manajemen Risiko sebagai lini kedua dan oleh fungsi Audit Intern sebagai lini ketiga.

1. Fungsi Manajemen Risiko melakukan evaluasi atas proses pengelolaan Risiko yang dilaksanakan oleh Unit Kerja meliputi:
   a. Kesesuaian waktu penyampaian Risk Register oleh Unit Kerja kepada Fungsi Manajemen Risiko. Unit Kerja yang tidak menyampaikan Risk Register selama 3 (tiga) periode pelaporan berturut-turut dapat diberikan sanksi;
   b. Tindak lanjut Divisi atas catatan umpan balik dari Fungsi Manajemen Risiko. Divisi yang tidak menindaklanjuti catatan umpan balik dalam 3 (tiga) periode pengendalian sejak catatan umpan balik disampaikan dapat diberikan sanksi;
   c. Kualitas penerapan Manajemen Risiko oleh Unit Kerja, dengan kriteria antara lain ketepatan perencanaan dibandingkan dengan realisasi pelaksanaannya.

   Hasil evaluasi atas proses pengelolaan Risiko yang dilaksanakan oleh Unit Kerja menjadi pertimbangan dalam program peningkatan budaya Risiko.

2. Fungsi Audit Intern melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Unit Kerja dan Fungsi Manajemen Risiko.

3. Fungsi Manajemen Risiko melakukan peninjauan secara berkala terhadap proses pengelolaan Risiko Unit Kerja yang diatur dalam prosedur ini dan melakukan perbaikan berkelanjutan dengan mempertimbangkan antara lain tetapi tidak terbatas pada:
   a. perubahan regulasi;
   b. perkembangan lingkungan internal dan eksternal;
   c. temuan dan/atau masukan perbaikan dari audit dan asesmen; dan
   d. kelemahan proses yang ditemukan saat peninjauan.

## 6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***Risk Register Unit Kerja (RFR-001)***

# 7.0 ALUR PROSES

Prosedur ROP-910 Pengelolaan Risiko Unit Kerja dapat dijabarkan dalam bentuk *flow chart* di bawah ini.

| AKTIVITAS | CATATAN / DOKUMEN | KETERANGAN |
|---|---|---|
| 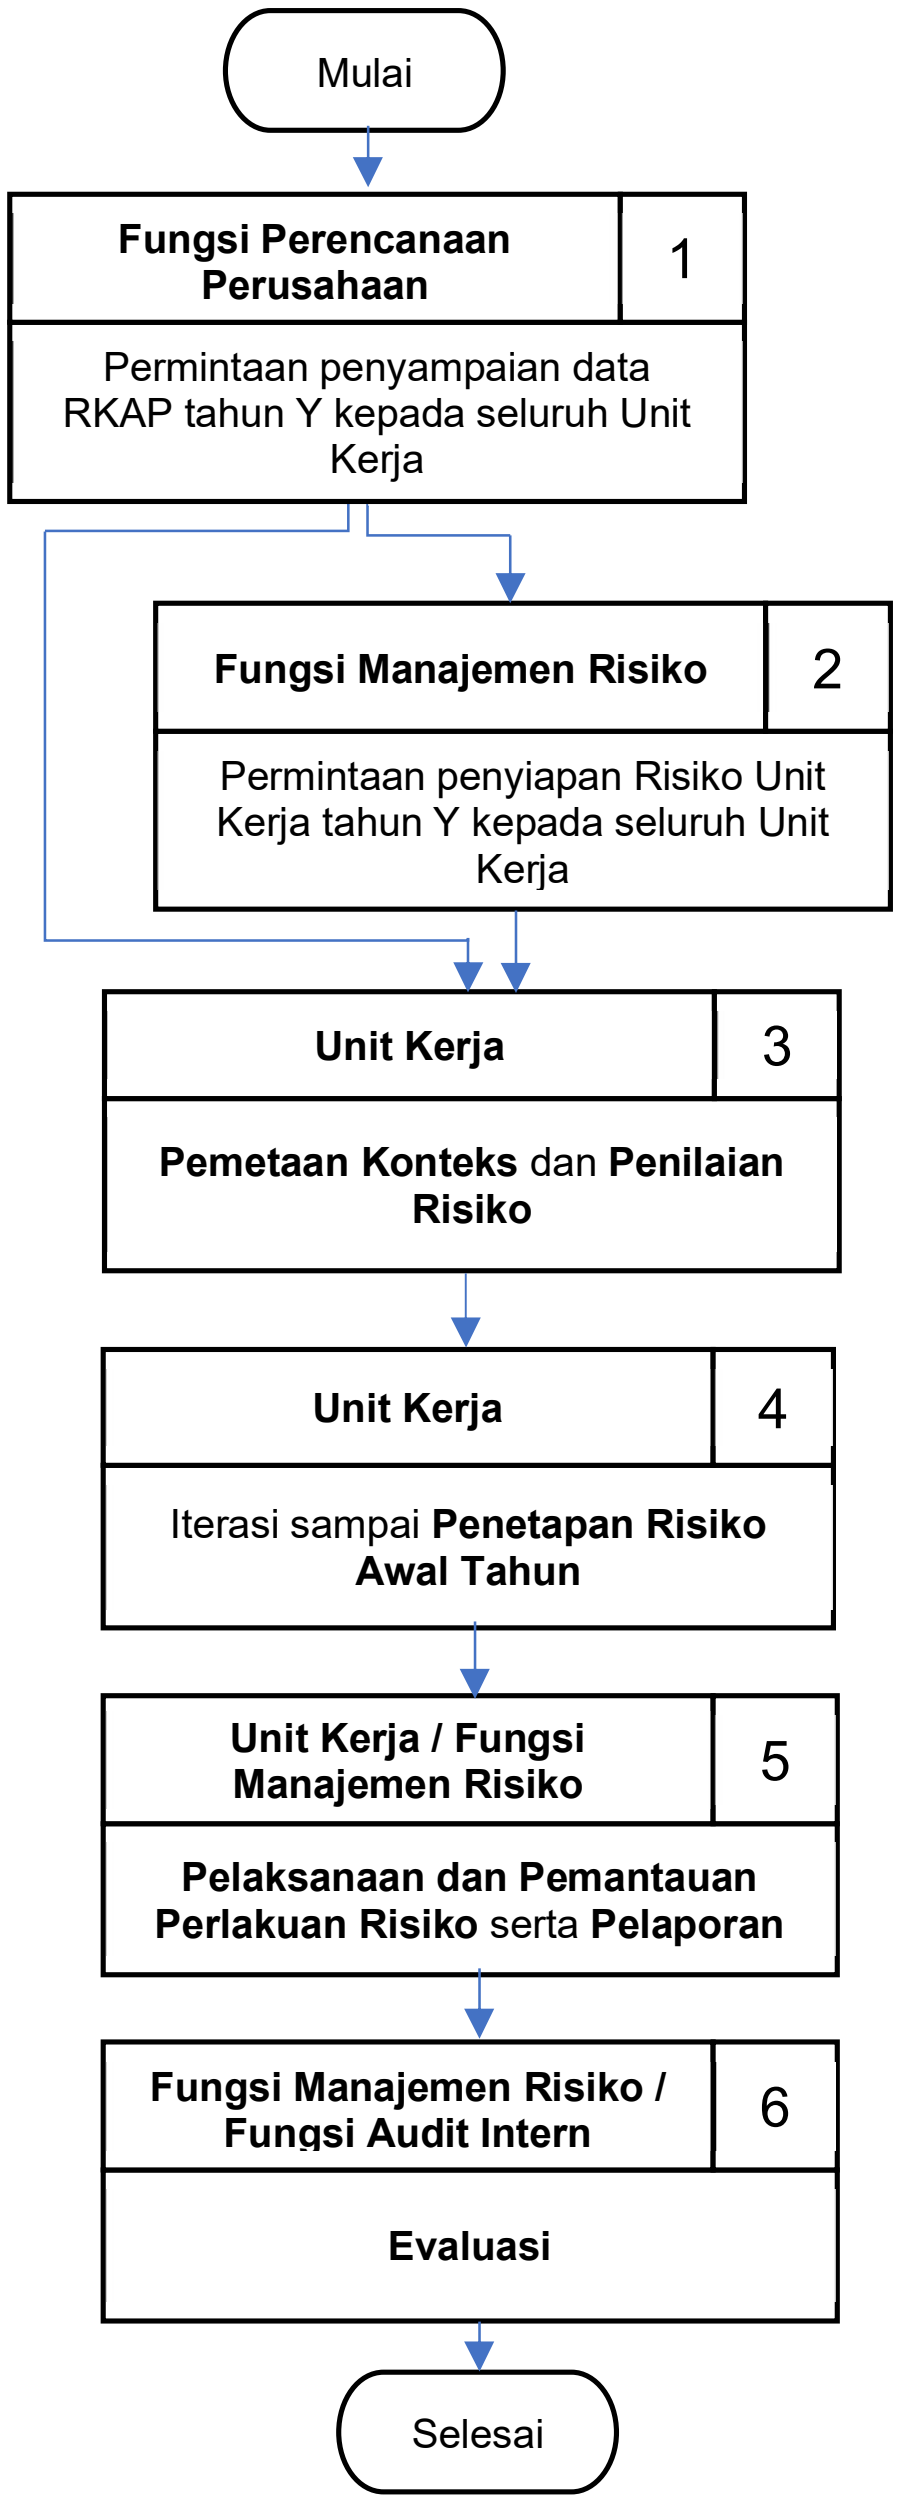 | RFR-001<br>RFR-001<br>RFR-001 | 1. Dalam rangka penyusunan RKAP tahun Y, pada triwulan III atau IV tahun Y-1 fungsi perencanaan perusahaan meminta setiap Unit Kerja melengkapi isi *template* RKAP.<br>2. Fungsi Manajemen Risiko mengingatkan seluruh Unit Kerja sebagai *risk owner* untuk menyiapkan Risiko Unit Kerja tahun Y bersamaan dengan pengisian *template* RKAP.<br>3. Unit Kerja melakukan pemetaan konteks untuk memahami lingkungan eksternal dan internal yang merefleksikan kondisi spesifik Unit Kerja, sebelum melanjutkan dengan penilaian Risiko yang dapat memengaruhi sasaran dan/atau proses bisnis. Usulan sasaran yang diusulkan dalam *template* RKAP harus tertuang dalam RFR-001, dan rencana perlakuan Risiko harus tertuang dalam program kerja dalam *template* RKAP, termasuk anggaran yang dibutuhkan.<br>4. Unit Kerja melakukan iterasi yang diperlukan sampai Penetapan Risiko Awal Tahun.<br>5. Unit Kerja melaksanakan perlakuan Risiko dan memantau kesesuaian realisasi dengan rencana, termasuk dalam hal waktu dan biaya, serta memantau efektivitas perlakuan dalam menurunkan Dampak dan/atau Kemungkinan Risiko Residual. Unit Kerja melaporkan pemantauan perlakuan Risiko kepada atasan dengan ditembuskan kepada fungsi Manajemen Risiko. Fungsi Manajemen Risiko melakukan verifikasi atas laporan dari Divisi dan memberikan catatan umpan balik yang perlu ditindaklanjuti oleh Divisi.<br>6. Fungsi Manajemen Risiko mengevaluasi proses pengelolaan Risiko yang dilakukan oleh Unit Kerja. Fungsi Audit Intern melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Unit Kerja dan Fungsi Manajemen Risiko. Fungsi Manajemen Risiko melakukan peninjauan berkala terhadap proses pengelolaan Risiko Unit Kerja dan melakukan perbaikan berkelanjutan. |

Mulai
Fungsi Perencanaan Perusahaan
1
Permintaan penyampaian data RKAP tahun Y kepada seluruh Unit Kerja
Fungsi Manajemen Risiko
2
Permintaan penyiapan Risiko Unit Kerja tahun Y kepada seluruh Unit Kerja
Unit Kerja
3
Pemetaan Konteks dan Penilaian Risiko
Unit Kerja
4
Iterasi sampai Penetapan Risiko Awal Tahun
Unit Kerja / Fungsi Manajemen Risiko
5
Pelaksanaan dan Pemantauan Perlakuan Risiko serta Pelaporan
Fungsi Manajemen Risiko / Fungsi Audit Intern
6
Evaluasi
Selesai

Dokumen [illegible] terkontrol, silahkan buka aplikasi [illegible] untuk melihat yang terbaru
26 OKT 2025 09:30

## Lampiran 1. Matriks Perubahan ROP-910

| No | Poin Perubahan | ROP-910 rev.02 | ROP-910 rev.03 |
|---|---|---|---|
| 1 | Nama prosedur | Pengelolaan Risiko Operasional | Pengelolaan Risiko Unit Kerja |
| 2 | Tahapan proses | 1. Membuat Daftar Risiko (*Risk Register*)<br>a. Identifikasi Proses Kerja<br>b. Identifikasi Risiko<br>c. Analisis Risiko<br>d. Evaluasi Risiko<br>e. Membuat Rencana Pengendalian Risiko<br>2. Pengendalian dan Pelaporan<br>3. Pemantauan Pengendalian Risiko | 1. Perencanaan<br>a. Pemetaan Konteks<br>b. Penilaian Risiko<br>c. Penetapan Risiko Awal Tahun<br>2. Pemantauan dan Evaluasi<br>a. Pelaksanaan dan Pemantauan Perlakuan Risiko<br>b. Pelaporan<br>c. Evaluasi |
| 3 | Subjek pengelolaan Risiko | Unit Kerja (tidak spesifik) | Unit Kerja, dibedakan antara Divisi dan Bagian. |
| 4 | Perubahan istilah | 1. Risiko Operasional<br>2. Skor Dampak<br>3. Skor Kemungkinan<br>4. Tingkat Risiko | 1. Risiko Unit Kerja<br>2. Skala Dampak<br>3. Skala Kemungkinan<br>4. Skala Risiko |

| No | Poin Perubahan | ROP-910 rev.02 | ROP-910 rev.03 |
|---|---|---|---|
| | | 5. Kategori Tingkat Risiko<br>6. Pengendalian Risiko<br>7. Peluang<br>8. Pemilik Risiko (*risk owner*)<br>9. Daftar Risiko (*risk register*) | 5. Level Risiko<br>6. Perlakuan Risiko<br>7. Risiko Positif<br>8. Unit Kerja / Divisi / Bagian<br>9. Risk Register |
| 5 | Penambahan istilah | Belum ada/belum digunakan | 1. Batas Risiko (*risk limit*)<br>2. Kontrol Yang Ada (*existing control*)<br>3. Penilaian Risiko<br>4. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan atau RKAP<br>5. Risiko Inheren<br>6. Risiko Residual<br>7. Risiko Utama<br>8. Risk Ambassador |
| 6 | Penghilangan istilah | 1. Selera Risiko (*risk appetite*)<br>2. Toleransi Risiko (*risk tolerance*)<br>3. Analisis Risiko (*risk analysis*)<br>4. Evaluasi Risiko (*risk evaluation*) | 1. Tidak lagi relevan pada level prosedur<br>2. Tidak lagi relevan pada level prosedur<br>3. Tidak lagi digunakan (perubahan tahapan proses)<br>4. Tidak lagi digunakan (perubahan tahapan proses) |

| No | Poin Perubahan | ROP-910 rev.02 | ROP-910 rev.03 |
|---|---|---|---|
| 7 | Awal siklus pengelolaan Risiko | *Risk register* dibuat oleh setiap unit kerja di awal tahun menggunakan formulir Identifikasi Risiko Operasional Unit Kerja (RFR-001). | Siklus periode tahunan proses pengelolaan Risiko Unit Kerja untuk tahun Y dimulai berbarengan dengan fungsi perencanaan perusahaan menyebarkan *template* RKAP yang harus dilengkapi setiap Unit Kerja pada triwulan III atau IV tahun Y-1, dan berlangsung sepanjang tahun Y. |
| 8 | Pemetaan konteks | Identifikasi proses kerja | 1. Analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terhadap Unit Kerja.<br>2. Identifikasi sasaran, proses bisnis, dan pemangku kepentingan. |
| 9 | Kontrol Yang Ada (*existing control*) | Belum ada | Yakni kebijakan, prosedur, sistem informasi dan komunikasi, atau sistem lainnya yang dapat mendeteksi, mencegah, atau memperbaiki timbulnya Risiko.<br>Unit Kerja perlu melakukan *control self-assessment* (CSA) atas kecukupan desain/rancangan kontrol dan atas efektivitas pelaksanaan kontrol |

<table>
<tr><th>No</th><th>Poin Perubahan</th><th>ROP-910 rev.02</th><th>ROP-910 rev.03</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Kriteria Dampak</td><td>Terdapat 1 (satu) kriteria Dampak</td><td>Terdapat lebih dari 1 (satu) kriteria Dampak yang dapat dipilih, dibedakan menjadi Dampak Kuantitatif dan Dampak Kualitatif. Kriteria Dampak dapat dilihat pada petunjuk pengisian Risk Register Unit Kerja.</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Kriteria Kemungkinan</td><td>Terdapat 2 (dua) kriteria Kemungkinan yang dapat dipilih:<br>1. Probabilitas Risiko<br>2. Kejadian Risiko di periode sebelumnya</td><td>Kriteria Kemungkinan dapat dilihat pada petunjuk pengisian Risk Register Unit Kerja.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Level Risiko</td><td>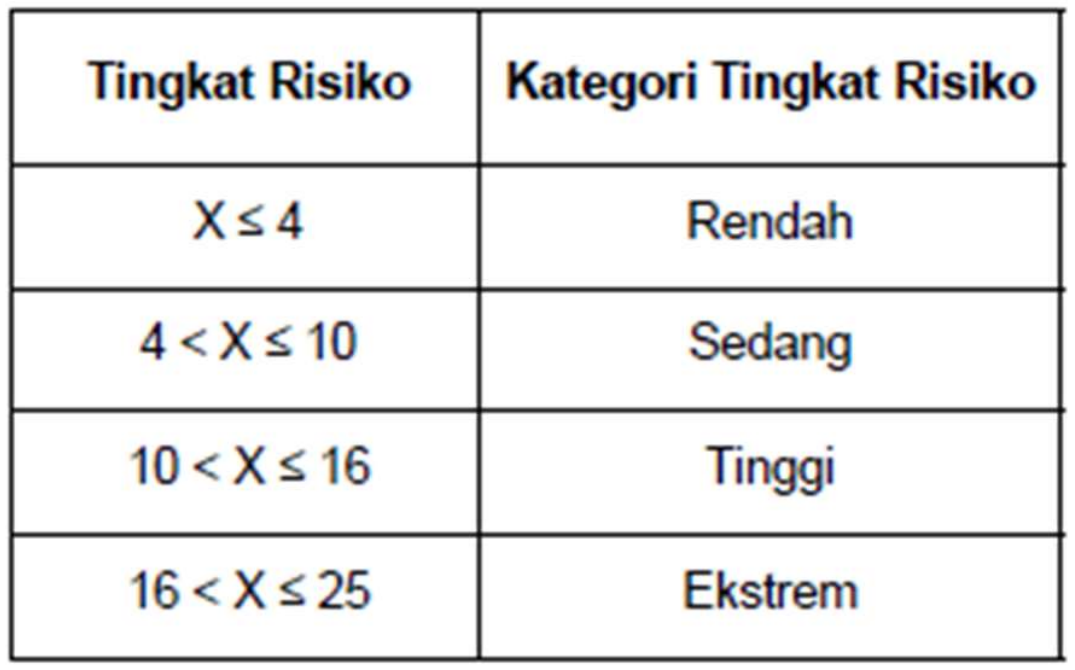
<table>
<tr><th>Tingkat Risiko</th><th>Kategori Tingkat Risiko</th></tr>
<tr><td>X ≤ 4</td><td>Rendah</td></tr>
<tr><td>4 < X ≤ 10</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>10 < X ≤ 16</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>16 < X ≤ 25</td><td>Ekstrem</td></tr>
</table></td><td>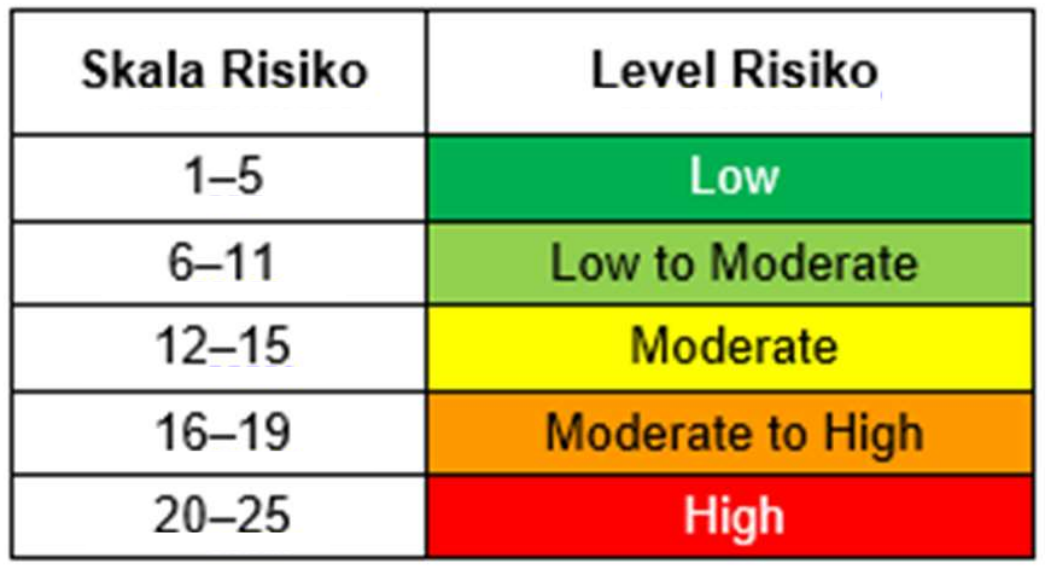
<table>
<tr><th>Skala Risiko</th><th>Level Risiko</th></tr>
<tr><td>1–5</td><td>Low</td></tr>
<tr><td>6–11</td><td>Low to Moderate</td></tr>
<tr><td>12–15</td><td>Moderate</td></tr>
<tr><td>16–19</td><td>Moderate to High</td></tr>
<tr><td>20–25</td><td>High</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>No</th><th>Poin Perubahan</th><th>ROP-910 rev.02</th><th>ROP-910 rev.03</th></tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Rencana Perlakuan Risiko</td>
<td>
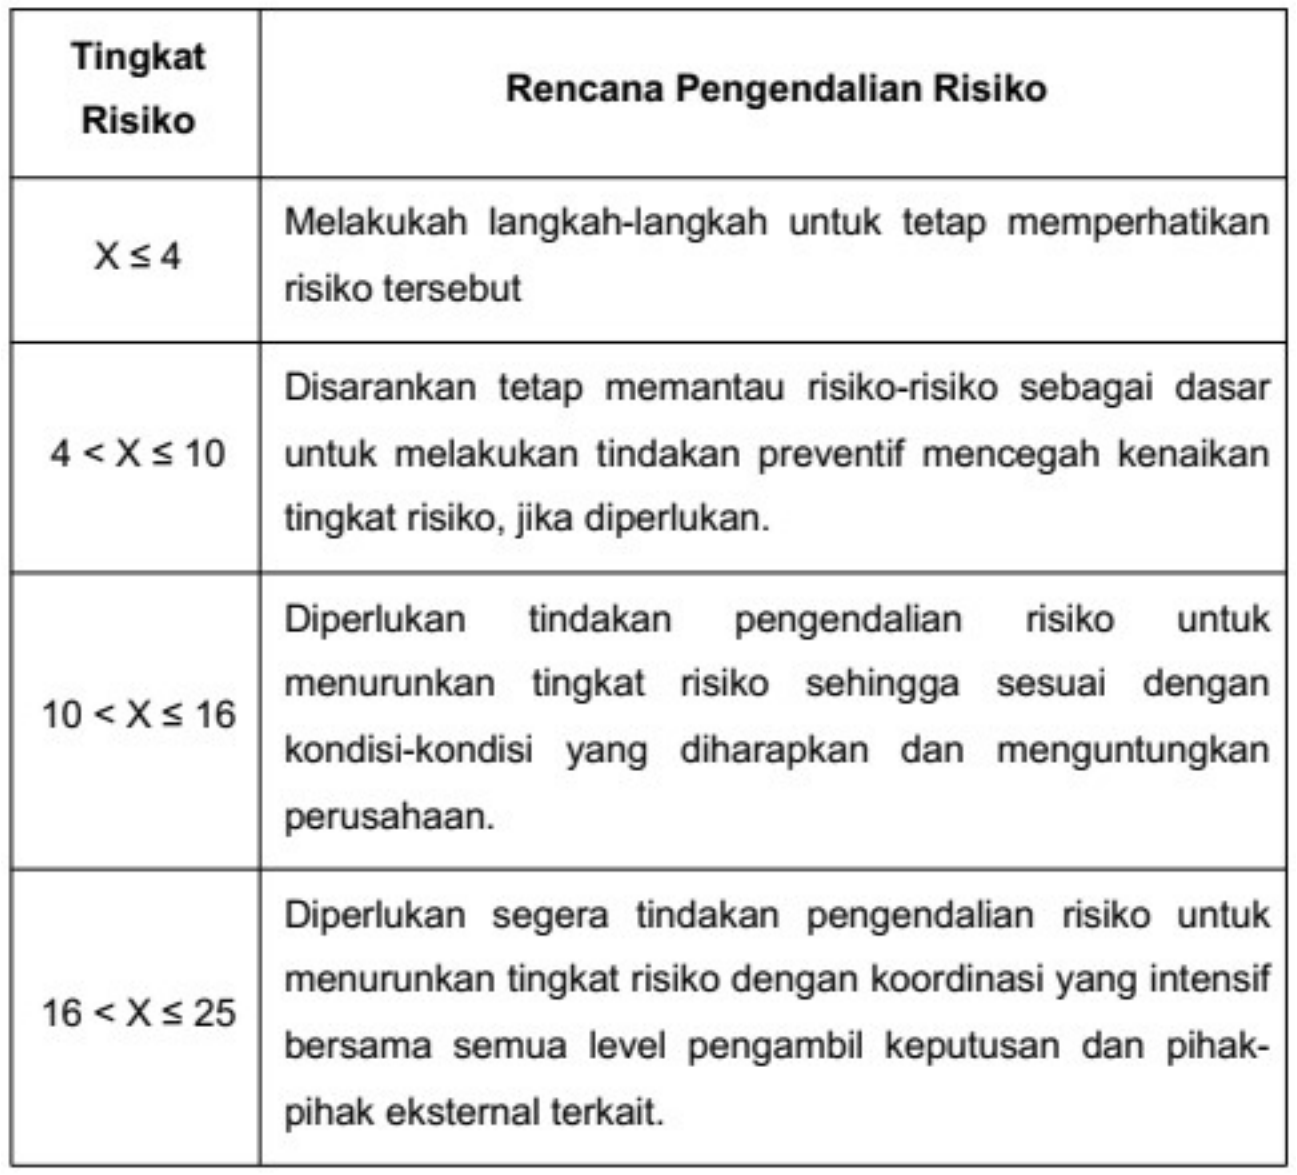
<table>
<tr><th>Tingkat Risiko</th><th>Rencana Pengendalian Risiko</th></tr>
<tr><td>X ≤ 4</td><td>Melakukah langkah-langkah untuk tetap memperhatikan risiko tersebut</td></tr>
<tr><td>4 < X ≤ 10</td><td>Disarankan tetap memantau risiko-risiko sebagai dasar untuk melakukan tindakan preventif mencegah kenaikan tingkat risiko, jika diperlukan.</td></tr>
<tr><td>10 < X ≤ 16</td><td>Diperlukan tindakan pengendalian risiko untuk menurunkan tingkat risiko sehingga sesuai dengan kondisi-kondisi yang diharapkan dan menguntungkan perusahaan.</td></tr>
<tr><td>16 < X ≤ 25</td><td>Diperlukan segera tindakan pengendalian risiko untuk menurunkan tingkat risiko dengan koordinasi yang intensif bersama semua level pengambil keputusan dan pihak-pihak eksternal terkait.</td></tr>
</table>
</td>
<td>
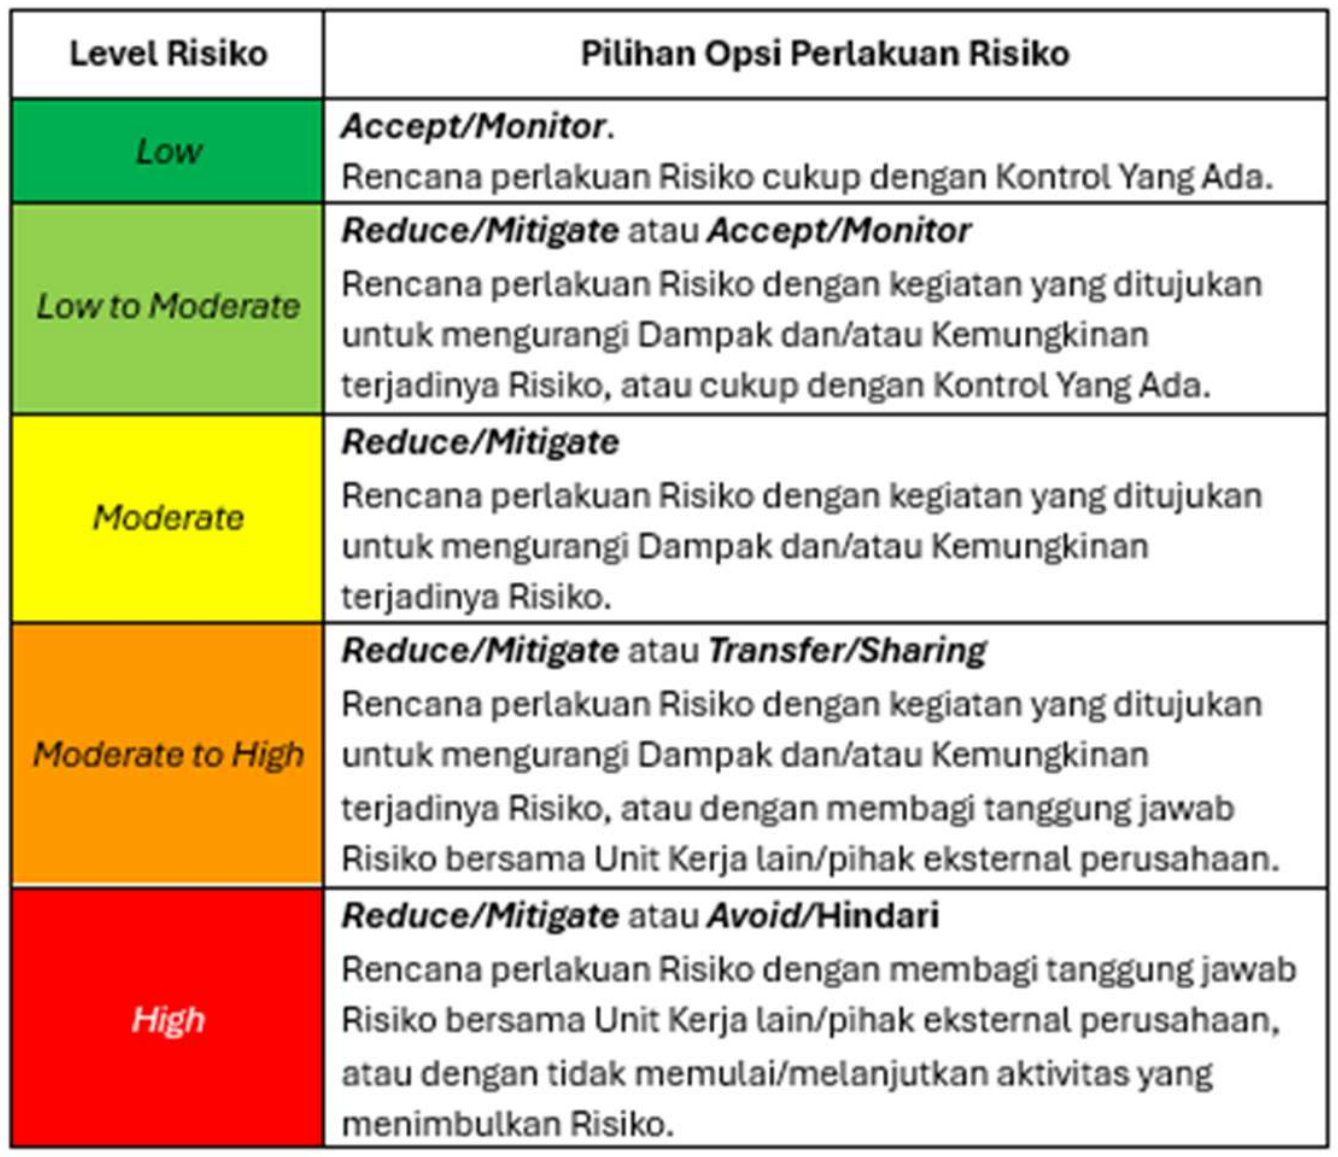
<table>
<tr><th>Level Risiko</th><th>Pilihan Opsi Perlakuan Risiko</th></tr>
<tr><td><i>Low</i></td><td><b><i>Accept/Monitor</i></b>.<br>Rencana perlakuan Risiko cukup dengan Kontrol Yang Ada.</td></tr>
<tr><td><i>Low to Moderate</i></td><td><b><i>Reduce/Mitigate</i></b> atau <b><i>Accept/Monitor</i></b><br>Rencana perlakuan Risiko dengan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi Dampak dan/atau Kemungkinan terjadinya Risiko, atau cukup dengan Kontrol Yang Ada.</td></tr>
<tr><td><i>Moderate</i></td><td><b><i>Reduce/Mitigate</i></b><br>Rencana perlakuan Risiko dengan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi Dampak dan/atau Kemungkinan terjadinya Risiko.</td></tr>
<tr><td><i>Moderate to High</i></td><td><b><i>Reduce/Mitigate</i></b> atau <b><i>Transfer/Sharing</i></b><br>Rencana perlakuan Risiko dengan kegiatan yang ditujukan untuk mengurangi Dampak dan/atau Kemungkinan terjadinya Risiko, atau dengan membagi tanggung jawab Risiko bersama Unit Kerja lain/pihak eksternal perusahaan.</td></tr>
<tr><td><i>High</i></td><td><b><i>Reduce/Mitigate</i></b> atau <b><i>Avoid/Hindari</i></b><br>Rencana perlakuan Risiko dengan membagi tanggung jawab Risiko bersama Unit Kerja lain/pihak eksternal perusahaan, atau dengan tidak memulai/melanjutkan aktivitas yang menimbulkan Risiko.</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

| No | Poin Perubahan | ROP-910 rev.02 | ROP-910 rev.03 |
|---|---|---|---|
| 14 | Peta Risiko | 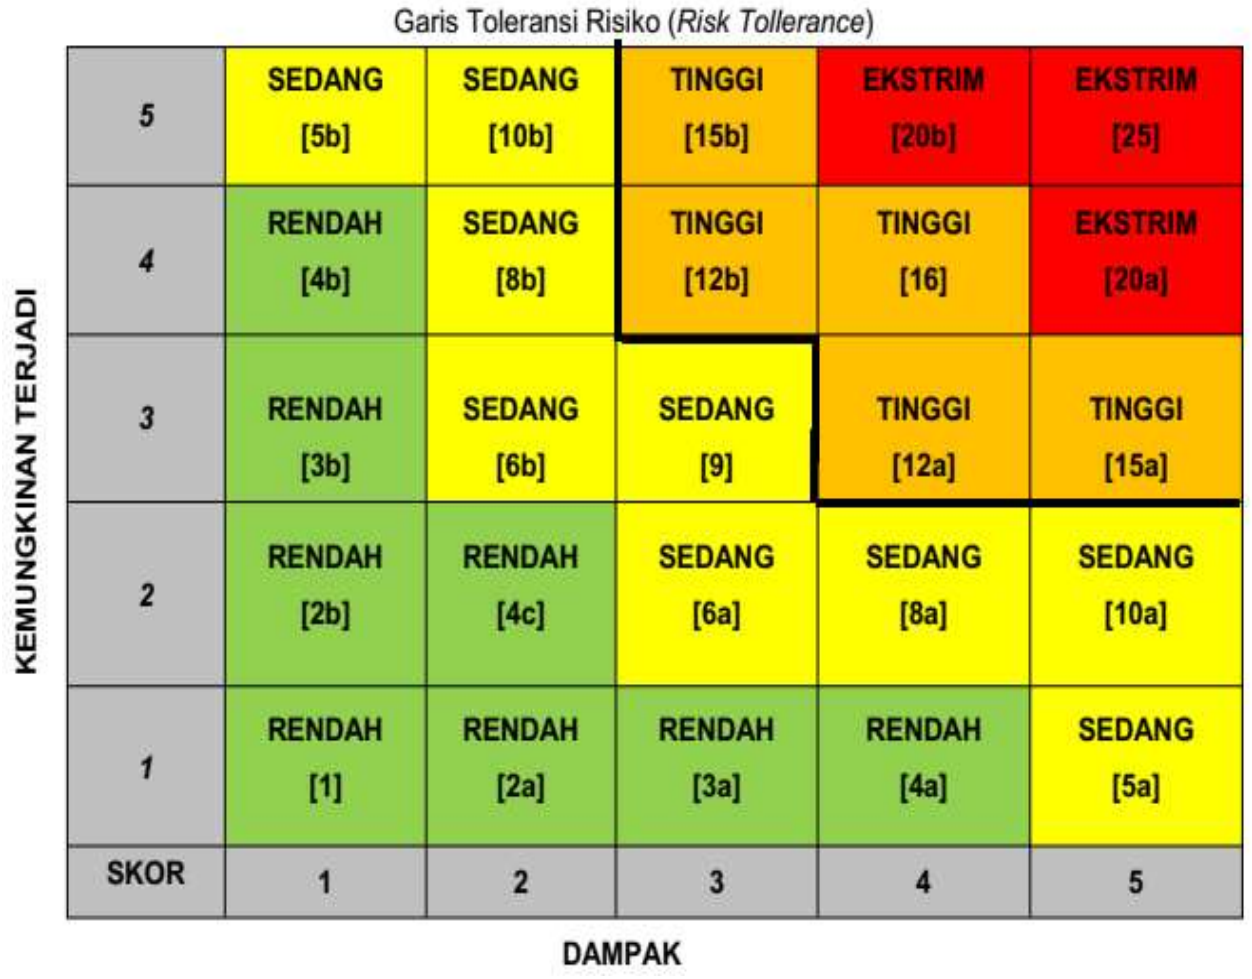 | 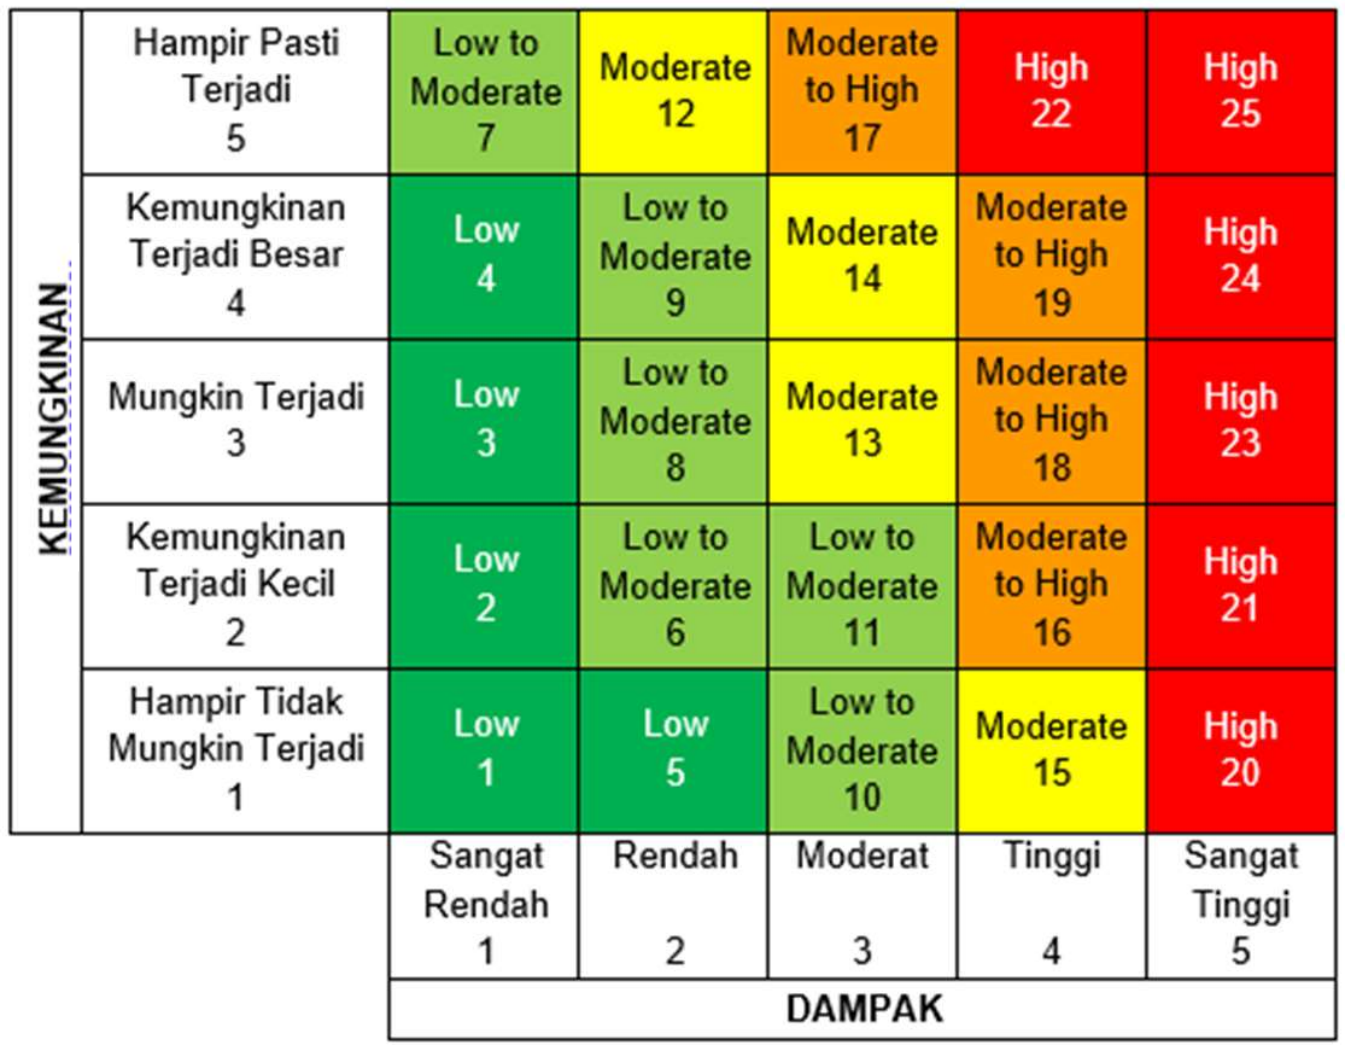 |

Garis Toleransi Risiko (*Risk Tollerance*)

| KEMUNGKINAN TERJADI | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | SEDANG [5b] | SEDANG [10b] | TINGGI [15b] | EKSTRIM [20b] | EKSTRIM [25] |
| 4 | RENDAH [4b] | SEDANG [8b] | TINGGI [12b] | TINGGI [16] | EKSTRIM [20a] |
| 3 | RENDAH [3b] | SEDANG [6b] | SEDANG [9] | TINGGI [12a] | TINGGI [15a] |
| 2 | RENDAH [2b] | RENDAH [4c] | SEDANG [6a] | SEDANG [8a] | SEDANG [10a] |
| 1 | RENDAH [1] | RENDAH [2a] | RENDAH [3a] | RENDAH [4a] | SEDANG [5a] |
| SKOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

DAMPAK

| KEMUNGKINAN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hampir Pasti Terjadi 5 | Low to Moderate 7 | Moderate 12 | Moderate to High 17 | High 22 | High 25 |
| Kemungkinan Terjadi Besar 4 | Low 4 | Low to Moderate 9 | Moderate 14 | Moderate to High 19 | High 24 |
| Mungkin Terjadi 3 | Low 3 | Low to Moderate 8 | Moderate 13 | Moderate to High 18 | High 23 |
| Kemungkinan Terjadi Kecil 2 | Low 2 | Low to Moderate 6 | Low to Moderate 11 | Moderate to High 16 | High 21 |
| Hampir Tidak Mungkin Terjadi 1 | Low 1 | Low 5 | Low to Moderate 10 | Moderate 15 | High 20 |
| | Sangat Rendah 1 | Rendah 2 | Moderat 3 | Tinggi 4 | Sangat Tinggi 5 |

DAMPAK

| No | Poin Perubahan | ROP-910 rev.02 | ROP-910 rev.03 |
|---|---|---|---|
| 15 | Kejadian Risiko | Tidak ada | Unit kerja juga memantau apakah Risiko terjadi atau tidak terjadi dalam periode pengendalian, serta memberikan catatan pada kolom yang disediakan dalam Risk Register mengenai bagaimana Risiko tersebut terjadi, kronologis, maupun hal-hal yang akan dilakukan terkait kejadian Risiko tersebut.<br>Selain itu, Unit Kerja juga melengkapi Risk Register pada baris yang disediakan apabila ada Risiko yang terjadi tetapi belum teridentifikasi saat proses perencanaan awal. Semua Risiko yang terjadi, baik yang sudah teridentifikasi ataupun belum pada proses perencanaan awal, akan masuk ke dalam *loss-event database* yang akan digunakan untuk keperluan analisis lanjutan. |
| 16 | Pelaporan | Kepala bagian melaporkan realisasi pengendalian risiko operasional kepada kepala divisi / kepala unit bisnis / kepala satuan masing-masing unit kerja dan ditembuskan ke Bagian Manajemen Risiko setiap tiga bulan. | Setiap bulan kepala Bagian melaporkan dan meminta persetujuan atas pelaksanaan dan pemantauan perlakuan Risiko yang sudah dilakukan kepada atasannya. Bagian mengirimkan Risk Register yang sudah ditandatangani oleh kepala Bagian dan atasannya kepada Fungsi Manajemen Risiko paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan periode pengendalian Risiko. |

| No | Poin Perubahan | ROP-910 rev.02 | ROP-910 rev.03 |
|---|---|---|---|
| | | | Setiap bulan kepala Divisi melaporkan pelaksanaan dan pemantauan perlakuan Risiko yang sudah dilakukan kepada atasannya dengan menembuskan Risk Register yang sudah ditandatangani kepala Divisi kepada Fungsi Manajemen Risiko paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah bulan periode pengendalian Risiko. |
