PT Len Industri (Persero)			Halaman **1 dari 34**
ROP-911 **KAJIAN RISIKO PROYEK/PROGRAM**			Revisi: **03**
Disusun oleh :	Direviu oleh:		Disetujui oleh :
SGM Governance, Risk Management & Compliance Tanggal : 6 Januari 2026 Tanda Tangan : (Nia Herminanti Mustopa)	GM Business Process Management Tanggal : 6 Januari 2026 Tanda Tangan : (Yunika Sopandi)	Management Representative Tanggal : 7 Januari 2026 Tanda Tangan : (Muhamad Daud Fahreza)	Direktur Teknologi dan Manajemen Risiko Tanggal : 8 Januari 2026 Tanda Tangan : (Amalia Maya Fitri)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Penyusun
01	2020	Semua halaman	AF
01	11-05-2020	Halaman 09, 12 dan 16	RT
02	13-10-2020	Halaman 02, 08, 11, 12, 15 dan 16	TH
03	08-01-2026	Semua halaman	RM, FA

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI 2

1.0 TUJUAN 2

2.0 RUANG LINGKUP 2

3.0 DEFINISI 2

3.1 Analisis Risiko *(Risk Analysis)* 2

3.2 Asesmen Risiko *(Risk Assessment)* 3

3.3 Dampak (*Consequence*) 3

3.4 Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*) 3

3.5 Identifikasi Risiko 3

3.6 Kategori Tingkat Risiko *(Risk Level Category)* 3

3.7 Kejadian Risiko 3

3.8 Kemungkinan *(Likelihood)* 4

3.9 Konteks Eksternal 4

3.10 Konteks Internal 4

3.11 Pelaporan Risiko *(Risk Reporting)* 4

3.12 Pemantauan Risiko *(Risk Monitoring)* 4

3.13 Pemilik Risiko (*Risk Owner*) 5

3.14 Peta Risiko *(Risk Map)* 5

3.15 Petugas Risiko (*Risk Officer*) 5

3.16 Profil Proyek/Program 5

3.17 Rencana Penanganan Risiko *(Risk Treatment Plan)* 5

3.18 Risiko (Risk) 5

3.19 Risiko Program 6

3.20 Risiko Proyek 6

3.21 *Risk Register* 6

3.22 Selera Risiko *(Risk Appetite)* 6

3.23 Skor Dampak (*Consequence Score*) 6

3.24 Skor Kemungkinan (*Likelihood Score*) 6

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.25 Tingkat Risiko *(Level of Risk)* 6

4.0 DOKUMEN TERKAIT ***7***

5.0 PROSEDUR ***7***

5.1 Membuat Profil Proyek 7

5.2 Membuat Profil Program 7

5.3 Membuat Kajian Risiko Proyek/Program 8

5.3.1 Identifikasi Risiko 8

5.3.2 Analisis dan Evaluasi Risiko 10

5.3.3 Uji Kelayakan SMAP Transaksi atau Proyek 11

5.3.4 Rencana Penanganan Risiko 12

5.4 Penanganan Risiko Pada Tahap Inisiasi 13

5.5 Tinjauan Order 13

5.6 Tinjauan Kelayakan dan Tinjauan Pengembangan Produk 14

5.7 Memperbarui Risk Register 14

5.8 Tinjauan Kontrak 14

5.9 Tinjauan Pengembangan Produk 15

5.10 Penggunaan *Risk Register* dalam Tahap Pelaksanaan Proyek/Program 15

5.11 Pemantauan Penanganan Risiko Proyek/Program 15

5.12 Kejadian Risiko Proyek/Program 16

5.13 Pelaporan Risiko 16

5.14 Penutupan Proyek/Program 16

6.0 FORMULIR TERKAIT ***18***

7.0 ALUR/FLOW ***19***

LAMPIRAN 1: Kriteria Dampak ***21***

LAMPIRAN 2: Kriteria Kemungkinan ***27***

LAMPIRAN 3: Peta Risiko Proyek/Program ***28***

8.0 MATRIKS PERUBAHAN ***29***

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

1.0 TUJUAN

- Sebagai acuan unit kerja untuk membuat kajian Risiko Proyek/Program sedini mungkin agar dapat melakukan aktivitas-aktivitas penanganan untuk meminimalkan Tingkat Risiko sehingga memperbesar peluang perolehan proyek atau meningkatkan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program.
- Meningkatkan mutu perencanaan proyek/program.
- Sebagai salah satu referensi pengambilan keputusan dalam Tinjauan Order dan/atau Tinjauan Kontrak Proyek.
- Sebagai salah satu referensi pengambilan keputusan dalam Tinjauan Kelayakan dan/atau Tinjauan Program Pengembangan Produk.
- Meminimalkan munculnya hambatan pada saat pelaksanaan proyek/ program.
- Memastikan proses pengelolaan Risiko Proyek/Program terdokumentasi dengan baik.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini digunakan sebagai acuan unit kerja untuk mengelola dan menangani Risiko Proyek/Program sesuai dengan jenis-jenis proyek/program pada ***Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700)*** sejak diidentifikasinya peluang bisnis, selama proses pemasaran dan penjualan dalam tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap penutupan proyek/program. ***Prosedur Kajian Risiko Proyek/Program (ROP-911)*** ini berlaku pada saat ditetapkan dan tidak berlaku surut.

3.0 DEFINISI

3.1 Analisis Risiko *(Risk Analysis)*

Bagian dari proses Asesmen Risiko, yaitu memahami sifat dan karakteristik suatu Risiko. Analisis Risiko mempertimbangkan secara detail atas ketidakpastian, penyebab Risiko, Dampak, Kemungkinan, peristiwa-peristiwa, skenario-skenario, serta penanganan yang ada

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

dan efektivitasnya. Suatu Risiko dapat memiliki penyebab dan Dampak lebih dari satu dan mempengaruhi beberapa tujuan sekaligus.

3.2 Asesmen Risiko *(Risk Assessment)*

Salah satu proses pengelolaan Risiko yang terdiri atas Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Evaluasi Risiko.

3.3 Dampak (*Consequence*)

Dampak Risiko adalah hasil dari suatu Kejadian Risiko yang memengaruhi pencapaian tujuan. Dampak tersebut dapat bersifat pasti maupun tidak pasti, negatif, serta dapat muncul secara langsung maupun tidak langsung. Dampak Risiko dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, dan berpotensi membesar melalui efek berantai serta kumulatif.

3.4 Evaluasi Risiko (*Risk Evaluation*)

Bagian dari proses Asesmen Risiko, yaitu membandingkan hasil dari Analisis Risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah Risiko dapat diterima tanpa perlu tindakan lebih lanjut, perlu rencana penanganan, perlu analisis lebih mendalam, mempertahankan pengendalian yang ada, atau bahkan mempertimbangkan untuk mengganti target/sasaran.

3.5 Identifikasi Risiko

Bagian dari proses Asesmen Risiko, yaitu menemukan, mengenali, dan mendeskripsikan Risiko yang mungkin dapat menghambat perusahan dalam mencapai tujuannya.

3.6 Kategori Tingkat Risiko *(Risk Level Category)*

Kerangka acuan untuk menilai dan mengevaluasi besarnya Risiko.

3.7 Kejadian Risiko

Kejadian Risiko merupakan muncul atau berubahnya suatu kondisi tertentu yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Kejadian ini dapat muncul lebih dari satu kali,

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

serta memiliki beragam penyebab dan menimbulkan beberapa Dampak sekaligus. Dalam praktiknya, Kejadian Risiko bisa berupa sesuatu yang diperkirakan akan terjadi namun ternyata tidak terjadi, atau sebaliknya, sesuatu yang semula diperkirakan tidak akan terjadi namun justru terjadi. Selain itu, suatu Kejadian Risiko juga dapat berperan sebagai pemicu atau penyebab timbulnya Risiko lain, sehingga menimbulkan efek berantai yang lebih luas terhadap organisasi.

3.8 Kemungkinan *(Likelihood)*

Kemungkinan Risiko adalah besarnya peluang terjadinya suatu Kejadian Risiko. Dalam manajemen Risiko, terminologi "Kemungkinan" merujuk pada peluang sesuatu untuk terjadi yang dapat didefinisikan, diukur, dan ditentukan baik secara objektif maupun subjektif. Kemungkinan dapat dinyatakan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif, serta dijabarkan dengan menggunakan istilah umum maupun matematis, seperti probabilitas atau frekuensi dalam jangka waktu tertentu.

3.9 Konteks Eksternal

Lingkungan di luar Perusahaan yang memengaruhi Perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.10 Konteks Internal

Lingkungan di dalam Perusahaan yang memengaruhi Perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.11 Pelaporan Risiko *(Risk Reporting)*

Suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan status Risiko dan pengelolaannya kepada para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

3.12 Pemantauan Risiko *(Risk Monitoring)*

Pemeriksaan, pengawasan, dan pengamatan kritis secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui efektivitas penanganan Risiko.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.13 Pemilik Risiko (*Risk Owner)*

Pemilik Risiko *(Risk Owner)* adalah Pimpinan Proyek/Koordinator Proyek Litbang/Koordinator Program atau Unit Kerja (Bagian dan/atau Divisi) yang mempunyai akuntabilitas dan kewenangan mengelola Risiko Proyek/Program.

3.14 Peta Risiko *(Risk Map)*

Gambaran tentang posisi Risiko-risiko dari suatu organisasi pada dua sumbu yang berbeda, yaitu sumbu vertikal yang menggambarkan Kemungkinan dan sumbu horizontal yang menggambarkan Dampak.

3.15 Petugas Risiko (*Risk Officer*)

Orang yang ditunjuk untuk membantu *Risk Owner* dalam melaksanakan proses dan pengelolaan Risiko Proyek/Program.

3.16 Profil Proyek/Program

Deskripsi proyek/program yang rinci dan lengkap sesuai dengan informasi dan persyaratan proyek/program yang ditetapkan oleh pelanggan/pengusul yang dapat menjadi acuan untuk mengidentifikasi Risiko.

3.17 Rencana Penanganan Risiko *(Risk Treatment Plan)*

Proses untuk mengubah Tingkat Risiko, contohnya yaitu menghindari Risiko, mengambil Risiko, menghilangkan sumber Risiko, menurunkan Kemungkinan, menurunkan Dampak, dan berbagi Risiko dengan pihak lain.

3.18 Risiko (Risk)

Risiko adalah efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Efek tersebut dapat berupa penyimpangan negatif dari kondisi yang diharapkan sehingga menimbulkan ancaman. Tujuan yang dimaksud dapat mencakup berbagai aspek dan kategori serta dapat diterapkan pada

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).	Strategic Transformation Office Risk Management Januari 2026

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru

26 OKT 2026 09:30

level yang berbeda-beda. Risiko disampaikan dengan mengungkapkan penyebab, Dampak, dan Kemungkinan terjadinya.

3.19 Risiko Program

Risiko yang terdapat dalam proses penanganan program, mulai dari proses pengusulan program, pelaksanaan program, sampai dengan penutupan program.

3.20 Risiko Proyek

Risiko yang terdapat dalam proses penanganan proyek, mulai dari proses pemasaran dan penjualan, perolehan atau tanda tangan kontrak, pelaksanaan proyek, sampai dengan penutupan proyek.

3.21 *Risk Register*

Tabel yang berisikan informasi mengenai Risiko-risiko hasil Asesmen Risiko.

3.22 Selera Risiko *(Risk Appetite)*

Jumlah dan jenis Risiko yang siap ditangani atau diterima oleh Perusahaan.

3.23 Skor Dampak (*Consequence Score*)

Besarnya Dampak yang diukur dalam skala 1 sampai 5 berdasarkan tingkat keparahannya dalam memengaruhi pencapaian tujuan.

3.24 Skor Kemungkinan (*Likelihood Score*)

Besarnya Kemungkinan terjadinya Risiko yang diukur dalam skala 1 sampai 5 berdasarkan perkiraan probabilitas Risiko itu terjadi dan/atau mengacu pada kejadian ditahun-tahun sebelumnya.

3.25 Tingkat Risiko *(Level of Risk)*

Besarnya suatu Risiko yang dinyatakan berdasarkan Skor Dampak (*consequences score*) dan Skor Kemungkinan (*likelihood*).

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Peraturan Direksi No.003/PERDIR/DU/VI/2025 Mengenai Pedoman Penerapan Manajemen Risiko***
- ***Prosedur Manajemen Proyek (BOP-001)***
- ***Penanganan Peluang dan Order Bisnis (SOP-001)***
- ***Penanganan Kontrak (SOP-004)***
- ***Perencanaan Program Pengembangan Produk (EOP-304)***
- ***Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700)***
- ***Prosedur Penutupan Kode Proyek/Program (FOP-705)***
- ***Uji Kelayakan SMAP (GOP-1103)***

5.0 PROSEDUR

5.1 Membuat Profil Proyek

Profil Proyek adalah gambaran awal atau informasi mengenai kondisi proyek dan/atau persyaratan pelanggan yang dituangkan dalam ***Formulir Profil Proyek (RFR-004)***. Fungsi Pemasaran, sesuai Prosedur ***Penanganan Peluang dan Order Bisnis (SOP-001)***, melakukan penyusunan Profil Proyek atas informasi yang diperoleh dari proyek-proyek yang sudah ditetapkan dalam RKAP dan potensi proyek yang muncul di tahun berjalan sejak tahap inisiasi. Dalam proses penanganan kontrak, sesuai dengan Prosedur ***Penanganan Kontrak (SOP-004)*** Fungsi Pemasaran melakukan pembaruan atas ***Formulir Profil Proyek (RFR-004),*** apabila terdapat perubahan dalam persyaratan pemenuhan persyaratan proyek.

5.2 Membuat Profil Program

Profil Program adalah gambaran awal atau informasi mengenai kondisi program dan/atau persyaratan pengusul yang dituangkan dalam ***Formulir Profil Program (RFR-005)***. Pengusul program, sesuai dengan Prosedur ***Perencanaan Program Pengembangan Produk (EOP-304)***, melakukan penyusunan Profil Program atas informasi yang diperoleh. ***Formulir Profil Program (RFR-005)*** juga berisi *guidance* yang dapat memudahkan pengusul program dalam melakukan asesmen Risiko.

Secara umum profil program berisi informasi terkait, namun tidak terbatas pada:

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).	Strategic Transformation Office Risk Management Januari 2026

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

1. Deskripsi Program;
2. Latar Belakang & Kebutuhan Pasar (misalnya meliputi segmen pasar, tingkat persaingan, peluang penguasaan pasar, dan lain-lain);
3. Ruang Lingkup Program;
4. Gambaran & Persyaratan Teknologi (misal meliputi konsep desain, keunggulan teknologi yang digunakan, *Life Cycle* Produk, Persyaratan Sertifikasi, Fungsi dan Fitur Produk, dan lain-lain);
5. Sasaran Waktu Mencapai Pasar (*Time to Market*).

5.3 Membuat Kajian Risiko Proyek/Program

Kajian Risiko Proyek/Program adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan merencanakan penanganan terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu proyek/program. Kajian Risiko sesuai dengan ***Prosedur Penanganan Peluang & Order Bisnis (SOP-001)*** mulai disusun/ diperbarui sejak Fase Pengembangan Bisnis oleh Fungsi Pengembangan Bisnis, Fase Marketing oleh Fungsi Pemasaran, dan Fase Sales oleh Fungsi Perencanaan Proyek, didasarkan pada Profil Proyek yang telah disusun. Kajian risiko proyek dituangkan dalam kertas kerja ***Formulir Project Risk Register (RFR-002),*** sedangkan untuk kajian risiko program dituangkan ke dalam ***Formulir Program Risk Register (RFR-006)***. Selama proses pembuatan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*** **dan** ***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** Fungsi-fungsi terkait dapat berkonsultasi dengan Fungsi Manajemen Risiko.

5.3.1 Identifikasi Risiko

Berdasarkan ***Formulir Profil Proyek (RFR-004)/Formulir Profil Program (RFR-005)*** yang telah dibuat, Fungsi Perencanaan Proyek sesuai dengan Prosedur ***Penanganan Peluang dan Order Bisnis (SOP-001)*** atau Pengusul Program sesuai dengan Prosedur ***Perencanaan Program Pengembangan Produk (EOP-304)***, mengidentifikasi Risiko Proyek/Program yang berpotensi muncul sejak tahap inisiasi proyek/program hingga tahap pelaksanaan proyek/program yang dapat menghambat pencapaian tujuan proyek/program. Identifikasi Risiko meliputi :

- Risiko-risiko yang berdampak pada kegagalan perolehan proyek/program

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- Risiko-risiko yang berdampak pada pencapaian target pendapatan dan laba proyek
- Risiko-risiko yang berdampak pada target pelaksanaan proyek/program, serta
- Risiko-risiko yang berdampak pada pemenuhan kepatuhan *Risk Owner* dan/ atau Perusahaan terhadap prinsip-prinsip etika bisnis dengan pemberi kerja dan vendor atau subkontraktor, seperti anti penyuapan, *fraud*, korupsi dan konflik kepentingan.

Risiko-risiko yang diidentifikasi mencakup Risiko dari berbagai aspek, yaitu aspek strategis, aspek keuangan, aspek operasional, aspek legal dan aspek SDM. Dalam mengidentifikasi Risiko, *Risk Owner* harus memperhatikan Konteks Internal dan Konteks Eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan proyek. Konteks Internal meliputi :

- Nilai dan budaya Perusahaan.
- Kebijakan, sasaran dan strategi Perusahaan.
- Kapabilitas Perusahaan terkait sumber daya dan pengetahuan.
- Pengambilan keputusan.
- Standar dan model acuan yang digunakan Perusahaan.

Sedangkan Konteks Eksternal meliputi :

- Lingkungan geografis, politik, hukum, ekonomi, sosial, teknologi, keuangan, kondisi alam dan persaingan dengan kompetitor lingkup nasional maupun internasional.
- Kecenderungan *(trend)* yang berdampak pada tujuan Perusahaan.
- Nilai-nilai yang dipegang oleh pemangku kepentingan eksternal Perusahaan.

Fungsi Perencanaan Proyek mengidentifikasi Risiko terkait proyek berdasarkan informasi yang diperoleh dari Fungsi Pemasaran, serta berdiskusi dengan unit kerja lain yang terkait baik melalui agenda Tinjauan Order ataupun Tinjauan Kontrak.

Jika proyek membutuhkan program pengembangan atau program produksi, maka harus diidentifikasi juga Risiko-risiko terkait program pengembangan atau program produksi yang menunjang proyek tersebut. Selain itu, dalam mengidentifikasi Risiko, Fungsi Perencanaan Proyek perlu memperhatikan Risiko di proyek-proyek sebelumnya sebagai masukan, terutama bila memiliki profil proyek atau kondisi yang serupa.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Identifikasi Risiko Proyek dapat menggunakan standar Risiko yang telah ditetapkan. Risiko-risiko yang teridentifikasi dimasukkan dalam Daftar Risiko (*Risk Register*) berupa ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)***.

Pengusul Program mengidentifikasi Risiko terkait pelaksanaan program pengembangan, serta berdiskusi dengan unit kerja lain yang terkait baik melalui agenda Tinjauan Kategori Pengembangan Produk, Tinjauan Kelayakan ataupun Tinjauan Program Pengembangan Produk.

Dalam mengidentifikasi Risiko Pengusul Program perlu memperhatikan Risiko di program-program sebelumnya sebagai masukan, terutama bila memiliki profil atau kondisi yang serupa.

Identifikasi Risiko Program dapat menggunakan standar Risiko yang telah ditetapkan. Risiko-risiko yang teridentifikasi dimasukkan dalam Daftar Risiko (*Risk Register*) berupa ***Formulir Program Risk Register (RFR-006)***.

5.3.2 Analisis dan Evaluasi Risiko

Analisis Risiko dimulai dari menentukan penyebab munculnya Risiko, Dampak yang ditimbulkan apabila Risiko benar terjadi, seberapa parah Dampak yang ditimbulkan (Skala Dampak) dan seberapa besar Kemungkinan Risiko terjadi (Skala Kemungkinan). Skala Dampak dan Skala Kemungkinan diukur dalam skala 1 sampai 5 berdasarkan tingkat keparahan dan tingkat Kemungkinan terjadinya Risiko. Kriteria Skala Dampak dan Skala Kemungkinan dapat dilihat pada **Lampiran 1** dan **Lampiran 2**.

Evaluasi Risiko dilakukan dengan menggunakan Skala Dampak dan Skala Kemungkinan untuk menghasilkan Skala Risiko yang dapat dilihat pada **Lampiran 3**. Satu Risiko hanya memiliki satu Level Risiko. Kategori Level Risiko yang dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Kategori Level Risiko

Skala Risiko	Level Risiko
1 s.d. 5	Rendah
6 s.d. 11	Rendah-Menengah

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Skala Risiko	Level Risiko
12 s.d. 15	Menengah
16 s.d. 19	Menengah-Tinggi
20 s.d. 25	Tinggi

Dasar penentuan Kategori Level Risiko yaitu Selera Risiko Perusahaan. Selera Risiko merupakan kondisi yang diinginkan oleh Perusahaan sehingga menjadi acuan bagi Perusahaan untuk menerima Risiko.

Pada Daftar Risiko *(Risk Register)*, Risiko-risiko yang telah diidentifikasi, dianalisis dan dievaluasi, diurutkan prioritasnya berdasarkan Level Risiko, dari Level Risiko tertinggi hingga Level Risiko terendah.

Posisi Risiko yang teridentifikasi ditunjukkan dalam Peta Risiko sesuai Kategori Level Risiko dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.3.3 Uji Kelayakan SMAP Transaksi atau Proyek

Fungsi Perencanaan Proyek menetapkan penilaian Risiko terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Transaksi atau Proyek/Aktivitas tertentu dengan menggunakan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002) / Formulir Program Risk Register (RFR-006).***

Apabila berdasarkan penetapan penilaian Risiko pada ***Formulir Project Risk Register (RFR-002) / Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** tersebut ditemukan adanya Risiko terkait penyuapan yang memiliki nilai Risiko di atas batas rendah pada Transaksi atau Proyek/Aktivitas terkait maka Fungsi Perencanaan Proyek melakukan Uji Kelayakan SMAP dengan menggunakan ***Formulir Uji Kelayakan SMAP Transaksi atau Proyek/Aktivitas (SFR-016)***.

Fungsi Perencanaan Proyek menyampaikan Hasil Uji Kelayakan SMAP terhadap Transaksi atau Proyek/Aktivitas tersebut kepada unit kerja terkait untuk disampaikan pada Forum Tinjauan Order sebagaimana ***Prosedur Penanganan Peluang dan Order Bisnis (SOP-001)***.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

5.3.4 Rencana Penanganan Risiko

Rencana penanganan Risiko merupakan tindak lanjut atas Risiko yang telah diidentifikasi untuk menurunkan Tingkat Risiko atau bahkan menghilangkan Risiko tersebut. Rencana penanganan Risiko bertujuan untuk menurunkan Skor Dampak dan/ atau Skor Kemungkinan. Tabel 5.2 di bawah ini berisi panduan singkat mengenai rencana penanganan Risiko berdasarkan skor Risiko atau Kategori Level Risiko.

Tabel 5.2 Panduan Rencana Penanganan Risiko

Skor Risiko	Kategori Level Risiko	Tindakan yang Diambil
1 s.d. 5	Rendah	Level Risiko yang masuk dalam Selera Risiko. Risiko diperhatikan dan dicatat ke dalam database Risiko.
6 s.d. 11	Rendah-Menengah	Level Risiko yang masuk dalam Selera Risiko. Dilakukan pemantauan atas Risiko dan dilakukan penanganan Risiko untuk mencegah kenaikan Level Risiko jika diperlukan.
12 s.d. 15	Menengah	Level Risiko yang masuk dalam Selera Risiko. Dilakukan pemantauan atas Risiko dan dapat dilakukan tindakan penanganan Risiko untuk mencegah kenaikan Level Risiko, namun tidak menjadi prioritas.
16 s.d. 19	Menengah-Tinggi	Diperlukan tindakan penanganan Risiko untuk menurunkan Level Risiko, sehingga sesuai dengan kondisi-kondisi yang diharapkan dan menguntungkan Perusahaan.
20 s.d. 25	Tinggi	Diperlukan segera tindakan penanganan Risiko untuk menurunkan Level Risiko,

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Skor Risiko	Kategori Level Risiko	Tindakan yang Diambil
		dengan koordinasi yang intensif bersama semua level pengambil keputusan dan pihak-pihak eksternal terkait.

Fungsi Perencanaan Proyek / Pengusul Program membuat rencana penanganan melalui koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait. Selain itu juga, perlu melihat rencana penanganan Risiko yang efektif di proyek-proyek atau program-program sebelumnya untuk menjadi masukan dalam penyusunan rencana penanganan Risiko Proyek / progam. Rencana penanganan yang dibuat harus memenuhi prinsip etika bisnis, tidak mengandung unsur penyuapan, *fraud*, korupsi dan konflik kepentingan terhadap pemberi kerja maupun vendor atau subkontraktor.

5.4 Penanganan Risiko Pada Tahap Inisiasi

Kegiatan identifikasi dan penanganan Risiko dilakukan melalui aktivitas pemasaran dan penjualan pada tahap inisiasi proyek untuk memperbesar peluang perolehan proyek hingga mendapatkan kondisi kontrak atau proyek yang menguntungkan Perusahaan. Dalam melakukan penanganan Risiko, *Risk Owner* dapat melibatkan unit kerja lain yang terkait.

5.5 Tinjauan Order

Ketika informasi proyek atau ***Formulir Profil Proyek (RFR-004)*** memadai, penanganan Risiko selama aktivitas pemasaran dan penjualan pada tahap inisiasi telah ditetapkan, serta persyaratan atau kondisi lainnya sudah memungkinkan, maka dilakukan Tinjauan Order. Pelaksanaan Tinjauan Order mengacu pada ***Prosedur Penanganan Peluang dan Order Bisnis (SOP-001)***.

Formulir Project Risk Register (RFR-002) menjadi salah satu pembahasan bersama dalam Tinjauan Order untuk mengetahui seluruh Risiko yang sudah teridentifikasi, realisasi penanganan Risiko yang dilakukan, potensi Risiko baru yang teridentifikasi serta usulan rencana penanganan Risiko lainnya.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.6 Tinjauan Kelayakan dan Tinjauan Pengembangan Produk

Pelaksanaan Tinjauan Kelayakan dan Tinjauan Pengembangan mengacu pada ***Prosedur Perencanaan Program Pengembangan Produk (EOP-304).***

Formulir Program Risk Register (RFR-006) menjadi salah satu pembahasan bersama dalam Tinjauan Kelayakan dan Tinjauan Pengembangan Produk untuk mengetahui realisasi penanganan Risiko yang dilakukan, potensi Risiko baru yang teridentifikasi serta usulan rencana penanganan Risiko lainnya. ***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** yang disetujui oleh seluruh peserta rapat dalam Tinjauan Kelayakan menjadi salah satu dokumen persyaratan pengajuan pembukaan kode program mengacu pada ***Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/ Program (FOP-700)***.

5.7 Memperbarui Risk Register

Formulir Project Risk Register (RFR-002) dan ***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** selalu diperbarui sesuai dengan perolehan informasi dan perubahan kondisi, baik yang terjadi karena faktor eksternal maupun akibat efektivitas penanganan Risiko selama aktivitas pemasaran dan penjualan, pengusulan program, Tinjauan Order, Tinjauan Kelayakan hingga Tinjauan Kontrak atau Tinjauan Pengembangan Produk. Pembaruan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*** dan ***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** meliputi perubahan Level Risiko karena adanya realisasi penanganan Risiko atau perubahan kondisi proyek/program serta Identifikasi Risiko baru. Setiap adanya pembaruan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*** atau ***Formulir Program Risk Register (RFR-006),*** *Risk Owner* harus melaporkan formulir tersebut kepada Fungsi Manajemen Risiko.

5.8 Tinjauan Kontrak

Formulir Project Risk Register (RFR-002) yang telah diperbarui dibahas bersama saat Tinjauan Kontrak. Pembahasan bertujuan untuk mengetahui realisasi penanganan Risiko yang dilakukan sampai dengan pelaksanaan Tinjauan Kontrak, potensi Risiko baru yang teridentifikasi serta usulan rencana penanganan Risiko lain, khususnya untuk menciptakan kondisi kontrak yang menguntungkan Perusahaan saat pelaksanaan proyek. Pelaksanaan Tinjauan Kontrak mengacu pada ***Prosedur Penanganan Kontrak (SOP-004)***. ***Formulir***

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Project Risk Register (RFR-002) disetujui dalam Tinjauan Kontrak oleh seluruh peserta rapat dan menjadi salah satu dokumen persyaratan pengajuan pembukaan kode proyek / program mengacu pada ***Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/ Program (FOP-700)***.

5.9 Tinjauan Pengembangan Produk

Formulir Program Risk Register (RFR-006) yang telah diperbarui dibahas bersama saat Tinjauan Pengembangan Produk. Pembahasan bertujuan untuk mengetahui realisasi penanganan Risiko yang dilakukan sampai dengan pelaksanaan Tinjauan Pengembangan Produk, potensi Risiko baru yang teridentifikasi serta usulan rencana penanganan Risiko lain, khususnya agar sasaran pengembangan dapat tercapai sesuai dengan rencana. Pelaksanaan Tinjauan Pengembangan Produk mengacu pada ***Prosedur Perencanaan Program Pengembangan Produk (EOP-304). Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** disetujui dalam Tinjauan Pengembangan Produk oleh seluruh peserta rapat dan menjadi salah satu dokumen persyaratan pengajuan pembukaan kode proyek/ program mengacu pada ***Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/ Program (FOP-700)***.

5.10 Penggunaan *Risk Register* dalam Tahap Pelaksanaan Proyek/Program

Formulir Project Risk Register (RFR-002)/***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** yang telah disetujui dalam Tinjauan Kontrak/Tinjauan Pengembangan Produk menjadi dokumen yang digunakan *Risk Owner* untuk mengendalikan Risiko yang telah teridentifikasi sesuai dengan rencana penanganannya. Bila rencana penanganan Risiko tidak dapat dilakukan karena perubahan kondisi proyek / program yang dinamis maka *Risk Owner* agar melakukan penyesuaian penanganan Risiko demi menurunkan Tingkat Risiko.

Apabila karena satu dan lain hal ada Risiko yang baru teridentifikasi saat proyek/program sudah berjalan, maka ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)***/***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** perlu diperbarui dengan menambahkan dan melengkapi Risiko yang baru teridentifikasi tersebut.

5.11 Pemantauan Penanganan Risiko Proyek/Program

Risk Owner melakukan pemantauan realisasi penanganan serta perubahan Tingkat Risiko atas Risiko yang telah teridentifikasi dalam ***Formulir Project Risk Register (RFR-***

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

002)*/*Formulir Program Risk Register (RFR-006) dan dilaporkan bersama dengan ***Formulir Laporan Kemajuan Proyek/Program (FFR-708)***.

Risk Officer secara berkala melakukan pembaruan terhadap ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*/*Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** dan terkait hasil penanganan Risiko yang sudah dilakukan, Risiko yang tidak dapat ditangani, atau penambahan Risiko lain yang terjadi selama pelaksanaan proyek/program.

5.12 Kejadian Risiko Proyek/Program

Kejadian atas Risiko Proyek/Progam yang telah teridentifikasi pada ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*/*Formulir Program Risk Register (RFR-006)***, termasuk kejadian atas Risiko yang tidak teridentifikasi sebelumnya pada awal penyusunan, dilaporkan oleh *Risk Owner* kepada Fungsi Manajemen Risiko selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian melalui ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*/*Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** masing-masing proyek/program.

5.13 Pelaporan Risiko

Risk Owner melaporkan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*/*Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** awal dan pembaruan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*/*Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** setiap ada realisasi penanganan Risiko, perubahan Tingkat Risiko, Identifikasi Risiko baru dan Kejadian Risiko kepada Fungsi Manajemen Risiko. Pembaruan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*/*Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** saat pelaksanaan proyek/program, termasuk *progress* realisasi penanganan Risiko dilaporkan setiap bulan bersama dengan ***Formulir Laporan Kemajuan Proyek (Program) (FFR-708)*** sebagai bagian laporan rutin proyek.

5.14 Penutupan Proyek/Program

Dalam pelaksanaan penutupan proyek/program, ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*/*Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** menjadi salah satu yang dibahas bersama untuk mengetahui Risiko-Risiko Proyek/Program yang teridentifikasi dari tahap inisiasi hingga proyek/program selesai, penanganan Risiko yang telah dilakukan, efektivitas penanganan Risiko serta Kejadian Risiko (bila ada). Pada penutupan proyek/program, ***Formulir Project***

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Risk Register (RFR-002)/***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** menampilkan Level Risiko akhir setelah dilakukan penanganan Risiko hingga proyek/program selesai. ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)***/***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** akhir disampaikan oleh *Risk Owner* kepada Fungsi Perencanaan Proyek/ Fungsi Litbang dan Fungsi Manajemen Risiko agar dapat terdokumentasi dan menjadi bahan evaluasi serta pembelajaran untuk penyusunan ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)***/***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** dan pelaksanaan proyek-proyek/program-program berikutnya. ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)***/***Formulir Program Risk Register (RFR-006)*** akhir juga menjadi salah satu dokumen yang disyaratkan dalam ***Formulir Laporan Dokumentasi Proyek (FFR-710)*** dan menjadi bagian dari Laporan Akhir Proyek.

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

6.0 FORMULIR TERKAIT


- ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)***
- ***Formulir Profil Proyek (RFR-004)***
- ***Formulir Profil Risiko Program (RFR-005)***
- ***Formulir Program Risk Register (RFR-006)***
- ***Formulir Tinjauan Order Proyek (SFR-003)***
- ***Formulir Tinjauan Kontrak Proyek (SFR-006)***
- ***Formulir Uji Kelayakan SMAP-Proyek atau Transaksi (SFR-016)***
- ***Formulir Tinjauan Kelayakan Pengembangan Produk (EFR-012)***
- ***Formulir Tinjauan Program Pengembangan Produk (EFR-014)***
- ***Formulir Laporan Kemajuan Proyek (Program) (FFR-708)***
- ***Formulir Laporan Dokumentasi Proyek (FFR-710)***
- ***Formulir Tinjauan Penutupan Proyek (Program) (FFR-713)***

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).	Strategic Transformation Office Risk Management Januari 2026

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru

26 OKT 2026 09:30


7.0 ALUR/FLOW

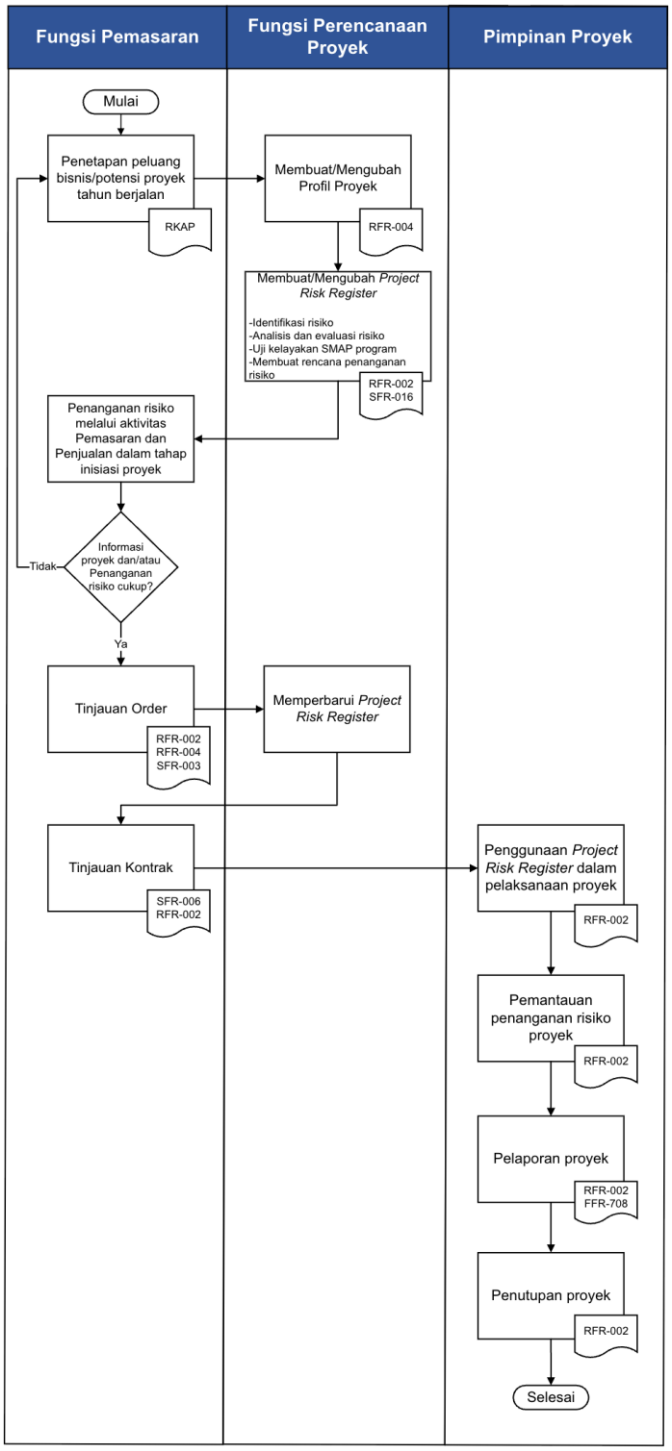

Flowchart ROP-911 : Kajian Risiko Proyek

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).	Strategic Transformation Office Risk Management Januari 2026

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

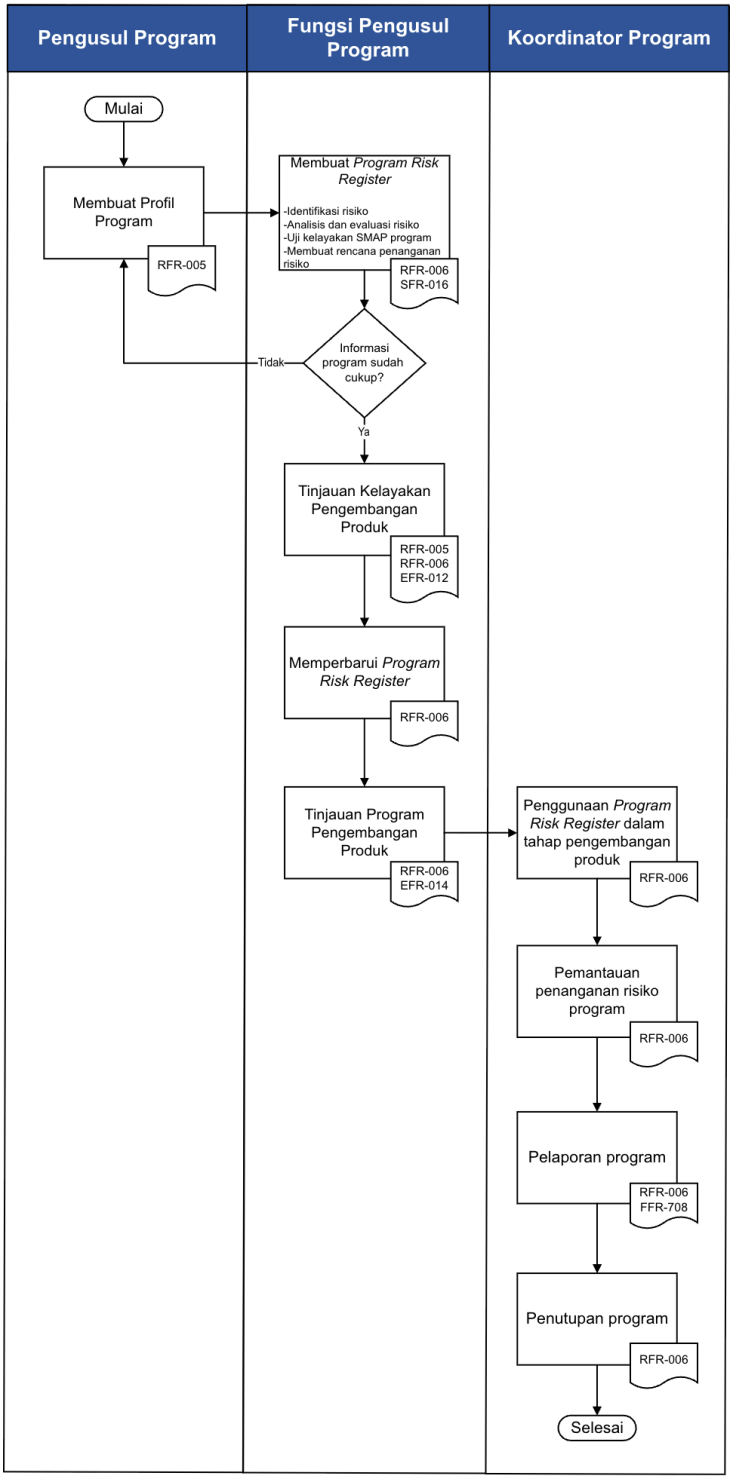

Flowchart ROP-911: Kajian Risiko Program

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

LAMPIRAN 1: Kriteria Dampak

No	Parameter	Dampak				
		Sangat Rendah (1)	**Rendah (2)**	**Menengah (3)**	**Tinggi (4)**	**Sangat Tinggi (5)**
Strategis						
1	Tujuan Strategis	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda kurang dari 1 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda antara 2 - 3 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda antara 3 - 6 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda antara 6 - 9 bulan	Minimal 1 parameter tujuan strategis tertunda lebih dari 9 bulan
2	Perolehan Kontrak	Tidak ada pengaruh signifikan pada perolehan kontrak	Perolehan kontrak tertunda maksimal 2 bulan	Kontrak tertunda lebih dari 2 bulan dan atau sampai dengan tahun kerja berikutnya	Kekalahan dalam tender	Perusahaan tidak dapat mengikuti (gagal) proses tender
Hukum						
1	Pelanggaran hukum	Perusahaan menghadapi masalah hukum yang minimal.	Perusahaan mendapat somasi. Ada tindakan hukum pada Perusahaan dengan Dampak rendah	Perusahaan mendapat tuntutan hukum. Ada tindakan hukum pada Perusahaan dengan Dampak menengah.	Perusahaan mendapat tuntutan hukum. Ada tindakan hukum pada Perusahaan dengan Dampak tinggi.	Perusahaan diputuskan kalah di pengadilan tingkat selanjutnya. Ada tindakan hukum pada Perusahaan dengan Dampak sangat mengganggu kinerja Perusahaan.
Kepatuhan						

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Parameter	Dampak				
		Sangat Rendah (1)	**Rendah (2)**	**Menengah (3)**	**Tinggi (4)**	**Sangat Tinggi (5)**
1	Pelanggaran ketentuan kepatuhan	Teguran informal / verbal	Diminta bertemu dengan pihak regulator (mis Kementerian terkait, Ditjen Pajak, dll)	Peringatan tertulis / formal, terkena denda	Regulator memberlakukan pembatasan dan/atau pembekuan terhadap aktivitas operasional / produk / jasa tertentu	Regulator memberlakukan sanksi signifikan (mis tidak diperkenankan mengikuti lelang, menarik produk yang beredar, dll)
Reputasi						
1	Keluhan pelanggan / nasabah / pembeli / supplier	Keluhan yg terisolasi dan dapat ditangani dalam 1 hari kerja	Keluhan yg terisolasi dan dapat diselesaikan dalam 3 hari kerja	Keluhan yang menyebar ke skala sektoral dan/atau diajukan secara kolektif yang dapat diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja dan masih berada dalam kewenangan Pimpinan Cabang/Wilayah	Keluhan yang menyebar ke skala nasional dan/atau diajukan secara kolektif yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja dan/atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat	Keluhan yang menyebar ke skala nasional/internasional dan/atau diajukan secara kolektif yang diselesaikan melebihi 10 hari kerja dan/atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Parameter	Dampak				
		Sangat Rendah (1)	**Rendah (2)**	**Menengah (3)**	**Tinggi (4)**	**Sangat Tinggi (5)**
2	Pemberitaan negatif di media	Publikasi negatif yg terisolasi di wilayah sektoral melalui media konvensional (mis. Radio, TV, Surat Kabar daerah)	Publikasi negatif yang lintas sektoral / wilayah / provinsi namun masih tersebar media konvensional.	Publikasi negatif yang lintas nasional yang tersebar di media konvensional skala nasional	Publikasi negatif mencapai skala nasional yang tersebar di sosial media dan/atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat	Publikasi negatif mencapai skala internasional yang tersebar di sosial media dan/atau memerlukan penanganan kewenangan Kantor Pusat
3	Kehilangan daya saing	Penurunan pangsa pasar hingga 5%	Penurunan pangsa pasar antara 5% - 10%	Penurunan pangsa pasar antara 10% - 15%	Penurunan pangsa pasar antara 15% - 20%	Penurunan pangsa pasar lebih dari 20%
Sumber Daya Manusia						
1	Keluhan karyawan	Terdapat keluhan karyawan yang disalurkan sampai tingkat SP Unit namun dapat diisolir dan diselesaikan oleh Pemimpin Unit (pimpinan proyek / koordinator program)	Terdapat keluhan karyawan yang perlu diselesaikan oleh Penyelia Pemimpin Unit	Terdapat keluhan yang disalurkan mencapai tingkat sektoral / wilayah / provinsi	Unjuk rasa karyawan yang mengganggu aktivitas Perusahaan dan/atau disertai terjadinya cedera serius / cacat permanen	Demonstrasi terkoordinasi, terjadinya kematian karyawan saat kerja

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Parameter	Dampak				
		Sangat Rendah (1)	**Rendah (2)**	**Menengah (3)**	**Tinggi (4)**	**Sangat Tinggi (5)**
2	*Turn over* karyawan bertalenta (*regretted turnover*)	*Turn over* pegawai bertalenta kurang dari 1% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta 1% - 5% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta antara 5% - 10% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta antara 10% - 15% setahun	*Turn over* pegawai bertalenta >15% setahun
Keuangan						
1	Pencapaian pendapatan proyek	≥ 100% dari RAP	95% ≤ X < 100% dari RAP	90% ≤ X < 95% dari RAP	85% ≤ X < 90% dari RAP	X < 85% dari RAP
2	Deviasi anggaran biaya proyek / program	X ≤ 0% dari RAP	0% < X ≤ 3% dari RAP	3% < X ≤ 5% dari RAP	5% < X ≤ 10% dari RAP	X > 10% dari RAP
3	Pencapaian kinerja proyek / program	100% sesuai RAP	97% ≤ X < 100% dari RAP	95% ≤ X < 97% dari RAP	90% ≤ X < 95% dari RAP	X < 90% dari RAP
4	Kerugian Finansial dari target EBITDA	Kerugian finansial proyek sampai dengan 2,5% dari (EBITDA / 10) dalam 12 bulan kedepan	Kerugian finansial proyek di atas 2,5% sampai dengan 5% dari (EBITDA / 10) dalam 12 bulan kedepan	Kerugian finansial proyek di atas 5% sampai dengan 7,5% dari (EBITDA / 10) dalam 12 bulan kedepan	Kerugian finansial proyek di atas 7,5% sampai dengan 10% dari (EBITDA / 10) dalam 12 bulan kedepan	Kerugian finansial proyek di atas 10% dari (EBITDA / 10) dalam 12 bulan kedepan
5	Deviasi Anggaran dari Target Nilai Rupiah HPP	Terjadinya deviasi anggaran sampai dengan 2 %	Terjadinya deviasi anggaran di atas 2 % sampai dengan 4 %	Terjadinya deviasi anggaran di atas 4 % sampai dengan 6 %	Terjadinya deviasi anggaran di atas 6 % sampai dengan 8 % dan atau proyek mengalami denda	Terjadi deviasi anggaran di atas 8 % dan atau proyek mengalami denda / kerugian

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Parameter	Dampak				
		Sangat Rendah (1)	**Rendah (2)**	**Menengah (3)**	**Tinggi (4)**	**Sangat Tinggi (5)**
Operasional						
1	Pelampauan SLA (*Service Level Agreement*) melebihi standar	< 1% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya/ongkos)	Antara 1% s/d 2,5% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya/ongkos)	Antara 2,5% s/d 10% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya/ongkos)	Antara 10% s/d 20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya/ongkos)	>20% dari standard SLA yang telah ditetapkan (diukur dari waktu kekosongan atau ketidaksediaan layanan produk atau tambahan biaya/ongkos)
2	Pelaksanaan Proyek	Berpengaruh tidak signifikan pada kualitas dan waktu penyelesaian proyek	Penambahan waktu pada salah satu aktifitas proyek, namun tidak mengganggu waktu keseluruhan penyelesaian proyek	Perubahan signifikan pada spesifikasi proyek dan atau perubahan waktu penyelesaian keseluruhan proyek, namun masih dapat dilakukan amandemen proyek	Perubahan signifikan pada spesifikasi proyek dan atau perubahan waktu penyelesaian keseluruhan proyek, dan tidak dapat dilakukan amandemen proyek	Terjadi penghentian proyek *(cut off)* dan atau amandemen kurang *(rescooping)* atau proyek mengalami kegagalan total
HSSE						
1	Fatality	Kasus Pertolongan Pertama.	Kasus Perawatan Medis.	Cacat tidak tetap/Ketidakhadiran kerja yang terbatas.	Kasus kematian tunggal/Cacat	Kasus kematian jamak

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Parameter	Dampak				
		Sangat Rendah (1)	**Rendah (2)**	**Menengah (3)**	**Tinggi (4)**	**Sangat Tinggi (5)**
					tetap/Ketidakhadiran kerja yang lama.	
		Tidak berpengaruh pada Kinerja Kerja	Efek kesehatan minor dan reversibel (tanpa rawat inap)	Efek ireversibel tanpa kehilangan nyawa tetapi dengan cacat serius dan rawat inap berkepanjangan	Efek ireversibel yang menyebabkan kematian	Wabah ke lingkungan.
						Potensi menyebabkan banyak kematian misalnya bahan kimia beracun berbahaya
2	Kerusakan Lingkungan	Kerusakan terbatas pada area minimal dengan signifikansi rendah	Efek minor pada lingkungan biologis atau fisik	Efek jangka pendek (1-2 tahun) tetapi tidak mempengaruhi fungsi ekosistem	Efek lingkungan jangka menengah (3-5 tahun) yang serius	Sangat serius Kerusakan lingkungan jangka panjang (>5 tahun) dari fungsi ekosistem

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

LAMPIRAN 2: Kriteria Kemungkinan

Hampir Tidak Pernah Terjadi (1)	Jarang Terjadi (2)	Mungkin Terjadi (3)	Sering Terjadi (4)	Hampir Selalu Terjadi (5)
Sangat jarang, paling banyak satu kali dalam setahun	Mungkin terjadi hanya sekali dalam 6 bulan	Pernah terjadi namun tidak sering, sekali dalam 4 bulan	Pernah terjadi sekali dalam 2 bulan	Pernah terjadi sekali dalam 1 bulan
< 1 permil dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Dari 1 permil s/d 1% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Diatas 1% s/d 5% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	Diatas 5 s/d 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi	> 10% dari frekuensi kejadian / jumlah transaksi
Probabilitas Kejadian Risiko di bawah 20%	Probabilitas Kejadian Risiko dari 20% sampai dengan 40%	Probabilitas Kejadian Risiko antara 40% sampai dengan 60%	Probabilitas Kejadian Risiko antara 60% sampai dengan 80%	Probabilitas Kejadian Risiko antara 80% sampai dengan 100%

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

LAMPIRAN 3: Peta Risiko Proyek/Program

KEMUNGKINAN						
	Hampir Pasti Terjadi 5	Low to Moderate 7	Moderate 12	Moderate to High 17	High 22	High 25
	Sangat Mungkin Terjadi 4	Low 4	Low to Moderate 9	Moderate 14	Moderate to High 19	High 24
	Bisa Terjadi 3	Low 3	Low to Moderate 8	Moderate 13	Moderate to High 18	High 23
	Jarang Terjadi 2	Low 2	Low to Moderate 6	Low to Moderate 11	Moderate to High 16	High 21
	Sangat Jarang Terjadi 1	Low 1	Low 5	Low to Moderate 10	Moderate 15	High 20
		Sangat Rendah 1	Rendah 2	Moderat 3	Tinggi 4	Sangat Tinggi 5
		DAMPAK				

Skala Risiko	Level Risiko
1–5	Low
6–11	Low to Moderate
12–15	Moderate
16–19	Moderate to High
20–25	High

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

8.0 MATRIKS PERUBAHAN

No	Poin Perubahan	ROP-911 rev.02 (Lama)	ROP-911 rev.03 (Baru)
1	Perubahan seluruh istilah	'Pengendalian Risiko'	'Penanganan Risiko'
2	Perubahan nama formulir RFR-002	Kajian Risiko Proyek	*Project / Program Risk Register*
3	Perubahan seluruh istilah	Penggunaan istilah 'Unit Bisnis' dan 'Unit Pengembangan Teknologi'	Penyesuaian penggunaan istilah 'Unit Bisnis' dan 'Unit Pengembangan Teknologi' menjadi istilah 'Unit Kerja' menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Perusahaan
4	Penambahan definisi istilah	Tidak mencantumkan definisi : 1. Risiko Proyek 2. Risiko Program 3. Asesmen Risiko 4. Pelaporan Risiko 5. Profil Program	Mencantumkan definisi : 1. Risiko Proyek 2. Risiko Program 3. Asesmen Risiko 4. Pelaporan Risiko 5. Profil Program 6. Risk Officer
5	Revisi Ruang Lingkup	Prosedur ini digunakan sebagai acuan Unit Bisnis dan unit pengembangan teknologi untuk mengelola dan mengendalikan Risiko Proyek sejak ditetapkannya target potensi proyek, selama proses pemasaran dan penjualan dalam tahap inisiasi proyek, tahap perencanaan proyek sampai dengan tahap pelaksanaan proyek. Kajian Risiko Proyek meliputi Proyek Bisnis, Proyek Litbang,	Prosedur ini digunakan sebagai acuan unit kerja untuk mengelola dan mengendalikan Risiko Proyek/Program sesuai dengan jenis-jenis proyek/program pada Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700) sejak diidentifikasinya peluang bisnis, selama proses pemasaran dan penjualan dalam tahap inisiasi, tahap perencanaan, tahap pengembangan, tahap pelaksanaan, sampai dengan tahap penutupan proyek/program.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

<table>
<tr><th>No</th><th>Poin Perubahan</th><th>ROP-911 rev.02 (Lama)</th><th>ROP-911 rev.03 (Baru)</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Program Eksternal Litbang dan Program Produk Ritel.</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pencantuman proses pembuatan Profil Program</td><td>Tidak tercantum</td><td>Mencantumkan proses pembuatan Profil Program</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pencantuman Prosedur GOP-1103</td><td>Belum mencantumkan Prosedur GOP-1103 Uji Kelayakan SMAP sebagai dokumen terkait</td><td>Mencantumkan Prosedur GOP-1103 Uji Kelayakan SMAP sebagai dokumen terkait</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Inisiasi penyusunan RFR-004 dan RFR-002</td><td>Inisiasi penyusunan RFR-004 Profil Proyek dan RFR-002 Kajian Risiko Proyek dilakukan oleh Unit Pemasaran</td><td>Inisiasi penyusunan RFR-004 Profil Proyek dan RFR-002 Project Risk Register dilakukan oleh Fungsi Perencanaan Proyek (atau Fungsi yang bertugas untuk membuat RAP) dengan koordinasi Fungsi terkait</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Penyesuaian Tingkat Risiko dan Kategori Tingkat Risiko (menyesuaikan dengan Perdir)</td><td>
<table>
<tr><th>Tingkat Risiko</th><th>Kategori Tingkat Risiko</th></tr>
<tr><td>1 - 4</td><td>Rendah</td></tr>
<tr><td>5 - 8</td><td>Sedang</td></tr>
<tr><td>9 - 16</td><td>Tinggi</td></tr>
<tr><td>> 16</td><td>Ekstrem</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>Tingkat Risiko</th><th>Kategori Tingkat Risiko</th></tr>
<tr><td>1 s.d. 5</td><td>Rendah</td></tr>
<tr><td>6 s.d. 11</td><td>Rendah-Menengah</td></tr>
<tr><td>12 s.d. 15</td><td>Menengah</td></tr>
<tr><td>16 s.d. 19</td><td>Menengah-Tinggi</td></tr>
<tr><td>20 s.d. 25</td><td>Tinggi</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

<table>
<tr><th>No</th><th>Poin Perubahan</th><th>ROP-911 rev.02 (Lama)</th><th>ROP-911 rev.03 (Baru)</th></tr>
<tr><td>10</td><td>Penyesuaian pada Panduan Rencana Penanganan Risiko</td><td>
<table>
<tr><th>Kategori Tingkat Risiko</th><th>Tindakan yang Diambil</th></tr>
<tr><td>Rendah</td><td>Cukup dilakukan langkah-langkah untuk tetap memperhatikan risiko tersebut</td></tr>
<tr><td>Sedang</td><td>Memantau risiko-risiko untuk melakukan tindakan preventif mencegah kenaikan tingkat risiko, jika diperlukan</td></tr>
<tr><td>Tinggi</td><td>Diperlukan tindakan pengendalian risiko untuk menurunkan tingkat risiko, sehingga sesuai dengan kondisi-kondisi yang diharapkan dan menguntungkan perusahaan</td></tr>
<tr><td>Ekstrem</td><td>Diperlukan segera tindakan pengendalian risiko untuk menurunkan tingkat risiko, dengan koordinasi yang intensif bersama semua level pengambil keputusan dan pihak-pihak eksternal terkait</td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><th>Tingkat Risiko</th><th>Kategori Tingkat Risiko</th><th>Tindakan yang Diambil</th></tr>
<tr><td>1 s.d. 5</td><td>Rendah</td><td>Melakukah langkah-langkah untuk tetap memperhatikan Risiko tersebut</td></tr>
<tr><td>6 s.d. 11</td><td>Rendah-Menengah</td><td>Disarankan tetap memantau Risiko-risiko sebagai dasar untuk melakukan tindakan preventif mencegah kenaikan Tingkat Risiko, jika diperlukan.</td></tr>
<tr><td>12 s.d. 15</td><td>Menengah</td><td>Diperlukan tindakan penanganan Risiko untuk menurunkan Tingkat Risiko, sehingga sesuai dengan kondisi-kondisi yang diharapkan dan menguntungkan Perusahaan</td></tr>
<tr><td>16 s.d. 19</td><td>Menengah -Tinggi</td><td>Diperlukan segera tindakan penanganan Risiko untuk menurunkan Tingkat Risiko, dengan koordinasi yang intensif bersama semua level pengambil keputusan dan pihak-pihak eksternal terkait</td></tr>
<tr><td>20 s.d. 25</td><td>Tinggi</td><td>Diperlukan segera tindakan penanganan Risiko untuk menurunkan Tingkat Risiko, dengan koordinasi yang intensif bersama semua level pengambil keputusan dan pihak-pihak eksternal terkait</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Pencantuman Proses Tinjauan Kelayakan dan Tinjauan Pengembangan Produk</td><td>Tidak terdapat proses Tinjauan Kelayakan dan Tinjauan Pengembangan Produk</td><td>Mencantumkan proses Tinjauan Kelayakan dan Tinjauan Pengembangan Produk.</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Pencantuman proses Tinjauan Pengembangan Produk</td><td>Tidak mencantumkan Tinjauan Pengembangan Produk</td><td>Mencantumkan proses Tinjauan Pengembangan Produk</td></tr>
</table>

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

No	Poin Perubahan	ROP-911 rev.02 (Lama)	ROP-911 rev.03 (Baru)
13	Penambahan cara penyampaian formulir RFR-002 akhir	Penggunaan Formulir Kajian Risiko Proyek (RFR-002) dalam tahap penutupan proyek.	Formulir Project Risk Register (RFR-002)/Formulir Program Risk Register (RFR-006) akhir disampaikan oleh Pimpinan Proyek/Koordinator Proyek Litbang /Koordinator Program sebagai *Risk Owner* kepada Fungsi Perencanaan Proyek/ Fungsi Litbang dan Fungsi Manajemen Risiko agar dapat terdokumentasi dan menjadi bahan evaluasi serta pembelajaran untuk penyusunan Formulir Project Risk Register (RFR-002)/Formulir Program Risk Register (RFR-006) dan pelaksanaan proyek-proyek/program-program berikutnya. Formulir Project Risk Register (RFR-002)/Formulir Program Risk Register (RFR-006) akhir juga menjadi salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Laporan Dokumentasi Proyek (FFR-710) dan menjadi bagian dari Laporan Akhir Proyek.
14	Pencantuman Alur Proses Kajian Risiko Program	Tidak mencantumkan Alur Proses Kajian Risiko Program	Mencantumkan Alur Proses Kajian Risiko Program
15	5.11 Pemantauan Penanganan Risiko Proyek/Program	Belum mencamtumkan tugas/fungsi dari Risk Officer pada narasi	Mencamtumkan tugas/fungsi dari Risk Officer pada narasi

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:30

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa izin tertulis dari PT Len Industri (Persero).
