PT Len Industri (Persero)	Halaman **1 dari 55**
BOP-001 **MANAJEMEN PROYEK**	Revisi: **01**

Disusun oleh :	Direviu oleh :		Disetujui oleh :
SVP Project Deployment Center Tanggal : Tanda Tangan : (Alfian Mahendra)	**GM Business Process Management** Tanggal : Tanda Tangan : (Yunika Sopandi)	**Management Representative** Tanggal : Tanda Tangan : (Billy Barokah)	**Direktur Operasi** Tanggal : Tanda Tangan : (Iqbal Fikri)
SVP Project Management Office Tanggal : Tanda Tangan : (Dani Rukmana)			

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	PIC
00	6-1-2025	Semua halaman terbitan pertama	IS
01	Scan barcode tanda tangan "Disetujui oleh"	Semua halaman disesuaikan dengan standar PMBOK	IS

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenD untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI **1**
DAFTAR ISI **1**
1.0 TUJUAN **3**
2.0 RUANG LINGKUP **3**
3.0 DEFINISI **3**
3.1 Baseline 3
3.2 Change Control Management (CCM) 3
3.3 Change Request 3
3.4 Control Baseline / Baseline 0 3
3.5 Change Log 4
3.6 Deliverable 4
3.7 Dokumen Kontrak 4
3.8 Integrated Change Control 4
3.9 Issue Log 4
3.10 Kick-Off Meeting 4
3.11 Kode Proyek 4
3.12 Kontrak 4
3.13 Lessons Learned 5
3.14 Manajemen Proyek 5
3.15 Pelanggan 5
3.16 *Project Charter* 5
3.17 Project Sponsor 5
3.18 Pimpinan Proyek 5
3.19 *Project Management Plan* 6
3.20 Project Schedule Baseline 6
3.21 Project Stakeholder Register 6
3.22 Proyek 6
3.23 Purnajual Proyek 6
3.24 Quality Metrics 6
3.25 RASCI Matrix 6
3.26 Rekanan 7
3.27 Risk Register 7
3.28 Scope Baseline 7
3.29 Scope Creep 7
3.30 Stakeholder 7
3.31 Stakeholder Engagement Plan 7
3.32 Stakeholder Register 8
3.33 Standar PMBOK 8
3.34 Sumber Daya Proyek 8
3.35 Terminasi Proyek 8
3.36 Tim Proyek 8
3.37 Tinjauan Kontrak 8
3.38 *Top Up* Anggaran 8
3.39 *Work Breakdown Structure* (*WBS*) 9
4.0 DOKUMEN TERKAIT **9**
5.0 PROSEDUR **10**
5.1 Tahap Inisiasi (*Initiating*) 10
5.1.1 Pembukaan Kode Proyek 10
5.1.2 Penetapan Pimpro dan Tim Proyek 10
5.1.3 Penetapan *Project Charter* 11

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26/09/2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.2 Tahap Perencanaan (Planning) 12
5.2.1 Reviu Dokumen PMP 12
5.2.2 *Kick-Off Meeting* 17
5.2.3 *Top Up* Anggaran Proyek 18
5.3 Tahap Eksekusi Proyek (*Executing)* 18
5.3.1 Mengarahkan dan Mengelola Pekerjaan Proyek 18
5.3.2 Pengelolaan Pengetahuan Proyek 19
5.3.3 Pembentukan, Pengembangan, dan Pengelolaan Tim Proyek 19
5.3.4 Pengelolaan Mutu Proyek 20
5.3.5 Pengelolaan Komunikasi Proyek 20
5.3.6 Implementasi *Project Risk Response* & K3L 21
5.3.7 Pengadaan Proyek 21
5.3.8 Engagement Stakeholder 22
5.4 Tahap Pengawasan dan Pengendalian (*Monitoring and Controlling*) 24
5.4.1 Pengawasan dan Pengendalian Proyek (*Monitoring and Controlling Project Work*) 24
5.4.2 Kendali Perubahan Terintegrasi Proyek (*Perform Integrated Change Control*) 25
5.4.3 Kontrol dan Validasi Ruang Lingkup Proyek 26
5.4.4 Pemantauan Jadwal Proyek 26
5.4.5 Pemantauan Biaya Proyek 26
5.4.6 Pengendalian Mutu Proyek 27
5.4.7 Pemantauan Sumber Daya Proyek 28
5.4.8 Pemantauan Komunikasi Proyek 28
5.4.9 Pemantauan Risiko & implementasi K3L Proyek 29
5.4.10 Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Proyek 30
5.4.11 Pemantauan *Stakeholder Engagement* 30
5.5 Tahap Penutupan (Closing) 32
5.5.1 Proyek Selesai 100% 32
5.5.2 Terminasi Proyek 32
5.5.3 Pembukaan Kode Purnajual Proyek 33
5.5.4 Pendokumentasian Arsip Proyek 33
6.0 FORMULIR TERKAIT 34
7.0 ALUR/FLOW 35
8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN 36

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

1.0 TUJUAN

Prosedur ini sebagai acuan dalam rangka membangun *operational excellence* dalam pengelolaan Proyek, sehingga Proyek dapat berjalan dan diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dengan memenuhi sasaran dalam semua aspek yang disyaratkan termasuk aspek kualitas, anggaran, jadwal, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini membahas mengenai tahapan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Proyek (Pimpro) beserta tim dalam mengelola Proyek. Prosedur ini disusun dengan merujuk Standar PMBOK, termasuk dalam penentuan definisi nomenklatur yang digunakan.

Dalam Prosedur ini, setiap tahapan hanya dijabarkan secara umum, penjabaran teknis dan lebih rinci untuk pelaksanaan suatu tahapan (jika diperlukan) akan disajikan dalam bentuk panduan atau instruksi kerja terpisah. Tim Proyek dapat memperinci pelaksanaan Prosedur ini sesuai dengan jenis dan karakteristik Proyek serta kebutuhan yang disyaratkan oleh Pelanggan dan peraturan perundang-undangan.

3.0 DEFINISI

3.1 Baseline

Baseline adalah acuan resmi yang telah disetujui sebagai dasar pengukuran dan pengendalian kinerja Proyek.

3.2 Change Control Management (CCM)

Change Control Management (CCM) adalah forum pengendalian perubahan yang bertugas mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap setiap usulan perubahan (*Change Request*) sebelum diputuskan oleh pejabat yang berwenang.

3.3 Change Request

Change Request adalah usulan perubahan terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, sumber daya, atau aspek lain dalam pelaksanaan Proyek.

3.4 Control Baseline / Baseline 0

Control Baseline / Baseline 0 adalah baseline awal hasil kesepakatan pada *Kick-Off Meeting* yang menjadi dasar komitmen pelaksanaan dan pengendalian Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.5 Change Log

Change Log adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat seluruh permintaan perubahan, status evaluasi, keputusan, dan implementasi perubahan dalam Proyek.

3.6 Deliverable

Deliverable adalah hasil kerja, produk, layanan, atau keluaran yang harus diserahkan dalam pelaksanaan Proyek.

3.7 Dokumen Kontrak

Dokumen Kontrak adalah kumpulan dokumen pendukung Kontrak yang berisikan klausul-klausul mengenai perjanjian yang akan dilakukan antara Pelanggan dan Perusahaan.

3.8 Integrated Change Control

Integrated Change Control adalah proses pengendalian perubahan secara terintegrasi pada Proyek melalui pengkajian dan evaluasi terhadap setiap usulan perubahan untuk memastikan dampaknya terhadap lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, sumber daya, dan kontrak Proyek dapat dikelola secara menyeluruh sebelum perubahan ditetapkan dan dilaksanakan.

3.9 Issue Log

Issue Log adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan isu atau permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan Proyek.

3.10 Kick-Off Meeting

Kick-Off Meeting adalah rapat resmi yang diselenggarakan setelah proses reviu dan pendetailan dokumen *Project Management Plan* (PMP) selesai, yang dipimpin oleh Fungsi Pengawasan Proyek untuk memaparkan hasil perencanaan Proyek kepada seluruh fungsi terkait, menyelaraskan pemahaman, peran, tanggung jawab, dan komitmen pelaksanaan Proyek.

3.11 Kode Proyek

Kode Proyek adalah kode penamaan suatu Proyek.

3.12 Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara Perusahaan dengan Pelanggan atau pihak lain yang memuat ruang lingkup pekerjaan, nilai, hak, kewajiban, jadwal, serta syarat dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan.

Dokumen ti[illegible]
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.13 Lessons Learned

Lessons Learned adalah pengetahuan, pengalaman, atau pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan Proyek yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peningkatan Proyek yang sedang berjalan dan atau untuk Proyek berikutnya.

3.14 Manajemen Proyek

Manajemen Proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyelesaikan Proyek sesuai sasaran ruang lingkup, biaya, mutu, dan waktu

3.15 Pelanggan

Pelanggan adalah pihak (Perusahaan atau lembaga atau organisasi; internal atau eksternal) yang memberikan Proyek dan akan membayar atas produk, jasa, atau hasil kerja dari Proyek tersebut.

3.16 *Project Charter*

Project Charter adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sponsor Proyek atau manajemen tingkat atas yang secara formal mengesahkan keberadaan sebuah Proyek. Dokumen ini memberikan wewenang kepada Pimpro untuk menggunakan sumber daya organisasi guna melaksanakan aktivitas Proyek.

3.17 Project Sponsor

Project Sponsor adalah pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh organisasi untuk mewakili kepentingan bisnis atas suatu Proyek, yang bertanggung jawab memberikan arahan strategis, menyetujui ruang lingkup, anggaran, dan perubahan signifikan, memastikan tersedianya sumber daya, serta mengambil keputusan strategis yang diperlukan agar Proyek mencapai tujuan, manfaat, dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.18 Pimpinan Proyek

Pimpinan Proyek selanjutnya disebut **Pimpro** adalah seseorang yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab penuh kepada Perusahaan atas pelaksanaan dan penyelesaian Proyek dalam ruang lingkup yang ditentukan beserta pencapaian tujuan dan sasaran sesuai harapan Pelanggan serta persyaratan jadwal, anggaran, dan mutu yang ditentukan dengan cara memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya yang ada.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.19 *Project Management Plan*

Project Management Plan selanjutnya disebut **PMP** adalah dokumen utama yang menjelaskan bagaimana Proyek direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan.

3.20 Project Schedule Baseline

Project Schedule Baseline adalah jadwal Proyek yang telah disetujui dan digunakan sebagai dasar pengukuran serta pengendalian kinerja waktu Proyek.

3.21 Project Stakeholder Register

Project Stakeholder Register adalah dokumen yang berisi identifikasi, klasifikasi, kebutuhan, pengaruh, dan strategi pendekatan terhadap *Stakeholder* Proyek

3.22 Proyek

Proyek adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sementara, terencana, dan terkoordinasi untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil tertentu dengan ruang lingkup, waktu, biaya, mutu, dan sumber daya yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Perusahaan atau Pelanggan.

3.23 Purnajual Proyek

Purnajual Proyek adalah fase layanan, pemeliharaan, dan dukungan teknis yang diberikan kepada Pelanggan setelah pekerjaan utama Proyek selesai dan diserahterimakan secara resmi.

3.24 Quality Metrics

Quality Metrics adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai dan mengendalikan pencapaian mutu dalam pelaksanaan Proyek.

3.25 RASCI Matrix

RASCI Matrix merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam suatu proyek atau proses. Penjelasan RASCI adalah sebagai berikut :

- ***Responsible* (Bertanggung jawab)**: Orang atau tim yang melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas atau membuat keputusan. Mereka yang melaksanakan tugas secara langsung.
- ***Accountable* (Bertanggung jawab secara akhir)**: Orang yang memiliki tanggung jawab akhir untuk hasil dari tugas atau keputusan. Hanya boleh ada satu orang yang accountable untuk setiap tugas agar tidak ada kebingungan.
- **Supporting (mendukung)**: Fungsi atau pihak pendukung yang membantu Responsible dalam menyelesaikan tugas.

Dokumen tidak terkontrol apabila diakses dari luar melalui jaringan terbatas
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- ***Consulted* (Dikonsultasikan)**: Orang atau pihak yang memberikan masukan atau informasi selama pelaksanaan tugas. Mereka biasanya terlibat dalam diskusi atau konsultasi, tetapi tidak melakukan pekerjaan langsung.
- ***Informed* (Diberi Informasi)**: Orang atau pihak yang perlu mendapatkan informasi tentang kemajuan atau hasil dari tugas, tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya.

3.26 Rekanan

Rekanan adalah entitas eksternal yang terikat Kontrak untuk menyediakan komponen atau layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan Proyek.

3.27 Risk Register

Risk Register adalah dokumen yang berisi daftar risiko Proyek, tingkat risiko, penyebab, dampak, pemilik risiko, serta rencana mitigasi dan tindak lanjutnya.

3.28 Scope Baseline

Scope Baseline adalah acuan ruang lingkup Proyek yang telah disetujui dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan serta pengendalian ruang lingkup Proyek.

3.29 Scope Creep

Scope Creep adalah perluasan ruang lingkup Proyek yang tidak terkendali tanpa adanya penyesuaian terhadap waktu, biaya, dan sumber daya. *Scope Creep* umumnya terjadi akibat perubahan kebutuhan atau penambahan pekerjaan yang tidak melalui proses *integrated change control*, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Proyek.

3.30 Stakeholder

Stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau memiliki kepentingan terhadap Proyek.

3.31 Stakeholder Engagement Plan

Stakeholder Engagement Plan adalah dokumen yang menetapkan strategi, pendekatan, dan tindakan untuk melibatkan Stakeholder secara efektif sepanjang pelaksanaan Proyek guna mendukung pencapaian tujuan Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.32 Stakeholder Register

Stakeholder Register adalah dokumen Proyek yang memuat daftar *Stakeholder* beserta informasi mengenai identitas, peran, kepentingan, pengaruh, kebutuhan, ekspektasi, dan karakteristik lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan keterlibatan Stakeholder selama Proyek berlangsung.

3.33 Standar PMBOK

Standar PMBOK adalah standar global dan kumpulan praktik terbaik dalam manajemen Proyek yang diterbitkan oleh *Project Management Institute* (PMI).

3.34 Sumber Daya Proyek

Sumber Daya Proyek adalah sumber daya tim (*team resources*) dan sumber daya fisik (*physical resources*) yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek.

3.35 Terminasi Proyek

Terminasi Proyek adalah proses penghentian secara formal terhadap pelaksanaan Proyek sebelum seluruh ruang lingkup pekerjaan selesai sepenuhnya, berdasarkan keputusan Perusahaan dan/atau Pelanggan sesuai ketentuan Kontrak, dengan melaksanakan penyelesaian administratif, teknis, finansial, dan dokumentasi Proyek sesuai persyaratan yang berlaku.

3.36 Tim Proyek

Tim Proyek adalah sekumpulan orang dari berbagai fungsi terkait yang dipimpin oleh Pimpinan Proyek (Pimpro) untuk melaksanakan kegiatan Proyek dan bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan yang ditugaskan beserta hasil kerja yang diharapkan.

3.37 Tinjauan Kontrak

Tinjauan Kontrak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meninjau seluruh persyaratan dan lingkup pekerjaan di dalam draft Kontrak. Tinjauan Kontrak juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Kontrak.

3.38 *Top Up* Anggaran

***Top Up* Anggaran** adalah Pengajuan pembukaan mata anggaran terhadap mata Anggaran yang belum di input ke dalam sistem ERP.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.39 *Work Breakdown Structure* (*WBS*)

Work Breakdown Structure (*WBS*) adalah dekomposisi hierarkis dari total ruang lingkup Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Tim Proyek untuk mencapai tujuan Proyek dan menghasilkan penyerahan (*deliverables*) yang diperlukan.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Peraturan Direksi Nomor : 001/PERDIR-MSM001/DU/I/2026 tentang Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan PT Len Industri (Persero);***
- ***Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SKEP.HC/DU/I/2026 tentang Struktur Organisasi PT Len Industri (Persero) beserta Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi;***
- ***Nota Nomor : 021/N/UQ/VIII/2026 tentang Pembaruan Pemetaan Fungsi Generik Terhadap Unit Aktual;***
- ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002);***
- ***Prosedur Pembukaan Kode Proyek/Program/Transfer Load (FOP-700);***
- ***Prosedur Penutupan Kode Proyek/Program/Transfer Load (FOP-705);***
- ***Prosedur Pemilihan dan Evaluasi Pimpinan Proyek (HOP-609);***
- ***Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan (POP Series);***
- ***Prosedur Audit Internal (QOP-803);***
- ***Prosedur Pengendalian Alat Ukur dan Pantau (QOP-814);***
- ***Prosedur Kajian Risiko Proyek (ROP-911);***
- ***Prosedur Operasional Pengelolaan Risiko (ROP Series);***
- ***Prosedur Penanganan Peluang dan Order Bisnis (SOP-001);***
- ***Prosedur Penanganan Kontrak (SOP-004);***
- ***Prosedur Penanganan Adendum Kontrak (SOP-009);***
- ***Prosedur Operasional terkait HSE dan Keamanan (VOP Series);***
- ***Prosedur Barang Persediaan Proyek (WOP-207);***
- ***Panduan Perubahan Anggaran Pelaksanaan Proyek (BOG-003);***
- ***Panduan Mutu Proyek (QOG-001);***
- ***Panduan Perencanaan Mutu (QOG-002).***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.0 PROSEDUR

Sesuai Standar PMBOK, kegiatan di dalam suatu Proyek dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu:

a. Tahap Inisiasi (*Initiating*);
b. Tahap Perencanaan (*Planning*);
c. Tahap Eksekusi (*Executing*);
d. Tahap Pengawasan dan Pengendalian (*Monitoring and Controlling*);
e. Tahap Penutupan (*Closing*).

Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam prosedur ini guna memastikan pelaksanaan Proyek berjalan sesuai rencana, ketentuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fungsi Penjaminan Mutu melakukan kegiatan pengawasan dalam bidang mutu Proyek sejak dari tahap inisiasi sampai penutupan Proyek mengacu pada dokumen petunjuk teknis terkait mutu Proyek.

5.1 Tahap Inisiasi (*Initiating*)

Tahap inisiasi Proyek merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ditandatanganinya Dokumen Kontrak antara Pelanggan dengan Perusahaan, untuk menandai kegiatan Proyek secara resmi dimulai. Tahap ini mencakup pembukaan Kode Proyek, penetapan organisasi Proyek, serta penetapan *Project Charter*. Tahap inisiasi Proyek ini bertujuan untuk menyelaraskan harapan *Stakeholder* dengan tujuan Proyek.

Proses utama dalam tahap inisiasi Proyek adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan Kode Proyek,
2. Penetapan Pimpinan Proyek dan Tim Proyek,
3. Penetapan *Project Charter*.

5.1.1 Pembukaan Kode Proyek

Pembukaan Kode Proyek dilakukan setelah dokumen PMP yang dikoordinasikan oleh Fungsi Perencanaan Proyek diserahterimakan kepada Fungsi Pelaksanaan Proyek sesuai ***Prosedur Penanganan Kontrak (SOP-004)***. Selanjutnya, dilakukan Pembukaan Kode Proyek dengan mengacu kepada ***Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program/Transfer Load (FOP-700).***

5.1.2 Penetapan Pimpro dan Tim Proyek

Fungsi Pelaksanaan Proyek melakukan penetapan Pimpro dengan mengacu kepada ***Prosedur Pemilihan dan Evaluasi Pimpinan Proyek (HOP-609)***.

Fungsi Pelaksanaan Proyek menyusun, menetapkan, dan memobilisasi Tim Proyek untuk menangani Proyek, disesuaikan dengan peraturan internal Perusahaan mengenai klasifikasi Proyek, struktur organisasi dan persyaratan dari Pelanggan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenQ untuk melihat versi terbaru.
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Penetapan Tim Proyek (khususnya tim inti Proyek) dilakukan bersama dengan penetapan Pimpro dan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pembukaan Kode Proyek.

5.1.3 Penetapan *Project Charter*

Fungsi Pelaksanaan Proyek melakukan penyusunan dan penetapan *Project Charter* dengan menggunakan ***Template Project Charter (BOT-001)*** berdasarkan pada dokumen PMP yang telah diterima.

Tabel 1. RASCI Matriks Tahap Inisiasi

No.	Aktivitas	Accountable (A)	Responsible (R)	Supporting (S)	Consult (C)	Informed (I)
1	Pembukaan Kode Proyek	Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek	Fungsi Pelaksanaan Proyek	Fungsi Pengendali Anggaran	Fungsi Perencanaan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
2	Penetapan Pimpro dan Tim Proyek	Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek	Fungsi Pelaksanaan Proyek	• Fungsi Pengendali Anggaran • Fungsi Perencanaan Proyek • Fungsi Rekrutmen	Fungsi Pengawasan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
3	Penetapan Project Charter	Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek	Fungsi Pelaksanaan Proyek	Fungsi Perencanaan Proyek	• Fungsi Pengendali Anggaran • Fungsi Keuangan	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.2 Tahap Perencanaan (Planning)

Tahap perencanaan Proyek merupakan kegiatan awal setelah tahap inisiasi selesai, terdiri dari beberapa proses untuk mendetailkan ruang lingkup Proyek, mendefinisikan dan menyempurnakan tujuan, serta mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan Proyek.

5.2.1 Reviu Dokumen PMP

Tim Proyek dengan melibatkan seluruh fungsi yang terkait pada tahap praproyek melakukan proses reviu untuk memeriksa, memperbaiki, dan melengkapi dokumen PMP.

Dalam proses reviu ini, Tim Proyek bersama dengan seluruh fungsi terkait melakukan pendefinisian ulang aktivitas pengelolaan Proyek yang ada di dalam PMP, meliputi :

1. Manajemen Ruang Lingkup Proyek;
2. Manajemen Jadwal Proyek;
3. Manajemen Biaya Proyek;
4. Manajemen Mutu Proyek;
5. Manajemen Sumber Daya Proyek;
6. Manajemen Komunikasi Proyek;
7. Manajemen Risiko & K3L Proyek;
8. Manajemen Pengadaan Proyek;
9. Manajemen *Stakeholder* Proyek.

5.2.1.1 Manajemen Ruang Lingkup Proyek

Manajemen ruang lingkup Proyek menjelaskan bagaimana lingkup Proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan, sehingga dapat memberikan panduan tentang bagaimana lingkup Proyek akan dikelola dan didokumentasikan pada saat tahap eksekusi proyek dimulai.

Tim Proyek bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Pemasaran, dan Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen ruang lingkup yang ada dalam dokumen PMP.

Proses ini menghasilkan keluaran (*output*) Dokumen Acuan Ruang Lingkup *(Scope Baseline)* yang secara keseluruhan dapat berupa namun tidak terbatas pada:

- Dokumen Rencana Struktur Rincian Kerja*/ Work Breakdown Structure Plan (WBS Plan)*;
- Dokumen Daftar *Requirement* Proyek dan Produk;
- *Requirements Management Plan*;
- *Project Scope Statement (*dokumen yang mencantumkan lingkup yang dikerjakan dan lingkup yang tidak dikerjakan sehingga mencegah *Scope Creep;*
- Daftar asumsi *(assumption logs);*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- Kesepahaman antar *Stakeholder* termasuk namun tidak terbatas pada Daftar Persyaratan Dokumen Kontrak/ *Contract Document Requirement List (CDRL).*

5.2.1.2 Manajemen Jadwal Proyek

Manajemen jadwal Proyek merupakan proses pendefinisian, pendetailan, dan penetapan rencana waktu atau jadwal pada setiap rincian kerja sesuai dengan harapan dan tujuan Proyek, sehingga dapat memberikan panduan tentang bagaimana jadwal akan dikelola dan dikendalikan sepanjang waktu pelaksanaan Proyek.

Tim Proyek Bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Pemasaran, dan Fungsi Perencanaan Pengadaan melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen jadwal Proyek yang ada dalam dokumen PMP.

Proses ini menghasilkan keluaran (*output*) *Dokumen Rencana Manajemen Jadwal Proyek (Project Schedule Management Plan)* yang secara keseluruhan dapat berupa:

- Daftar Kegiatan (*Activity List*);
- Estimasi Durasi; dan
- Acuan Jadwal Proyek (*Project Schedule Baseline*).

5.2.1.3 Manajemen Biaya Proyek

Manajemen biaya Proyek menjelaskan bagaimana biaya Proyek akan diestimasi, dianggarkan, dikelola, diawasi, dan dikendalikan, sehingga dapat memberikan panduan tentang bagaimana biaya Proyek akan dikelola sepanjang waktu pelaksanaan Proyek.

Tim Proyek Bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Pengendali Anggaran dan Fungsi Keuangan melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen biaya Proyek yang ada dalam dokumen PMP.

Proses ini menghasilkan keluaran (*output*) berupa *Project Income Statement* (*PIS*) yang didalamnya mencakup Rencana Arus Kas Proyek *(Cash Flow),* dan Rencana Pendanaan/Pembiayaan Proyek.

5.2.1.4 Manajemen Mutu Proyek

Manajemen mutu Proyek merupakan proses mengidentifikasi persyaratan dan/atau standar mutu untuk Proyek dan hasil yang seharusnya diperoleh, serta mendokumentasikan bagaimana Proyek akan menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan dan/atau standar mutu sehingga dapat memberikan panduan tentang bagaimana mutu akan dikelola dan diverifikasi sepanjang waktu pelaksanaan Proyek. Proses ini mengacu kepada ***Panduan Perencanaan Mutu (QOG-002).***

Tim Proyek bersama dengan Fungsi Penjaminan Mutu melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen mutu Proyek yang ada dalam dokumen PMP.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Proses ini menghasilkan keluaran (*output*) matriks mutu (*quality metrics*) yang secara keseluruhan dapat berupa *Dokumen Rencana Manajemen Kualitas (Quality Management Plan)*.

5.2.1.5 Manajemen Sumber Daya Proyek

Manajemen sumber daya Proyek merupakan proses mendefinisikan, memperkirakan, memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya fisik dan Tim Proyek, sehingga dapat menetapkan pendekatan yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya Proyek berdasarkan jenis dan kompleksitas Proyek sepanjang waktu pelaksanaan Proyek.

Tim Proyek bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Rekrutmen, dan Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen sumber daya Proyek yang ada dalam dokumen PMP.

Proses ini menghasilkan keluaran (output) Dokumen Rencana Manajemen Sumber Daya Proyek (*Resource Management Plan*) yang secara keseluruhan dapat berupa :

- Dokumen Rencana Kebutuhan Sumber Daya,
- Dokumen Rencana Struktur Organisasi Proyek,
- *Team Charter* (didalamnya termasuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi), *decision making process*, *escalation path*).

5.2.1.6 Manajemen Komunikasi Proyek

Manajemen komunikasi Proyek menjelaskan rencana komunikasi Proyek berdasarkan kebutuhan informasi setiap *Stakeholder* dan kebutuhan Proyek, sehingga dapat melakukan pendekatan secara komprehensif untuk melibatkan *Stakeholder* secara efektif dan efisien dengan menyajikan informasi yang relevan serta tepat waktu.

Tim Proyek bersama Fungsi Pemasaran melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen komunikasi Proyek yang ada dalam dokumen PMP.

Proses ini menghasilkan keluaran (*output*) berupa Dokumen Matriks Rencana Komunikasi Internal/Eksternal (*Internal/External Communication Matrix Plan*) dengan kerangka minimal yang mencakup hal-hal ssebagai berikut :

- Prinsip komunikasi
- Struktur komunikasi
- Frekuensi komunikasi
- Media komunikasi
- Alur komunikasi
- *Project Dashboard*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.2.1.7 Manajemen Risiko & K3L Proyek

Perencanaan Manajemen Risiko dan K3L Proyek disusun untuk menetapkan pendekatan, metode, peran dan tanggung jawab, serta mekanisme pengelolaan risiko dan K3L yang akan diterapkan selama siklus hidup Proyek.

Tim Proyek bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi K3, dan Fungsi Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan reviu dan pendetailan terhadap aspek manajemen risiko dan K3L yang telah ditetapkan dalam dokumen PMP. Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko, tindakan mitigasi, pengendalian K3L, serta kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat risiko Proyek.

Proses ini menghasilkan Dokumen Rencana Manajemen Risiko Proyek (*Project Risk Management Plan*) dan Dokumen Rencana HSE (*HSE Plan*) sebagai acuan pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian risiko serta K3L selama pelaksanaan Proyek.

5.2.1.8 Manajemen Pengadaan Proyek

Manajemen pengadaan Proyek merupakan proses perencanaan kebutuhan pengadaan barang/jasa Proyek, menentukan pendekatan atau metode pengadaan, manajemen pergudangan/penyimpanan, manajemen distribusi, pengiriman, dan manajemen impor-ekspor, sehingga pada proses ini dapat menentukan apakah akan memperoleh barang dan jasa tersebut dari luar Proyek dan, jika demikian, apa yang akan diperoleh serta bagaimana dan kapan memperolehnya (*Make or Buy Decision*), serta dapat menjadi panduan tentang bagaimana proses pengadaan akan dikelola sepanjang waktu pelaksanaan Proyek.

Tim Proyek bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Pemasaran, dan Fungsi Perencanaan Pengadaan melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen pengadaan Proyek yang ada dalam dokumen PMP.

Proses ini menghasilkan keluaran (*output*) berupa *Dokumen Perencanaan Pengadaan (Procurement Plan)*.

5.2.1.9 Manajemen Stakeholder Proyek

Manajemen *Stakeholder* Proyek merupakan proses perencanaan dan pengembangan pendekatan untuk melibatkan *Stakeholder* Proyek berdasarkan kebutuhan, harapan, kepentingan, dan potensi dampak mereka terhadap Proyek, sehingga dapat memberikan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan secara efektif, dan dapat menjadi panduan tentang bagaimana proses pendekatan kepada pemangku kepentingan akan dikelola sepanjang waktu pelaksanaan Proyek.

Tim Proyek bersama Fungsi Pemasaran melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen *Stakeholder* Proyek yang ada dalam dokumen PMP.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Proses ini menghasilkan keluaran (*output*) berupa *Dokumen Rencana Pendekatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan)*.

Tabel 2. RASCI Matriks Reviu Dokumen PMP

No.	Aktivitas	Accountable (A)	Responsible (R)	Supporting (S)	Consult (C)	Informed (I)
1	Manajemen Ruang Lingkup	Pimpro	Tim Proyek	• Fungsi Perencanaan Proyek • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
2	Manajemen Jadwal Proyek	Pimpro	Tim Proyek	• Fungsi Perencanaan Proyek • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Fungsi Pemasaran • Fungsi Perencanaan Pengadaan	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
3	Manajemen Biaya Proyek	Pimpro	• Tim Proyek • Fungsi Pengendali Anggaran • Fungsi Keuangan • Fungsi Perencanaan Pengadaan	Fungsi Perencanaan Proyek	• Fungsi Pengawasan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
4	Manajemen Mutu Proyek	Pimpro	• Tim Proyek • Fungsi Penjaminan Mutu	Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Struktural Fungsi Penjaminan Mutu	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
5	Manajemen Sumber Daya	Pimpro	Tim Proyek	Fungsi Perencanaan Proyek	• Fungsi Rekrutmen • Fungsi Pembelajaran dan Pengembangan SDM • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

6	Manajemen Komunikasi	Pimpro	Tim Proyek	• Fungsi Perencanaan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
7	Manajemen Risiko & K3L Proyek	Pimpro	Tim Proyek	Fungsi Perencanaan Proyek	• Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi K3 • Fungsi Pengelolaan Lingkungan	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
8	Manajemen Pengadaan	Pimpro	• Tim Proyek • Fungsi Perencanaan Pengadaan	• Fungsi Perencanaan Proyek	• Fungsi Pemasaran • Fungsi Operasional Pengadaan	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
9	Manajemen Stakeholder	Pimpro	• Tim Proyek • Fungsi Pemasaran	• Fungsi Perencanaan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor

5.2.2 *Kick-Off Meeting*

Setelah proses reviu dan pendetailan dokumen PMP selesai, selanjutnya Fungsi Pengawasan Proyek memimpin dan menyelenggarakan *Kick-Off Meeting* yang dihadiri oleh peserta sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Peserta Kick-Off Meeting

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin dan Penyelenggara Rapat	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek
2	Pemapar Rapat	Eselon I/II Fungsi Pelaksanaan Proyek / Pimpro
3	Peserta	Eselon II Fungsi Pemasaran Eselon II Fungsi Perencanaan Proyek Eselon II Fungsi Rekayasa Proyek Eselon II Fungsi Pengendali Anggaran Eselon II Fungsi Keuangan Eselon II Fungsi Penjaminan Mutu Eselon II Fungsi Rekrutmen Eselon II Fungsi Manajemen Risiko Eselon II Fungsi Pengandaan

Struktural yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan definisi pada prosedur ini.

Dokumen tidak terkendali jika diakses setelah tanggal berikut ini. Lihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Dalam *Kick-Off Meeting* ini Tim Proyek memaparkan dokumen PMP yang telah direviu, diperbaiki, dan dilengkapi kepada peserta rapat.

Hasil Kick-Off Meeting ini dicatat dalam ***Formulir Risalah Rapat (CFR-022)*** dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada unit kerja terkait sesuai tabel peserta Kick-Off Meeting.

Kick-Off Meeting ini selanjutnya ditetapkan sebagai *Control Baseline / Baseline 0* yang menjadi komitmen awal dari Fungsi Pelaksanaan Proyek dan komitmen dukungan dari segenap fungsi lainnya.

5.2.3 *Top Up* Anggaran Proyek

Fungsi Pelaksanaan Proyek melaksanakan *Top Up* Anggaran Proyek secara berkala, petunjuk teknis terkait Top Up Anggaran ini mengacu kepada ***Panduan Perubahan Anggaran Pelaksanaan Proyek (BOG-003)***.

5.3 Tahap Eksekusi Proyek (*Executing)*

Tahap Eksekusi Proyek (*executing*) terdiri dari proses-proses yang dilakukan untuk menyelesaikan Pekerjaan yang telah disepakati dan ditetapkan pada tahap perencanaan (*planning*) guna menghasilkan keluaran (*deliverable*) yang memenuhi persyaratan Proyek.

Pimpro didukung oleh pejabat struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek bertanggungjawab untuk mengelola dan menjalankan Proyek serta memastikan tahap eksekusi Proyek ini berjalan sesuai dengan dokumen PMP yang telah ditetapkan pada saat *Kick-Off Meeting*.

5.3.1 Mengarahkan dan Mengelola Pekerjaan Proyek

Pimpro bertanggungjawab dalam memimpin, mengarahkan,-mengelola dan mengendalikan kegiatan Tim Proyek dalam menjalankan pekerjaan Proyek mulai dari eksekusi *Project Management Plan,* koordinasi sumber daya, pengelolaan perubahan (*change management*) yang telah disetujui, hingga pengumpulan data progress kinerja proyek.

Selama Proyek berlangsung, Pimpro mengoordinasikan sumber daya Proyek yang terdiri dari Tim Proyek, peralatan, material, dan sumber daya lainnya secara efektif. Koordinasi ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga menghasilkan keluaran (*deliverable*) yang memenuhi kriteria penerimaan pelanggan.

Dalam pelaksanaannya, Tim Proyek dengan dukungan Fungsi Penjaminan Mutu melakukan verifikasi deliverable secara internal. Selanjutnya, dilakukan proses validasi deliverable yang melibatkan Pelanggan untuk mendapatkan pengakuan atau penerimaan atas Pekerjaan yang telah diselesaikan. Penerimaan ini kemudian disahkan menggunakan Dokumen Berita Acara Kegiatan (sesuai Kontrak).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenQ untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Selain itu, Pimpro juga memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan dan standard yang berlaku di Perusahaan termasuk dalam aspek standard mutu, K3L, anti penyuapan, dan keamanan informasi.

Data terkait kemajuan pekerjaan, serta seluruh isu/permasalahan Proyek diidentifikasi, ditindaklanjuti, dan didokumentasikan untuk meminimalkan dampak terhadap pencapaian progress proyek. Pimpro melaporkan isu/permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus kepada manajemen Perusahaan berikut dengan laporan kemajuan dan indikator kinerja Proyek menggunakan ***Formulir Laporan Kemajuan Proyek (FFR-708)*** secara berkala kepada Fungsi Pengawasan Proyek.

Pimpro mengidentifikasi dan mengelola permintaan perubahan (*change request*) menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)*** dan memastikan implementasi atas perubahan yang telah disetujui ke dalam pelaksanaan proyek termasuk penyesuaian terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, maupun sumber daya. Apabila *change request* menghasilkan keputusan adanya perubahan/adendum/amandemen Kontrak maka dilakukan dengan mengacu pada ***Prosedur Penanganan Adendum Kontrak (SOP-009).***

5.3.2 Pengelolaan Pengetahuan Proyek

Pimpro bertanggung jawab untuk menggunakan informasi mengenai *lesson learned* yang relevan dari Proyek sebelumnya untuk memudahkan pengambilan keputusan dan mencegah tim mengulang kesalahan yang sama.

Selama Proyek berlangsung Pimpro juga bertanggungjawab untuk:

- mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendokumentasikan setiap *lesson learned* yang terjadi selama Proyek berlangsung;
- memfasilitasi dan mendorong proses diskusi Tim Proyek secara rutin dengan tujuan untuk *sharing knowledge*, serta diskusi analisis tindak lanjut pemecahan masalah/isu Proyek yang dapat dijadikan *lesson learned* baru.

Lesson learned tersebut didokumentasikan ke dalam *Dokumen Project Lessons Learn Register.*

5.3.3 Pembentukan, Pengembangan, dan Pengelolaan Tim Proyek

Pimpro melakukan proses rekrutmen anggota tim, yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Proyek sesuai Dokumen Rencana Manajemen Sumber Daya Proyek *(Resource Management Plan)*, sehingga dalam pelaksanaan Proyek terdapat panduan untuk melakukan pemilihan sumber daya serta menugaskannya kedalam aktivitas masing-masing.

Pimpro bersama Fungsi Rekrutmen menyusun Dokumen Rekrutmen Tim Proyek (jika diperlukan sesuai rencana), Dokumen *assignment* anggota Tim Proyek (termasuk pembagian *job description, periodic task & KPI* dalam struktur organisasi Proyek), serta Dokumen Reviu Kinerja Karyawan Proyek sesuai dengan peraturan internal Perusahaan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenQ untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pembentukan, pengembangan dan pengelolaan Tim Proyek menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)*** apabila dibutuhkan***.***

5.3.4 Pengelolaan Mutu Proyek

Tim Proyek menerjemahkan rencana manajemen mutu Proyek sesuai Dokumen Rencana Manajemen Mutu *(Quality Management Plan)* ke dalam aktivitas mutu yang dapat dieksekusi dalam Proyek.

Pelaksanaan aktivitas proyek oleh Tim Proyek juga mengacu pada ***Panduan Mutu Proyek (QOG-001)*** untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan mutu, serta mengidentifikasi proses yang tidak efektif dan menjadi penyebab mutu yang buruk. Tim Proyek juga bertanggung jawab dalam membuat dan melakukan *update* terhadap Dokumen Laporan Mutu Proyek *(Project Quality Report)* serta membuat dan melakukan pengarsipan Dokumen Evaluasi dan Pengujian Proyek *(Project Test And Evaluation).*

Pimpro bertanggung jawab dalam memastikan implementasi rencana mutu oleh Tim Proyek, mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu (*quality assurance*) dengan Fungsi Penjaminan Mutu, serta menindaklanjuti ketidaksesuaian terkait mutu.

Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pengelolaan mutu Proyek menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)*** apabila dibutuhkan***.***

5.3.5 Pengelolaan Komunikasi Proyek

Tim Proyek bersama Fungsi Pemasaran melakukan proses pengelolaan informasi Proyek sesuai Dokumen Matriks Rencana Komunikasi Internal/Eksternal (*Internal/External Communication Matrix Plan*), termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, dan pengawasan informasi akhir Proyek secara tepat waktu dengan aman.

Dengan kolaborasi yang baik diharapkan aliran informasi pelaksanaan Proyek dapat tersampaikan kepada *Stakeholder* dengan efektif dan efisien.

Proses ini menghasilkan keluaran (*output*) berupa ***Formulir Risalah Rapat (CFR-022)***, laporan, presentasi, *project information radiator*, standarisasi pelaporan, dan lain sebagainya.

Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pengelolaan komunikasi Proyek menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)*** apabila dibutuhkan***.***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.3.6 Implementasi *Project Risk Response* & K3L

Tim Proyek melaksanakan implementasi *Project Risk Response* dan K3L sesuai .Dokumen Rencana Manajemen Risiko Proyek (*Project Risk Management Plan*) dan Dokumen Rencana HSE (*HSE Plan*) yang telah disahkan. Implementasi tersebut bertujuan untuk memastikan tindakan mitigasi risiko dan pengendalian K3L dilaksanakan secara efektif sehingga potensi dampak negatif terhadap sasaran Proyek dapat diminimalkan serta peluang yang memberikan manfaat bagi Proyek dapat dioptimalkan.

Pimpro bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan *Project Risk Response* dan K3L serta memastikan seluruh Tim Proyek melaksanakan tindakan mitigasi risiko dan pengendalian K3L sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Tim Proyek melakukan pembaruan bulanan terhadap ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*** berdasarkan perkembangan Proyek, hasil implementasi tindakan mitigasi, dan risiko baru yang teridentifikasi. Untuk aspek K3L, Pimpro bersama Tim Proyek, Fungsi K3, dan Fungsi Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan peninjauan secara berkala terhadap pelaksanaan *HSE Plan* serta memperbarui dokumen HSE yang relevan, termasuk ***Formulir Identifikasi dan Penilaian Bahaya-Risiko K3 dan Aspek-Dampak Lingkungan (VFR-015)***, apabila terdapat perubahan metode kerja, ruang lingkup pekerjaan, kondisi lapangan, peralatan, regulasi, maupun kondisi lain yang memengaruhi risiko K3L Proyek.

Apabila hasil implementasi atau evaluasi menunjukkan perlunya perubahan terhadap strategi mitigasi risiko, rencana pengelolaan risiko, pengendalian K3L, maupun dokumen perencanaan Proyek lainnya, Pimpro mengajukan permintaan perubahan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)*** sesuai mekanisme Kendali Perubahan Terintegrasi (*Integrated Change Control*). Setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang, *Project Risk Management Plan, HSE Plan,* dan dokumen Proyek terkait diperbarui sesuai perubahan yang telah disetujui.

Seluruh proses implementasi *Project Risk Response* dan K3L mengacu pada ***Prosedur Operasional Pengelolaan Risiko (ROP Series)*** serta ***Prosedur Operasional terkait HSE dan Keamanan (VOP Series)*.**

5.3.7 Pengadaan Proyek

Fungsi Operasional Pengadaan melakukan proses perolehan dan pemilihan rekanan untuk memenuhi seluruh kebutuhan Proyek sesuai Dokumen Perencanaan Pengadaan Proyek *(Project Procurement Plan)* mengacu kepada ***Prosedur Pengadaan barang dan Jasa (POP Series).***

Pada saat pelaksanaan Proyek, diharapkan seluruh kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Apabila terjadi kendala, Tim Proyek dapat memasukkannya ke dalam *Issue Log/Action Tracker* dan melaporkannya kepada Pimpro.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Tim Proyek dan Fungsi Operasional Pengadaan membuat dan mendokumentasikan Formulir Penyelesaian Pengadaan Barang (*Good Receipt*), Formulir Penyelesaian Pengadaan Jasa (*Services Entry Sheet*).

Fungsi Operasional Pengadaan membuat serta mengarsipkan dokumen yang berisi data penyedia/pemasok terpilih *(selected supplier)* dan seluruh Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (*Procurement Contract*) terkait Proyek yang berjalan.

Pimpro bersama Fungsi Operasional Pengadaan melakukan evaluasi terkait kinerja Kontrak pengadaan, kinerja Rekanan penyedia, perubahan dan koreksi proses pengadaan, serta penyelesaian Kontrak pengadaan.

Selama proyek berjalan, Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pengadaan Proyek menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)*** apabila dibutuhkan***.***

5.3.8 Engagement Stakeholder

Pimpro bersama Fungsi Pemasaran melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan *Stakeholder* serta melaksanakan interaksi dengan metode dan strategi yang telah ditetapkan sesuai Dokumen Rencana Pendekatan Pemangku Kepentingan *(Stakeholder Engagement Plan)*.

Dengan proses ini diharapkan agar tujuan dari *Stakeholder* dapat sejalan dengan kepentingan Proyek yang sedang berjalan.

Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pengelolaan *engagement Stakeholder* menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)*** apabila dibutuhkan***.***

Tabel 3. RASCI Matriks Tahap Eksekusi Proyek

No.	Aktivitas	Accountable (A)	Responsible (R)	Supporting (S)	Consult (C)	Informed (I)
1	Mengarahkan dan Mengelola Pekerjaan Proyek	Pimpro	Tim Proyek	• Fungsi Pengawasan Proyek • Fungsi Penjaminan Mutu • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Fungsi Pemasaran • Fungsi Pengendali Anggaran • Fungsi Kontrak Bisnis • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

2	Pengelolaan Pengetahuan Proyek	Pimpro	Tim Proyek		• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
3	Pembentukan, Pengembangan, dan Pengelolaan Tim Proyek	Pimpro	Tim Proyek	• Fungsi Rekrutmen • Fungsi Pembelajaran dan Pengembangan SDM	Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
4	Pengelolaan Mutu Proyek	Pimpro	Tim Proyek	• Fungsi Penjaminan Mutu • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	Struktural Fungsi Penjaminan Mutu	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
5	Pengelolaan Komunikasi Proyek	Pimpro	Tim Proyek	Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
6	Implementasi *Project Risk Response* & K3L	Pimpro	Tim Proyek	• Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi K3 • Fungsi Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Fungsi Manajemen Risiko • Struktural Fungsi K3L	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
7	Pengadaan Proyek	Pimpro	• Fungsi Perencanaan Pengadaan • Fungsi Operasional Pengadaan	• Tim Proyek • Fungsi Pengelola Gudang • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Fungsi Pengawasan Proyek • Fungsi Penjaminan Mutu • Fungsi Quality Control	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

8	*Engagement Stakeholder*	Pimpro	Tim Proyek	Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor

5.4 Tahap Pengawasan dan Pengendalian (*Monitoring and Controlling*)

Dalam tahap ini terdapat proses-proses yang dilakukan untuk melacak, meninjau, dan mengevaluasi kemajuan dan kinerja Proyek, mengidentifikasi area di mana perubahan pada rencana diperlukan, serta menginisiasi perubahan yang sesuai, pengawasan dan pengendalian bersifat berkelanjutan sepanjang siklus Proyek.

5.4.1 Pengawasan dan Pengendalian Proyek (*Monitoring and Controlling Project Work*)

Fungsi Pengawasan Proyek secara berkala memeriksa kemajuan dan kondisi Proyek untuk dibandingkan dengan dokumen PMP. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah Proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi harapan Pelanggan atau tidak.

Dengan pengawasan ini memungkinkan *Stakeholder* untuk memahami kondisi Proyek saat ini, mengenali langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah kinerja Proyek yang muncul, dan memiliki visibilitas terhadap status Proyek di masa depan dengan perkiraan biaya dan jadwal Proyek.

Fungsi Pengawasan Proyek menyusun laporan bulanan menggunakan Dokumen Laporan Evaluasi Proyek Terintegrasi (termasuk namun tidak terbatas pada platform pelaporan dan laporan monitoring bulanan).

Fungsi Pengawasan Proyek menyerahkan laporan monitoring bulanan kepada Fungsi Akuntasi paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya, laporan monitoring bulanan ini menggunakan ***Formulir Laporan Kemajuan Proyek/Program (FFR-708)*** dengan mengacu pada mekanisme dibawah ini:

- Perhitungan progres pada ***Formulir Laporan Kemajuan Proyek/Program*** (***FFR-708***) mengacu kepada kepada **Rencana Anggaran Biaya (RAB)** Proyek sebagaimana yang telah ditentukan dalam Kontrak.

  Formulasi setiap bobot pekerjaan ditentukan sebagai berikut :

$$\text{Bobot Pekerjaan (\%)} = \frac{\text{Harga Pekerjaan (per } Scope)}{\text{Total Nilai Kontrak}} \text{ x } 100\%$$

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- Jika terjadi Adendum Kontrak, Fungsi Pengawasan Proyek bersama Fungsi Pelaksanaan Proyek melakukan penanganan adendum dengan mengacu kepada ***Prosedur Penanganan Adendum Kontrak (SFR-009)***.

Apabila ada penyesuaian terkait pengawasan Proyek, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan perubahan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

5.4.2 Kendali Perubahan Terintegrasi Proyek (*Perform Integrated Change Control*)

Setiap perubahan terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, maupun aspek lain yang memengaruhi sasaran Proyek wajib melalui proses Kendali Perubahan Terintegrasi (*Integrated Change Control*) dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai matriks kewenangan sebelum perubahan tersebut dapat diimplementasikan.

Fungsi Pengawasan Proyek mengoordinasikan proses Kendali Perubahan Terintegrasi (*Integrated Change Control*) dengan memastikan setiap *Change Request* didokumentasikan, dianalisis, dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Analisis perubahan meliputi dampak terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, sumber daya, Kontrak, serta aspek lainnya yang relevan, termasuk kesesuaian dengan batas kewenangan dalam Kontrak yang telah ditetapkan.

Setiap permintaan perubahan yang diajukan oleh Pimpro dengan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)*** dapat dibahas dalam forum *Change Control Management (CCM)* yang dipimpin oleh Fungsi Pengawasan Proyek dan dihadiri oleh Pimpro, Fungsi Pelaksanaan Proyek, serta fungsi terkait lain sesuai dengan ruang lingkup perubahan yang diusulkan. CCM bertugas melakukan evaluasi terhadap urgensi, manfaat, dampak, risiko, dan konsekuensi perubahan, serta memberikan rekomendasi kepada pejabat atau pihak yang berwenang untuk memperoleh keputusan persetujuan, penolakan, atau penundaan pelaksanaan perubahan.

Setelah permintaan perubahan disetujui oleh forum CCM, Fungsi Pengawasan Proyek memastikan implementasi terkait permintaan perubahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup dan ketentuan yang tercantum dalam ***Formulir Change Request (BFR-001)***. Apabila diperlukan, Pimpro bersama fungsi terkait melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Proyek yang terdampak sebagai akibat dari perubahan yang telah disetujui.

Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan setiap *Change Request* yang telah disetujui untuk memastikan implementasinya sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Seluruh permintaan perubahan yang tercatat dalam ***Formulir Change Request (BFR-001)***, baik yang disetujui, ditolak, maupun masih dalam proses, wajib dicatat dan dipelihara oleh Fungsi Pengawasan Proyek dalam database *Change Log* sebagai dasar pelaporan, pengendalian, serta penyediaan rekam jejak (*audit trail*) perubahan selama siklus hidup Proyek.

5.4.3 Kontrol dan Validasi Ruang Lingkup Proyek

Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terkait ruang lingkup Proyek sesuai Dokumen Acuan Ruang Lingkup *(Scope Baseline)* yang sudah disahkan sebelumnya untuk mengetahui data *deliverable* yang dihasilkan oleh Tim Proyek sebagai mekanisme utama pencegahan *Scope Creep.*

Apabila dalam kegiatan pengawasan dan validasi ruang lingkup Proyek ini ditemukan hal yang tidak sesuai, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

5.4.4 Pemantauan Jadwal Proyek

Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan atas jadwal dari Proyek yang sedang berjalan sesuai *Dokumen Rencana Manajemen Jadwal Proyek (Project Schedule Management Plan)* yang sudah disahkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengelola perubahan (jika diperlukan) yang mencakup informasi sebagai berikut :

1. Jadwal WBS yang telah diselesaikan dan masih dalam proses pengerjaan Proyek.
2. Prediksi atas jadwal penyelesaian ke depan berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini.

Fungsi Pengawasan Proyek menetapkan matriks pemantauan termasuk namun tidak terbatas pada milestone dan kurva-s, dimana pemantauan terkait jadwal Proyek ini dilakukan secara mingguan dan bulanan.

Berdasarkan pemantauan jadwal Proyek ini, apabila diperlukan, Fungsi Pengawasan Proyek bisa meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

5.4.5 Pemantauan Biaya Proyek

Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan atas anggaran dan biaya dari Proyek yang sedang berjalan sesuai Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek, dan Rencana Arus Kas Proyek yang sudah disahkan sebelumnya dengan tujuan untuk melakukan *update* terhadap anggaran biaya Proyek serta mengelola perubahannya (jika diperlukan) dalam *baseline* jadwal dari perencanaan.

Fungsi Pengawasan Proyek juga melakukan pemantauan terkait realisasi nilai dan arus kas Proyek sesuai progres yang terdeliver kepada Pelanggan, Proses ini selanjutnya menjadi input untuk proses penagihan yang diatur dalam panduan terpisah.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Fungsi Pengawasan Proyek didukung oleh Fungsi Pengendali Anggaran dan Fungsi Perencanaan Proyek membuat laporan terkait anggaran dan biaya Proyek sebagai berikut :

1. Informasi terkini *budget* dan keuangan Proyek yang telah diselesaikan dan dalam proses pengerjaan dari sisi pelaksanaan Proyek.
2. Prediksi atas anggaran dan biaya penyelesaian Proyek ke depan atas kondisi yang terjadi saat ini.

Apabila dalam pemantauan ditemukan hal yang tidak sesuai terkait anggaran/biaya, Fungsi Pengawasan Proyek bisa meminta Pimpro untuk melakukan permintaan perubahan dengan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

5.4.6 Pengendalian Mutu Proyek

Fungsi Penjaminan Mutu melakukan kegiatan pengawasan dalam bidang mutu Proyek sejak dari tahap inisiasi sampai penutupan Proyek mengacu pada dokumen petunjuk teknis terkait mutu Proyek.

Fungsi Penjaminan Mutu melakukan pemantauan dan pendokumentasian dari hasil pelaksanaan aktivitas manajemen mutu sesuai Dokumen Rencana Manajemen Kualitas (*Quality Management Plan*) yang sudah disahkan sebelumnya dengan tujuan melakukan penilaian terhadap performa Proyek serta meyakinkan hasil dari setiap aktivitas Proyek telah selesai di tiap WBS dengan baik dan benar serta memenuhi eskpektasi Pelanggan.

Fungsi Penjaminan Mutu melakukan pendokumentasian menggunakan Dokumen Pengukuran Pengendalian Mutu Proyek yang berisi rekap atas hasil pelaksanaan aktivitas pengendalian mutu di Proyek.

Fungsi Penjaminan Mutu menyusun dokumen *deliverable* dari Proyek telah diinspeksi, dievaluasi, dan telah memenuhi *requirements* dari kegiatan internal sebelum diperiksa oleh Pelanggan, dokumen ini salah satunya adalah bagian dari proses *Testing and Commisioning (T&C)* yang pemeriksaannya dilakukan secara internal.

Apabila dalam pemantauan ditemukan hal yang tidak sesuai terkait mutu, Fungsi Penjaminan Mutu bisa meminta Pimpro untuk melakukan permintaan perubahan dengan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

Fungsi Penjaminan Mutu melakukan audit mutu Proyek untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan mutu dari Pelanggan dengan realisasinya pada pelaksanaan Proyek yang bersangkutan. Pelaksanaan audit Proyek mengacu pada ***Prosedur Audit Internal (QOP-803)***.

Seluruh proses ini mengacu kepada ***Panduan Mutu Proyek (QOG-001).***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.4.7 Pemantauan Sumber Daya Proyek

Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terkait Sumber Daya Proyek yang dialokasikan dan dikerahkan telah seusai dengan Dokumen Rencana Manajemen Sumber Daya *(Resource Management Plan)* yang telah disahkan sebelumnya, serta memantau pula rencana pengelolaan sumber daya tersebut dengan membandingkan rencana dan data *actual* yang telah dilaksanakan.

Apabila dalam pemantauan ditemukan hal yang tidak sesuai terkait sumber daya, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

5.4.8 Pemantauan Komunikasi Proyek

Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terkait informasi yang dibutuhkan oleh Proyek dan *Stakeholder* apakah sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan, serta memantau juga terkait aliran informasi apakah sudah berjalan optimal sesuai *Dokumen Matriks Rencana Komunikasi Internal/Eksternal Proyek (Internal/External Project Communication Matrix Plan)* yang sudah disahkan sebelumnya.

Apabila dalam pemantauan komunikasi Proyek ditemukan hal yang tidak sesuai, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

Rapat Tinjauan Proyek

Fungsi Pengawasan Proyek menilai kemajuan dan kinerja suatu Proyek serta melakukan koordinasi dengan fungsi terkait dalam upaya *lesson learned, problem solving* dan memberikan rekomendasi *de-bottlenecking* terhadap isu-isu dengan intensitas sesuai dengan kinerja Proyek.

Fungsi Pengawasan Proyek dapat menyelenggarakan rapat tinjauan Proyek secara berkala dalam kurun waktu disesuaikan dengan kinerja Proyek. Rapat Tinjauan Proyek dilaksanakan dalam rangka pendalaman isu dari berbagai aspek terkait suatu kendala atau risiko dan pengambilan keputusan bersama untuk mengatasi kendala atau mengendalikan risiko tersebut.

Aspek utama yang ditinjau pada rapat tinjauan Proyek mencakup:

- Aspek kemajuan Proyek;
- Aspek anggaran;
- Aspek risiko & peluang;
- Aspek pengadaan barang/komponen;
- Aspek pencatatan & penanganan umpan balik;
- Aspek mutu;
- Aspek lain sesuai kebutuhan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Aspek lain tersebut beserta fungsi peninjaunya ditentukan oleh Fungsi Pengawasan Proyek disesuaikan dengan sifat Proyek atau persyaratan Pelanggan, misalnya aspek produksi ditambahkan jika sifat Proyek mempunyai lingkup produk *in-house.*

Rapat tinjauan Proyek harus dihadiri oleh para peserta dari fungsi terkait sebagaimana tanggung jawabnya masing-masing seperti tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4. Peserta Rapat Tinjauan Proyek

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin dan Penyelenggara Rapat	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek
2	Pemapar Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek / Pimpro
3	Peninjau Aspek Stakeholder	Eselon I/II Fungsi Pemasaran
4	Peninjau Aspek Anggaran	Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran
5	Peninjau Aspek Risiko	Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko
6	Peninjau Aspek Pengadaan	• Eselon I/II Fungsi Operasional Pengadaan • Eselon I/II Fungsi Pengelola Gudang
7	Peninjau Aspek Mutu	Eselon I/II Fungsi Penjaminan Mutu
8	Peninjau Aspek Keuangan	Eselon I/II Fungsi Keuangan
9	Peninjau Aspek Lain Sesuai Kebutuhan*)	Eselon I/II Fungsi Terkait

Struktural yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan definisi pada prosedur ini.

Hasil rapat tinjauan Proyek (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam ***Formulir Risalah Rapat (CFR-022)*** dengan salinannya diserahkan kepada peserta rapat untuk kemudian disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).***

5.4.9 Pemantauan Risiko & implementasi K3L Proyek

Fungsi Pengawasan Proyek bersama Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi K3, dan Fungsi Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi *Project Risk Response* dan K3L yang dilakukan oleh Tim Proyek Pemantauan meliputi penelusuran risiko yang telah diidentifikasi oleh Tim Proyek, evaluasi efektivitas tindakan mitigasi yang diambil Tim Proyek, serta penilaian kepatuhan pelaksanaan Tim Proyek terhadap persyaratan K3L.

Apabila hasil pemantauan risiko dan implementasi K3L menunjukkan adanya risiko atau kondisi K3L yang memerlukan perubahan terhadap rencana yang telah ditetapkan, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

Seluruh proses pemantauan risiko dan K3L mengacu pada ***Prosedur Operasional Pengelolaan Risiko (ROP Series)*** serta ***Prosedur Operasional terkait HSE dan Keamanan (VOP Series).***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.4.10 Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Proyek

Fungsi Pengawasan Proyek memantau proses pengadaan yang dilakukan oleh Fungsi Operasional Pengadaan dan Tim Proyek, sesuai Dokumen Perencanaan Pengadaan *(Procurement Plan)* yang sudah disahkan sebelumnya.

Apabila dalam pemantauan ditemukan potensi penyimpangan terkait pemantauan pengadaan barang/jasa yang memerlukan perubahan, maka Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

Seluruh proses ini mengacu kepada ***Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan (POP Series).***

5.4.11 Pemantauan *Stakeholder Engagement*

Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh Tim Proyek dan Fungsi Pemasaran kepada Stakeholder agar sesuai dengan Dokumen *Stakeholder Engagement Plan* dan *Stakeholder Register* yang telah disahkan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi keterlibatan *Stakeholder* tetap efektif dan sesuai dengan kondisi Proyek.

Berdasarkan hasil pemantauan, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Tim Proyek dan Fungsi Pemasaran untuk melakukan penyesuaian terhadap strategi dan rencana keterlibatan *Stakeholder* melalui pembaruan *Stakeholder Engagement Plan* dan *Stakeholder Register* apabila diperlukan.

Melalui proses ini diharapkan manajemen dapat menjaga atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi keterlibatan *Stakeholder* seiring dengan perkembangan Proyek, perubahan kondisi, serta dinamika kebutuhan dan ekspektasi Stakeholder.

Apabila dalam pemantauan *stakeholder engagement* ini memerlukan adanya perubahan, maka Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan ***Formulir Change Request (BFR-001)***.

Tabel 5. RASCI Matriks Tahap Pengawasan dan Pengendalian

No.	Aktivitas	Accountable (A)	Responsible (R)	Supporting (S)	Consult (C)	Informed (I)
1	Pengawasan dan Pengendalian Proyek (*Monitoring and Controlling Project Work*)	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	• Pimpro • Tim Proyek	• Fungsi Perencanaan Pengadaan • Fungsi Operasional Pengadaan • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

2	Kendali Perubahan Terintegrasi (*Perform Integrated Change Control*)	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	• Pimpro • Tim Proyek • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	Fungsi terkait sesuai jenis perubahan	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor
3	Kontrol dan Validasi Ruang Lingkup Proyek	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	• Pimpro • Tim Proyek • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek • Fungsi Penjaminan Mutu	• Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor
4	Pemantauan Jadwal Proyek	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	• Pimpro • Tim Proyek • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek • Fungsi Perencanaan Pengadaan • Fungsi Operasional Pengadaan	• Fungsi Perencanaan Proyek • Fungsi Manajemen Risiko	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor
5	Pemantauan Biaya Proyek	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	• Pimpro • Fungsi Pengendali Anggaran	• Fungsi Keuangan	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor
6	Pemantauan Mutu Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Penjaminan Mutu	• Pimpro • Tim Proyek • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek • Fungsi Operasional Pengadaan	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	• Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
7	Pemantauan Sumber Daya Proyek	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	• Pimpro • Tim Proyek	• Fungsi Pengembangan Organisasi • Fungsi Rekrutmen	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor
8	Pemantauan Komunikasi Proyek	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	Pimpro	Fungsi Pemasaran	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor
9	Pemantauan Risiko & K3L Proyek	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	Pimpro	• Fungsi Manajemen Risiko • Fungsi K3 • Fungsi Pengelolaan Lingkungan Hidup	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

10	Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Proyek	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	• Pimpro • Tim Proyek • Fungsi Perencanaan Pengadaan • Fungsi Operasional Pengadaan • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	• Struktural Fungsi Operasional Pengadaan • Struktural Fungsi Perencanaan Pengadaan • Fungsi Pengelola Gudang	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Project Sponsor
11	Pemantauan *Stakeholder Engagement*	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	• Fungsi Pengawasan Proyek • Fungsi Pemasaran	Pimpro	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek	• Project Sponsor

5.5 Tahap Penutupan (Closing)

Tahap penutupan Proyek merupakan kegiatan akhir Proyek yang ditandai dengan dikeluarkannya Laporan Akhir Proyek.

Laporan Akhir Proyek berperan penting sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan Proyek dan mencatat setiap pengalaman yang diperoleh selama kegiatan Proyek berlangsung sebagai *lessons learned* untuk Proyek berikutnya di masa yang akan datang.

5.5.1 Proyek Selesai 100%

Penutupan Proyek dikarenakan pekerjaan selesai 100% sesuai ruang lingkup dalam Kontrak, mekanisme penutupan Proyek ini dilakukan dengan mengacu kepada ***Prosedur Penutupan Kode Proyek (FOP-705)***.

5.5.2 Terminasi Proyek

Penutupan Proyek dikarenakan adanya terminasi atau pemutusan Kontrak atas berbagai macam sebab yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Penyelesaian Kontrak karena Perusahaan mengusulkan pengunduran diri kepada Pelanggan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak.
2. Penyelesaian Kontrak dikarenakan Perusahaan mendapatkan sanksi dari Pelanggan karena pelanggaran terkait klausul Kontrak yang mengakibatkan pemutusan Pekerjaan.
3. Penyelesaian Kontrak karena kondisi dan/atau sebab yang tidak bisa dikontrol seperti adanya *force majeur*.

Keputusan penutupan Proyek karena terminasi dilakukan dalam rapat direksi (Radir) dimana Fungsi Pengawasan Proyek membuat laporan terkait penutupan Proyek tersebut.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Mekanisme terminasi Proyek ini dilakukan dengan mengacu kepada ***Prosedur Penutupan Kode Proyek (FOP-705)***.

5.5.3 Pembukaan Kode Purnajual Proyek

Untuk Proyek yang selesai 100% dan dipersyaratkan adanya purnajual dalam Kontrak, dilakukan pembukaan kode Purnajual Proyek dengan mengacu kepada ***Prosedur Pembukaan Kode Proyek/Program/Transfer Load (FOP-700)***.

5.5.4 Pendokumentasian Arsip Proyek

Tim Proyek dipimpin oleh Pimpro mengumpulkan seluruh dokumentasi yang telah dibuat selama kegiatan Proyek berlangsung dalam bentuk *softcopy*.

Proses pengarsipan dokumen mengacu kepada persyaratan dalam ***Formulir Laporan Dokumentasi Proyek (FFR-710)***.

Seluruh hasil kegiatan yang tercatat dalam Prosedur ini baik berbentuk formulir, risalah rapat, klarifikasi, negosiasi maupun dokumen dan rekaman lainnya, disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002)***.

Tabel 6. RASCI Matriks Tahap Penutupan

No.	Aktivitas	Accountable (A)	Responsible (R)	Supporting (S)	Consult (C)	Informed (I)
1	Proyek Selesai 100%	Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek	Pimpro	• Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek • Fungsi Pengendali Anggaran • Fungsi Perencanaan Pengadaan • Fungsi Operasional Pengadan • Fungsi Pemasaran • Fungsi Pengelola Gudang	Fungsi Pengawasan Proyek	• Fungsi Perencanaan Perusahaan • Fungsi Akuntansi • Fungsi Keuangan • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
2	Terminasi Proyek	Direksi / Project Sponsor	• Pimpro • Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	• Tim Proyek • Fungsi Pelaksanaan Proyek • Fungsi Pengawasan Proyek • Fungsi Kontrak Bisnis (bila diperlukan)	• Fungsi Pengendali Anggaran • Fungsi Akuntansi • Fungsi Manajemen Risiko	Seluruh Fungsi Terkait

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3	Pembukaan Kode Purnajual Proyek	Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek	Fungsi Pelaksanaan Proyek	• Fungsi Pengendali Anggaran • Fungsi Perencanaan Pengadaan	Struktural Fungsi Pengawasan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor
4	Pendokumentasian Arsip Proyek	Pimpro	Tim Proyek	• Fungsi Pelaksanaan Proyek • Fungsi Pengelolaan Data • Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek	• Struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek • Struktural Fungsi Pengawasan Proyek • Project Sponsor

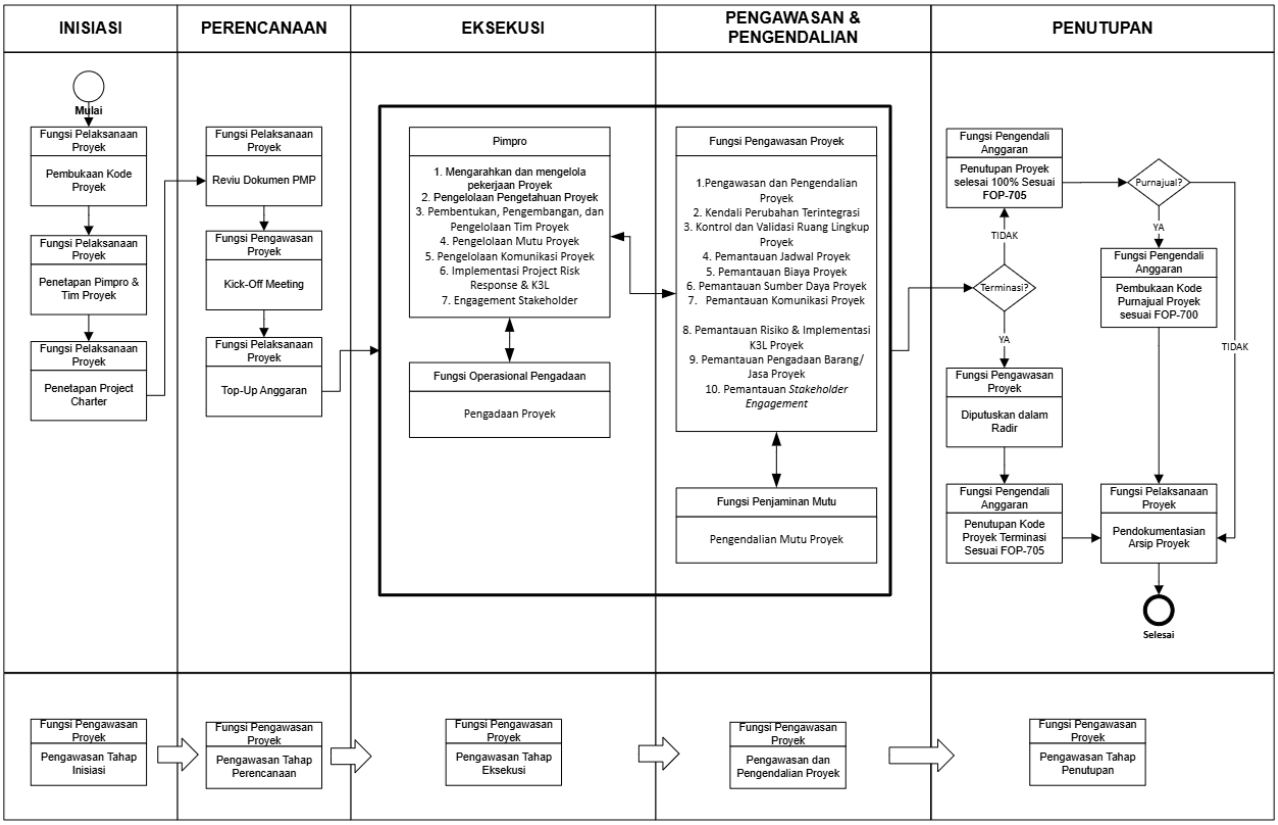
6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***Formulir Changes Request Proyek (BFR-001);***
- ***Formulir Risalah Rapat (CFR-022);***
- ***Formulir Laporan Kemajuan Proyek (FFR-708);***
- ***Formulir Laporan Dokumentasi Proyek (FFR-710);***
- ***Formulir Project Risk Register (RFR-002);***
- ***Formulir Identifikasi dan Penilaian Bahaya Risiko K3 dan Aspek Dampak Lingkungan(VFR-015);***
- ***Template Project Charter (BOT-001).***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.0 ALUR/FLOW



Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN

No.	Bab dan Sub-Bab	Rev.00	Rev.01
	2.0 RUANG LINGKUP	Prosedur ini membahas mengenai tahapan yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan Proyek beserta Tim Proyek dalam mengelola Proyek yang meliputi Tahap Inisiasi, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengendalian, sampai dengan Tahap Penutupan Proyek. Prosedur ini disusun dengan merujuk Standar Sistem Manajemen Proyek ISO 21500 Series, termasuk dalam penentuan definisi nomenklatur yang digunakan.	Prosedur ini membahas mengenai tahapan yang dilaksanakan oleh Pimpinan Proyek (Pimpro) beserta tim dalam mengelola Proyek. Prosedur ini disusun dengan merujuk Standar PMBOK, termasuk dalam penentuan definisi nomenklatur yang digunakan. Dalam Prosedur ini, setiap tahapan hanya dijabarkan secara umum, penjabaran teknis dan lebih rinci untuk pelaksanaan suatu tahapan (jika diperlukan) akan disajikan dalam bentuk panduan atau instruksi kerja terpisah. Tim Proyek dapat memperinci pelaksanaan Prosedur ini sesuai dengan jenis dan karakteristik Proyek serta kebutuhan yang disyaratkan oleh Pelanggan dan peraturan perundang-undangan.
	3.0 DEFINISI		
	Adendum Kontrak	**Adendum Kontrak** adalah perubahan di dalam Kontrak yang terjadi karena adanya usulan dari Pelanggan atau Perusahaan, misal karena adanya perubahan persyaratan dan lingkup pekerjaan.	dihilangkan
	Baseline	tidak ada	***Baseline*** adalah acuan resmi yang telah disetujui sebagai dasar pengukuran dan pengendalian kinerja Proyek.
	Change Control Management (CCM)	tidak ada	***Change Control Management (CCM)*** adalah forum pengendalian perubahan yang bertugas mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap setiap usulan perubahan (*Change Request*) sebelum diputuskan oleh pejabat yang berwenang
	Change Request	tidak ada	***Change Request*** adalah usulan perubahan terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, sumber daya, atau aspek lain dalam pelaksanaan Proyek.
	Control Baseline / Baseline 0	tidak ada	***Control Baseline / Baseline 0*** adalah baseline awal hasil kesepakatan pada *Kick-Off Meeting* yang menjadi dasar komitmen pelaksanaan dan pengendalian Proyek.
	Change Log	tidak ada	***Change Log*** adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat seluruh permintaan perubahan, status evaluasi, keputusan, dan implementasi perubahan dalam Proyek.
	Deliverable	tidak ada	***Deliverable*** adalah hasil kerja, produk, layanan, atau keluaran yang harus diserahkan dalam pelaksanaan Proyek.
	Dokumen Kontrak	Dokumen Kontrak adalah dokumen perikatan antara Pelanggan dan Perusahaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam Dokumen Kontrak berisikan klausul-klausul mengenai perjanjian yang akan dilakukan antara Pelanggan dan Perusahaan.	**Dokumen Kontrak** adalah kumpulan dokumen pendukung Kontrak yang berisikan klausul-klausul mengenai perjanjian yang akan dilakukan antara Pelanggan dan Perusahaan.
	Integrated Change Control	tidak ada	***Integrated Change Control*** adalah proses pengendalian perubahan secara terintegrasi pada Proyek melalui pengkajian dan evaluasi terhadap setiap usulan perubahan untuk memastikan dampaknya terhadap lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, sumber daya, dan kontrak Proyek dapat dikelola secara menyeluruh sebelum perubahan ditetapkan dan dilaksanakan.
	Issue Log	tidak ada	***Issue Log*** adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mengendalikan isu atau permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	Kick-Off Meeting	tidak ada	**Kick-Off Meeting** adalah rapat resmi yang diselenggarakan setelah proses reviu dan pendetailan Dokumen Project Management Plan (PMP) selesai, yang dipimpin oleh Fungsi Pengawasan Proyek untuk memaparkan hasil perencanaan Proyek kepada seluruh fungsi terkait, menyelaraskan pemahaman, peran, tanggung jawab, dan komitmen pelaksanaan Proyek.
	Kode Proyek	tidak ada	**Kode Proyek** adalah rangkaian karakter unik yang diberikan kepada sebuah Proyek untuk tujuan identifikasi, pelacakan, dan pengarsipan dalam sistem manajemen organisasi.
	Kontrak	Kontrak adalah persyaratan yang secara resmi telah disetujui oleh Perusahaan dan Pelanggan. Kontrak dapat berupa *purchase order* (PO), surat perintah kerja (SPK), *confirmation order* atau surat perjanjian yang telah disetujui dan telah mendapat kesepakatan antara Pelanggan dengan Perusahaan	**Kontrak** adalah perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara Perusahaan dengan Pelanggan atau pihak lain yang memuat ruang lingkup pekerjaan, nilai, hak, kewajiban, jadwal, serta syarat dan ketentuan pelaksanaan pekerjaan.
	Sirkuler	Sirkuler adalah dokumen yang dikirimkan kepada beberapa orang di beberapa fungsi untuk menyampaikan pesan untuk diperiksa agar disetujui dan/atau diparaf dan/atau ditandatangani.	dihilangkan
	Lessons Learned	tidak ada	***Lessons Learned*** adalah pengetahuan, pengalaman, atau pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan Proyek yang dapat digunakan sebagai referensi untuk peningkatan Proyek yang sedang berjalan dan atau untuk Proyek berikutnya.
	Standar ISO Sistem Manajemen Proyek	Standar ISO Sistem Manajemen Proyek adalah rangkaian dokumen standar dalam bidang sistem manajemen Proyek yang diterbitkan oleh ISO (International Organization for Standardization/ Organisasi Internasional untuk Standardisasi), yaitu ISO 21500.	dihilangkan
	Tim Tender	Tim Tender adalah sekumpulan orang dari berbagai fungsi terkait yang melaksanakan kegiatan pra Proyek dan bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan yang ditugaskan beserta hasil kerja yang diharapkan.	dihilangkan
	Manajemen Proyek	tidak ada	**Manajemen Proyek** adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menyelesaikan Proyek sesuai sasaran ruang lingkup, biaya, mutu, dan waktu
	Pelanggan	tidak ada	**Pelanggan** adalah pihak (Perusahaan atau lembaga atau organisasi; internal atau eksternal) yang memberikan Proyek dan akan membayar atas produk, jasa, atau hasil kerja dari Proyek tersebut.
	Project Charter	tidak ada	***Project Charter*** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sponsor Proyek atau manajemen tingkat atas yang secara formal mengesahkan keberadaan sebuah Proyek. Dokumen ini memberikan wewenang kepada Pimpro untuk menggunakan sumber daya organisasi guna melaksanakan aktivitas Proyek.
	Project Sponsor	tidak ada	**Project Sponsor** adalah pejabat atau pihak yang ditunjuk oleh organisasi untuk mewakili kepentingan bisnis atas suatu Proyek, yang bertanggung jawab memberikan arahan strategis, menyetujui ruang lingkup, anggaran, dan perubahan signifikan, memastikan tersedianya sumber daya, serta mengambil keputusan strategis yang diperlukan agar Proyek mencapai tujuan, manfaat, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	Pimpinan Proyek	tidak ada	**Pimpinan Proyek** selanjutnya disebut Pimpro adalah seseorang yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab penuh kepada Perusahaan atas pelaksanaan dan penyelesaian Proyek dalam ruang lingkup yang ditentukan beserta pencapaian tujuan dan sasaran sesuai harapan Pelanggan serta persyaratan jadwal, anggaran, dan mutu yang ditentukan dengan cara memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengambil keputusan dan mengendalikan sumber daya yang ada.
	Project Management Plan	tidak ada	***Project Management Plan*** adalah dokumen utama yang menjelaskan bagaimana Proyek direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dan dikendalikan.
	Project Schedule Baseline	tidak ada	***Project Schedule Baseline*** adalah jadwal Proyek yang telah disetujui dan digunakan sebagai dasar pengukuran serta pengendalian kinerja waktu Proyek.
	Project Stakeholder Register	tidak ada	***Project Stakeholder Register*** adalah dokumen yang berisi identifikasi, klasifikasi, kebutuhan, pengaruh, dan strategi pendekatan terhadap *Stakeholder* Proyek
	Proyek	Proyek adalah upaya yang bersifat sementara untuk mencapai satu atau lebih tujuan.	**Proyek** adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat sementara, terencana, dan terkoordinasi untuk menghasilkan produk, jasa, atau hasil tertentu dengan ruang lingkup, waktu, biaya, mutu, dan sumber daya yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Perusahaan atau Pelanggan
	Quality Metrics	tidak ada	***Quality Metrics*** adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai dan mengendalikan pencapaian mutu dalam pelaksanaan Proyek.
	RASCI Matrix	tidak ada	RASCI Matrix merupakan alat manajemen proyek yang digunakan untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab dalam suatu proyek atau proses. Penjelasan RASCI adalah sebagai berikut : • Responsible (Bertanggung jawab): Orang atau tim yang melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan tugas atau membuat keputusan. Mereka yang melaksanakan tugas secara langsung. • Accountable (Bertanggung jawab secara akhir): Orang yang memiliki tanggung jawab akhir untuk hasil dari tugas atau keputusan. Hanya boleh ada satu orang yang accountable untuk setiap tugas agar tidak ada kebingungan. • **Supporting** (mendukung): Fungsi atau pihak pendukung yang membantu *Responsible* dalam menyelesaikan tugas. • **Consulted** (Dikonsultasikan): Orang atau pihak yang memberikan masukan atau informasi selama pelaksanaan tugas. Mereka biasanya terlibat dalam diskusi atau konsultasi, tetapi tidak melakukan pekerjaan langsung. • **Informed** (Diberi Informasi): Orang atau pihak yang perlu mendapatkan informasi tentang kemajuan atau hasil dari tugas, tetapi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaannya.
	Rekanan	tidak ada	**Rekanan** adalah entitas eksternal yang terikat Kontrak untuk menyediakan komponen atau layanan yang diperlukan untuk menyelesaikan Proyek.
	Risk Register	tidak ada	***Risk Register*** adalah dokumen yang berisi daftar risiko Proyek, tingkat risiko, penyebab, dampak, pemilik risiko, serta rencana mitigasi dan tindak lanjutnya.
	Scope Baseline	tidak ada	***Scope Baseline*** adalah acuan ruang lingkup Proyek yang telah disetujui dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan serta pengendalian ruang lingkup Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	Scope Creep	tidak ada	***Scope Creep*** adalah perluasan ruang lingkup Proyek yang tidak terkendali tanpa adanya penyesuaian terhadap waktu, biaya, dan sumber daya. Scope Creep umumnya terjadi akibat perubahan kebutuhan atau penambahan pekerjaan yang tidak melalui proses integrated change control, sehingga berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Proyek.
	Stakeholder	tidak ada	***Stakeholder*** adalah individu, kelompok, atau organisasi yang dapat mempengaruhi, dipengaruhi, atau memiliki kepentingan terhadap Proyek.
	Stakeholder Engagement Plan	tidak ada	***Stakeholder Engagement Plan*** adalah dokumen yang menetapkan strategi, pendekatan, dan tindakan untuk melibatkan Stakeholder secara efektif sepanjang pelaksanaan Proyek guna mendukung pencapaian tujuan Proyek.
	Stakeholder Register	tidak ada	***Stakeholder Register*** adalah dokumen Proyek yang memuat daftar Stakeholder beserta informasi mengenai identitas, peran, kepentingan, pengaruh, kebutuhan, ekspektasi, dan karakteristik lainnya yang digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan keterlibatan Stakeholder selama Proyek berlangsung.
	Standar PMBOK	tidak ada	**Standar PMBOK** adalah standar global dan kumpulan praktik terbaik dalam manajemen Proyek yang diterbitkan oleh Project Management Institute (PMI).
	Sumber Daya Proyek	tidak ada	**Sumber Daya Proyek** adalah sumber daya tim (*team resources*) dan sumber daya fisik (*physical resources*) yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek.
	Terminasi Proyek	tidak ada	**Terminasi Proyek** adalah proses penghentian secara formal terhadap pelaksanaan Proyek sebelum seluruh ruang lingkup pekerjaan selesai sepenuhnya, berdasarkan keputusan Perusahaan dan/atau Pelanggan sesuai ketentuan Kontrak, dengan melaksanakan penyelesaian administratif, teknis, finansial, dan dokumentasi Proyek sesuai persyaratan yang berlaku.
	Tim Proyek	tidak ada	**Tim Proyek** adalah sekumpulan orang dari berbagai fungsi terkait yang dipimpin oleh Pimpinan Proyek (Pimpro) untuk melaksanakan kegiatan Proyek dan bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan yang ditugaskan beserta hasil kerja yang diharapkan.
	Tinjauan Kontrak	tidak ada	**Tinjauan Kontrak** adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meninjau seluruh persyaratan dan lingkup pekerjaan di dalam draft Kontrak. Tinjauan Kontrak juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Kontrak.
	Top Up Anggaran	tidak ada	**Top Up Anggaran** adalah Pengajuan pembukaan mata anggaran terhadap mata Anggaran yang belum di input ke dalam sistem ERP.
	Work Breakdown Structure (WBS)	tidak ada	**WBS** adalah dekomposisi hierarkis dari total ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh tim Proyek untuk mencapai tujuan Proyek dan menghasilkan penyerahan (*deliverables*) yang diperlukan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	4.0 DOKUMEN TERKAIT	• *Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002)* • *Prosedur Audit Internal Sistem Manajemen (COP-004)* • *Prosedur Pengendalian Desain (EOP-300)* • *Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700)* • *Prosedur Penutupan Kode Proyek/Program (FOP-705)* • *Standar ISO Sistem Manajemen Proyek (ISO 21500 Series)* • *Prosedur Operasional Pengadaan (POP series)* • *Prosedur Pengendalian Alat Ukur dan Pantau (QOP-814)* • *Prosedur Kajian Risiko Proyek (ROP-911)* • *Prosedur Penanganan Peluang & Order Bisnis (SOP-001)* • *Prosedur Penanganan Kontrak (SOP-004)* • *Prosedur Barang Persediaan Proyek (WOP-207)*	• *Peraturan Direksi Nomor : 001/PERDIR-MSM001/DU/I/2026 tentang Pedoman Sistem Manajemen Mutu, K3 dan Lingkungan PT Len Industri (Persero);* • *Surat Keputusan Direksi Nomor : 001/SKEP.HC/DU/I/2026 tentang Struktur Organisasi PT Len Industri (Persero) beserta Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi;* • *Nota Nomor : 021/N/UQ/VIII/2026 tentang Pembaruan Pemetaan Fungsi Generik Terhadap Unit Aktual;* • *Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002);* • *Prosedur Pembukaan Kode Proyek/Program/Transfer Load (FOP-700);* • *Prosedur Penutupan Kode Proyek/Program/Transfer Load (FOP-705);* • *Prosedur Pemilihan dan Evaluasi Pimpinan Proyek (HOP-609);* • *Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan (POP Series);* • *Prosedur Audit Internal (QOP-803);* • *Prosedur Pengendalian Alat Ukur dan Pantau (QOP-814);* • *Prosedur Kajian Risiko Proyek (ROP-911);* • *Prosedur Operasional Pengelolaan Risiko (ROP Series);* • *Prosedur Penanganan Peluang dan Order Bisnis (SOP-001);* • *Prosedur Penanganan Kontrak (SOP-004);* • *Prosedur Penanganan Adendum Kontrak (SOP-009);* • *Prosedur Operasional terkait HSE dan Keamanan (VOP Series);* • *Prosedur Barang Persediaan Proyek (WOP-207);* • *Panduan Mutu Proyek (QOG-001);* • *Panduan Perencanaan Mutu (QOG-002);*
	5.0 PROSEDUR	Sesuai Standar ISO Sistem Manajemen Proyek, kegiatan di dalam suatu Proyek dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu: a. Tahap Inisiasi (*Initiating*); b. Tahap Perencanaan (*Planning*); c. Tahap Pelaksanaan (*Implementing*); d. Tahap Pengendalian (*Controlling*); e. Tahap Penutupan (*Closing*).	Sesuai Standar PMBOK, kegiatan di dalam suatu Proyek dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu: a. Tahap Inisiasi (Initiating); b. Tahap Perencanaan (Planning); c. Tahap Eksekusi (Executing); d. Tahap Pengawasan dan Pengendalian (Monitoring and Controlling); e. Tahap Penutupan (Closing). Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dalam prosedur ini guna memastikan pelaksanaan Proyek berjalan sesuai rencana, ketentuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Fungsi Penjaminan Mutu melakukan kegiatan pengawasan dalam bidang mutu Proyek sejak dari tahap inisiasi sampai penutupan Proyek mengacu pada dokumen petunjuk teknis terkait mutu Proyek.
	5.1 Tahap Inisiasi (*initiating*)	Tahap ini mencakup pembukaan kode Proyek, penetapan organisasi Proyek, mobilisasi Tim Proyek serta identifikasi stakeholder sesuai tata kelola Perusahaan untuk memastikan justifikasi manfaat Proyek bagi Perusahaan. Proses bisnis terkait upaya mendapatkan Dokumen Kontrak merupakan tahap Pra-Proyek sehingga bukan bagian dari tahap inisiasi.	Tahap inisiasi Proyek merupakan kegiatan awal Proyek setelah ditandatanganinya Dokumen Kontrak antara Pelanggan dengan Perusahaan, tahap inisiasi Proyek ini bertujuan untuk menyelaraskan harapan Stakeholder dengan tujuan Proyek. Proses utama dalam tahap inisiasi Proyek adalah sebagai berikut : 1. Pembukaan Kode dan Penentuan Kelas Proyek 2. Penunjukan Pimpinan Proyek dan Penyusunan Tim Proyek 3. Penetapan Project Charter

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.1.1 Pembukaan Kode Proyek	Fungsi Manajemen Proyek mengajukan Nota pembukaan kode Proyek/program sesuai dengan Prosedur ***Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700)***. Pembukaan kode Proyek dilakukan setelah Tinjauan Kontrak Go selesai dilaksanakan dengan menggunakan formulir ***Pengajuan Kode Kegiatan (FFR-706)*** dan formulir ***Syarat-Syarat Dokumen Pengajuan Pembukaan Kode Proyek/Program (FLP-001)***.	Pembukaan Kode Proyek dilakukan setelah dokumen PMP yang dikoordinasikan oleh Fungsi Perencanaan Proyek diserahterimakan kepada Fungsi Pelaksanaan Proyek sesuai Prosedur Penanganan Kontrak (SOP-004). Selanjutnya, dilakukan Pembukaan Kode Proyek dengan mengacu kepada Prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program/Transfer Load (FOP-700).
	5.1.2 Penetapan Pimpro dan Tim Proyek	Fungsi Manajemen Proyek membuat nota calon Pimpro untuk disetujui oleh direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Proyek, nota ini dilengkapi dengan formulir ***Penilaian Kelas Proyek/Pimpinan Proyek (SFR-022)*** yang sudah diproses sebelumnya pada tahap Prosedur ***Penanganan Kontrak (SOP-004).***	Fungsi Pelaksanaan Proyek melakukan penetapan Pimpro dengan mengacu kepada Prosedur Pemilihan dan Evaluasi Pimpinan Proyek (HOP-609). Fungsi Pelaksanaan Proyek menyusun, menetapkan, dan memobilisasi Tim Proyek untuk menangani Proyek, disesuaikan dengan peraturan internal Perusahaan mengenai klasifikasi Proyek, struktur organisasi dan persyaratan dari Pelanggan. Penetapan Tim Proyek (khususnya tim inti Proyek) dilakukan bersama dengan penetapan Pimpro dan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pembukaan Kode Proyek
	5.1.3 Penetapan Project Charter	Tidak ada	Fungsi Pelaksanaan Proyek melakukan penyusunan dan penetapan Project Charter dengan menggunakan Template Project Charter (BOT-001) berdasarkan pada dokumen PMP yang telah diterima
	Tabel 1 RASCI Matriks Tahap Inisiasi	Tidak ada	Ada
	5.2 Tahap Perencanaan (*Planning*)	Tahap perencanaan merupakan kegiatan awal setelah Tim Proyek terbentuk, tahap ini mencakup serah terima dokumen perencanaan Proyek (*Project Planning Handover*) dan rapat perdana (*Kick off Meeting*) Proyek.	Tahap perencanaan Proyek merupakan kegiatan awal setelah tahap inisiasi selesai, terdiri dari beberapa proses untuk mendetailkan ruang lingkup Proyek, mendefinisikan dan menyempurnakan tujuan, serta mengembangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan Proyek
	5.2.2 Reviu Dokumen PMP	tidak ada	Tim Proyek dengan melibatkan seluruh fungsi yang terkait pada tahap praproyek melakukan proses reviu untuk memeriksa, memperbaiki, dan melengkapi dokumen PMP. Dalam proses reviu ini, Tim Proyek bersama dengan seluruh fungsi terkait melakukan pendefinisian ulang aktivitas pengelolaan Proyek yang ada di dalam PMP, meliputi : 1. Manajemen Ruang Lingkup Proyek; 2. Manajemen Jadwal Proyek; 3. Manajemen Biaya Proyek; 4. Manajemen Mutu Proyek; 5. Manajemen Sumber Daya Proyek; 6. Manajemen Komunikasi Proyek; 7. Manajemen Risiko & K3L Proyek; 8. Manajemen Pengadaan Proyek; 9. Manajemen Stakeholder Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.2.1.1 Manajemen Ruang Lingkup Proyek	tidak ada	Manajemen ruang lingkup Proyek menjelaskan bagaimana lingkup Proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikendalikan, sehingga dapat memberikan panduan tentang bagaimana lingkup Proyek akan dikelola dan didokumentasikan pada saat tahap eksekusi proyek dimulai. Tim Proyek bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Pemasaran, dan Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen ruang lingkup yang ada dalam dokumen PMP. Proses ini menghasilkan keluaran (output) Dokumen Acuan Ruang Lingkup (Scope Baseline) yang secara keseluruhan dapat berupa namun tidak terbatas pada: • Dokumen Rencana Struktur Rincian Kerja/ Work Breakdown Structure Plan (WBS Plan); • Dokumen Daftar Requirement Proyek dan Produk; • Requirements Management Plan; • Project Scope Statement (dokumen yang mencantumkan lingkup yang dikerjakan dan lingkup yang tidak dikerjakan sehingga mencegah Scope Creep; • Daftar asumsi (assumption logs); • Kesepahaman antar Stakeholder termasuk namun tidak terbatas pada Daftar Persyaratan Dokumen Kontrak/ Contract Document Requirement List (CDRL).
	5.2.1.2 Manajemen Jadwal Proyek	tidak ada	Manajemen jadwal Proyek merupakan proses pendefinisian, pendetailan, dan penetapan rencana waktu atau jadwal pada setiap rincian kerja sesuai dengan harapan dan tujuan Proyek, sehingga dapat memberikan panduan tentang bagaimana jadwal akan dikelola dan dikendalikan sepanjang waktu pelaksanaan Proyek. Tim Proyek Bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Pemasaran, dan Fungsi Perencanaan Pengadaan melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen jadwal Proyek yang ada dalam dokumen PMP. Proses ini menghasilkan keluaran (output) Dokumen Rencana Manajemen Jadwal Proyek (Project Schedule Management Plan) yang secara keseluruhan dapat berupa: • Daftar Kegiatan (Activity List); • Estimasi Durasi; dan • Acuan Jadwal Proyek (Project Schedule Baseline).
	5.2.1.3 Manajemen Biaya Proyek	tidak ada	Manajemen biaya Proyek menjelaskan bagaimana biaya Proyek akan diestimasi, dianggarkan, dikelola, diawasi, dan dikendalikan, sehingga dapat memberikan panduan tentang bagaimana biaya Proyek akan dikelola sepanjang waktu pelaksanaan Proyek. Tim Proyek Bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Pengendali Anggaran dan Fungsi Keuangan melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen biaya Proyek yang ada dalam dokumen PMP. Proses ini menghasilkan keluaran (output) berupa Project Income Statement (PIS) yang didalamnya mencakup Rencana Arus Kas Proyek (Cash Flow), dan Rencana Pendanaan/Pembiayaan Proyek.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.2.1.4 Manajemen Mutu Proyek	tidak ada	Manajemen mutu Proyek merupakan proses mengidentifikasi persyaratan dan/atau standar mutu untuk Proyek dan hasil yang seharusnya diperoleh, serta mendokumentasikan bagaimana Proyek akan menunjukkan kepatuhan terhadap persyaratan dan/atau standar mutu sehingga dapat memberikan panduan tentang bagaimana mutu akan dikelola dan diverifikasi sepanjang waktu pelaksanaan Proyek. Proses ini mengacu kepada Panduan Perencanaan Mutu (QOG-002). Tim Proyek bersama dengan Fungsi Penjaminan Mutu melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen mutu Proyek yang ada dalam dokumen PMP. Proses ini menghasilkan keluaran (output) matriks mutu (quality metrics) yang secara keseluruhan dapat berupa Dokumen Rencana Manajemen Kualitas (Quality Management Plan).
	5.2.1.5 Manajemen Sumber Daya Proyek	tidak ada	Manajemen sumber daya Proyek merupakan proses mendefinisikan, memperkirakan, memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya fisik dan Tim Proyek, sehingga dapat menetapkan pendekatan yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya Proyek berdasarkan jenis dan kompleksitas Proyek sepanjang waktu pelaksanaan Proyek. Tim Proyek bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Rekrutmen, dan Fungsi Rekayasa Solusi Teknis Proyek melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen sumber daya Proyek yang ada dalam dokumen PMP. Proses ini menghasilkan keluaran (output) Dokumen Rencana Manajemen Sumber Daya Proyek (Resource Management Plan) yang secara keseluruhan dapat berupa : • Dokumen Rencana Kebutuhan Sumber Daya, • Dokumen Rencana Struktur Organisasi Proyek, • Team Charter (didalamnya termasuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi), decision making process, escalation path).
	5.2.1.6 Manajemen Komunikasi Proyek	tidak ada	Manajemen komunikasi Proyek menjelaskan rencana komunikasi Proyek berdasarkan kebutuhan informasi setiap Stakeholder dan kebutuhan Proyek, sehingga dapat melakukan pendekatan secara komprehensif untuk melibatkan Stakeholder secara efektif dan efisien dengan menyajikan informasi yang relevan serta tepat waktu. Tim Proyek bersama Fungsi Pemasaran melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen komunikasi Proyek yang ada dalam dokumen PMP. Proses ini menghasilkan keluaran (output) berupa Dokumen Matriks Rencana Komunikasi Internal/Eksternal (Internal/External Communication Matrix Plan) dengan kerangka minimal yang mencakup hal-hal ssebagai berikut : - Prinsip komunikasi - Struktur komunikasi - Frekuensi komunikasi - Media komunikasi - Alur komunikasi - Project Dashboard



Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.2.1.7 Manajemen Risiko & K3L Proyek	tidak ada	Perencanaan Manajemen Risiko dan K3L Proyek disusun untuk menetapkan pendekatan, metode, peran dan tanggung jawab, serta mekanisme pengelolaan risiko dan K3L yang akan diterapkan selama siklus hidup Proyek. Tim Proyek bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi K3, dan Fungsi Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan reviu dan pendetailan terhadap aspek manajemen risiko dan K3L yang telah ditetapkan dalam dokumen PMP. Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko, tindakan mitigasi, pengendalian K3L, serta kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan tingkat risiko Proyek. Proses ini menghasilkan Dokumen Rencana Manajemen Risiko Proyek (Project Risk Management Plan) dan Dokumen Rencana HSE (HSE Plan) sebagai acuan pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian risiko serta K3L selama pelaksanaan Proyek.
	5.2.1.8 Manajemen Pengadaan Proyek	tidak ada	Manajemen pengadaan Proyek merupakan proses perencanaan kebutuhan pengadaan barang/jasa Proyek, menentukan pendekatan atau metode pengadaan, manajemen pergudangan/penyimpanan, manajemen distribusi, pengiriman, dan manajemen imporekspor, sehingga pada proses ini dapat menentukan apakah akan memperoleh barang dan jasa tersebut dari luar Proyek dan, jika demikian, apa yang akan diperoleh serta bagaimana dan kapan memperolehnya (Make or Buy Decision), serta dapat menjadi panduan tentang bagaimana proses pengadaan akan dikelola sepanjang waktu pelaksanaan Proyek. Tim Proyek bersama Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Pemasaran, dan Fungsi Perencanaan Pengadaan melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen pengadaan Proyek yang ada dalam dokumen PMP. Proses ini menghasilkan keluaran (output) berupa Dokumen Perencanaan Pengadaan (Procurement Plan).
	5.2.1.9 Manajemen *Stakeholder* Proyek	tidak ada	Manajemen Stakeholder Proyek merupakan proses perencanaan dan pengembangan pendekatan untuk melibatkan Stakeholder Proyek berdasarkan kebutuhan, harapan, kepentingan, dan potensi dampak mereka terhadap Proyek, sehingga dapat memberikan rencana yang dapat ditindaklanjuti untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan secara efektif, dan dapat menjadi panduan tentang bagaimana proses pendekatan kepada pemangku kepentingan akan dikelola sepanjang waktu pelaksanaan Proyek. Tim Proyek bersama Fungsi Pemasaran melakukan reviu dan pendetailan terhadap manajemen Stakeholder Proyek yang ada dalam dokumen PMP. Proses ini menghasilkan keluaran (output) berupa Dokumen Rencana Pendekatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan.
	Tabel 2. RASCI Matriks Reviu Dokumen PMP	Tidak ada	ada

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.2.2 *Kick of Meeting*	Fungsi Pengawasan Proyek memimpin dan menyelenggarakan rapat perdana (Kick off Meeting) yang dihadiri oleh berbagai fungsi seperti pada tabel 2 berikut : Tabel 2. Peserta Rapat Perdana  Struktural yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada pasal 3.6 Dalam rapat perdana ini Tim Proyek memaparkan dokumen perencanaan Proyek yang telah diperiksa, diperbaiki, dan dilengkapi untuk ditinjau oleh peserta rapat. Kemudian rapat perdana menetapkan dokumen perencanaan Proyek dan hasil tinjauan tersebut sebagai Control Baseline (Baseline 0) yang menjadi komitmen awal dari Tim Proyek dan komitmen dukungan dari segenap fungsi pendukung proyek. Hasil rapat perdana (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir Risalah Rapat (CFR-022) yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan salinannya diserahkan kepada peserta rapat, disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).	Setelah proses reviu dan pendetailan dokumen PMP selesai, selanjutnya Fungsi Pengawasan Proyek memimpin dan menyelenggarakan Kick-Off Meeting yang dihadiri oleh peserta sesuai tabel berikut : *Tabel 2. Peserta Kick-Off Meeting*  Struktural yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan definisi pada prosedur ini. Dalam Kick-Off Meeting ini Tim Proyek memaparkan dokumen PMP yang telah direviu, diperbaiki, dan dilengkapi kepada peserta rapat. Hasil Kick-Off Meeting ini dicatat dalam Formulir Risalah Rapat (CFR-022) dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada unit kerja terkait sesuai tabel peserta Kick-Off Meeting. Kick-Off Meeting ini selanjutnya ditetapkan sebagai Control Baseline / Baseline 0 yang menjadi komitmen awal dari Fungsi Pelaksanaan Proyek dan komitmen dukungan dari segenap fungsi lainnya.
	5.2.3 Top Up Anggaran Proyek	tidak ada	Fungsi Pelaksanaan Proyek bersama Fungsi Pengawasan Proyek melaksanakan Top Up Anggaran Proyek secara berkala, petunjuk teknis terkait Top Up Anggaran ini mengacu kepada panduan terpisah.
	5.3 Tahap Pelaksanaan (*Implementing*)	Pimpinan Proyek (pimpro) didukung oleh struktural Fungsi Manajemen Proyek bertanggung jawab untuk memastikan tahap pelaksanaan Proyek ini berjalan sesuai dengan dokumen perencanaan Proyek yang telah ditetapkan pada saat rapat perdana	dihilangkan
	5.3 Tahap Eksekusi Proyek (Executing)	tidak ada	Tahap Eksekusi Proyek (executing) terdiri dari proses-proses yang dilakukan untuk menyelesaikan Pekerjaan yang telah disepakati dan ditetapkan pada tahap perencanaan (planning) guna menghasilkan keluaran (deliverable) yang memenuhi persyaratan Proyek. Pimpro didukung oleh pejabat struktural Fungsi Pelaksanaan Proyek bertanggungjawab untuk mengelola dan menjalankan Proyek serta memastikan tahap eksekusi Proyek ini berjalan sesuai dengan dokumen PMP yang telah ditetapkan pada saat Kick-Off Meeting.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.3.1 Mengarahkan dan Mengelola Pekerjaan Proyek	tidak ada	Pimpro bertanggungjawab dalam memimpin, mengarahkan, mengelola dan mengendalikan kegiatan Tim Proyek dalam menjalankan pekerjaan Proyek mulai dari eksekusi Project Management Plan, koordinasi sumber daya, pengelolaan perubahan (change management) yang telah disetujui, hingga pengumpulan data progress kinerja proyek. Selama Proyek berlangsung, Pimpro mengoordinasikan sumber daya Proyek yang terdiri dari Tim Proyek, peralatan, material, dan sumber daya lainnya secara efektif. Koordinasi ini dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pekerjaan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga menghasilkan keluaran (deliverable) yang memenuhi kriteria penerimaan pelanggan.....dst
	5.3.2 Pengelolaan Pengetahuan Proyek	tidak ada	Pimpro bertanggung jawab untuk menggunakan informasi mengenai lesson learned yang relevan dari Proyek sebelumnya untuk memudahkan pengambilan keputusan dan mencegah tim mengulang kesalahan yang sama. Selama Proyek berlangsung Pimpro juga bertanggungjawab untuk: • mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mendokumentasikan setiap lesson learned yang terjadi selama Proyek berlangsung; • memfasilitasi dan mendorong proses diskusi Tim Proyek secara rutin dengan tujuan untuk sharing knowledge, serta diskusi analisis tindak lanjut pemecahan masalah/isu Proyek yang dapat dijadikan lesson learned baru. Lesson learned tersebut didokumentasikan ke dalam Dokumen Project Lessons Learn Register.
	5.3.3 Proses Penerimaan Barang/Jasa	Setelah proses pengadaan dilaksanakan, diperlukan adanya proses penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk Proyek. Mekanisme penerimaan barang/jasa Proyek ini mengacu pada Prosedur ***Barang Persediaan Proyek (WOP-207)***.	dihilangkan
	5.3.3 Pembentukan, Pengembangan, dan Pengelolaan Tim Proyek	tidak ada	Pimpro melakukan proses rekrutmen anggota tim, yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan Proyek sesuai Dokumen Rencana Manajemen Sumber Daya Proyek (Resource Management Plan), sehingga dalam pelaksanaan Proyek terdapat panduan untuk melakukan pemilihan sumber daya serta menugaskannya kedalam aktivitas masing-masing. Pimpro bersama Fungsi Rekrutmen menyusun Dokumen Rekrutmen Tim Proyek (jika diperlukan sesuai rencana), Dokumen assignment anggota Tim Proyek (termasuk pembagian job description, periodic task & KPI dalam struktur organisasi Proyek), serta Dokumen Reviu Kinerja Karyawan Proyek sesuai dengan peraturan internal Perusahaan. Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pembentukan, pengembangan dan pengelolaan Tim Proyek menggunakan Formulir Change Request (BFR-001) apabila dibutuhkan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.3.4 Proses Instalasi	Apabila dalam pelaksanaan Proyek menggunakan alat ukur, maka Pimpro harus mendata semua alat ukur yang digunakan dan memastikan alat ukur tersebut dalam keadaan terkalibrasi. Mekanisme pengendalian dan pengelolaan alat ukur ini mengacu pada Prosedur ***Pengendalian Alat Ukur dan Pantau (QOP-814)***.....dst	Dihilangkan
	5.3.4 Pengelolaan Mutu Proyek	tidak ada	Tim Proyek menerjemahkan rencana manajemen mutu Proyek sesuai Dokumen Rencana Manajemen Mutu (Quality Management Plan) ke dalam aktivitas mutu yang dapat dieksekusi dalam Proyek. Pelaksanaan aktivitas proyek oleh Tim Proyek juga mengacu pada Panduan Mutu Proyek (QOG-001) untuk meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan mutu, serta mengidentifikasi proses yang tidak efektif dan menjadi penyebab mutu yang buruk. Tim Proyek juga bertanggung jawab dalam membuat dan melakukan update terhadap Dokumen Laporan Mutu Proyek (Project Quality Report) serta membuat dan melakukan pengarsipan Dokumen Evaluasi dan Pengujian Proyek (Project Test And Evaluation). Pimpro bertanggung jawab dalam memastikan implementasi rencana mutu oleh Tim Proyek, mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu (quality assurance) dengan Fungsi Penjaminan Mutu, serta menindaklanjuti ketidaksesuaian terkait mutu. Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pengelolaan mutu Proyek menggunakan Formulir Change Request (BFR-001) apabila dibutuhkan.
	5.3.5 *Test and Commisioning*	Setelah instalasi selesai dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah Tim Proyek melakukan proses *test and commisioning* internal. Item pengujian ini mengacu pada persyaratan Pelanggan. Selanjutnya hasil dari *test and commisioning* internal divalidasi oleh Fungsi Penjaminan Mutu. Setelah proses pengujian internal divalidasi oleh Fungsi Penjaminan Mutu, selanjutnya Tim Proyek dapat mengajukan dilaksanakannya pengujian oleh Pelanggan, regulator atau pihak ketiga yang independen sesuai yang disyaratkan dalam Dokumen Kontrak. Mekanisme test and commisioning mengacu pada metode pelaksanaan Proyek, inspection & test plan, atau dokumen lain sejenisnya sesuai dengan karakteristik masing-masing Proyek.	Dihilangkan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.3.5 Pengelolaan Komunikasi Proyek	tidak ada	Tim Proyek bersama Fungsi Pemasaran melakukan proses pengelolaan informasi Proyek sesuai Dokumen Matriks Rencana Komunikasi Internal/Eksternal (Internal/External Communication Matrix Plan), termasuk namun tidak terbatas pada pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, dan pengawasan informasi akhir Proyek secara tepat waktu dengan aman. Dengan kolaborasi yang baik diharapkan aliran informasi pelaksanaan Proyek dapat tersampaikan kepada Stakeholder dengan efektif dan efisien. Proses ini menghasilkan keluaran (output) berupa Formulir Risalah Rapat (CFR-022), laporan, presentasi, project information radiator, standarisasi pelaporan, dan lain sebagainya. Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pengelolaan komunikasi Proyek menggunakan Formulir Change Request (BFR-001) apabila dibutuhkan
	5.3.6 Proses Penagihan	Proses penagihan terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penagihan uang muka, penagihan termin, penagihan pelunasan maupun penagihan retensi (apabila diperlukan). Mekanisme proses penagihan ini diatur lebih lanjut dalam suatu dokumen petunjuk teknis tersendiri.	Dihilangkan
	5.3.6 Impelmentasi *Risk Response*	tidak ada	Tim Proyek melaksanakan implementasi Project Risk Response dan K3L sesuai .Dokumen Rencana Manajemen Risiko Proyek (Project Risk Management Plan) dan Dokumen Rencana HSE (HSE Plan) yang telah disahkan. Implementasi tersebut bertujuan untuk memastikan tindakan mitigasi risiko dan pengendalian K3L dilaksanakan secara efektif sehingga potensi dampak negatif terhadap sasaran Proyek dapat diminimalkan serta peluang yang memberikan manfaat bagi Proyek dapat dioptimalkan.....dst
	5.3.7 Pengadaan Proyek	tidak ada	Fungsi Operasional Pengadaan melakukan proses perolehan dan pemilihan rekanan untuk memenuhi seluruh kebutuhan Proyek sesuai Dokumen Perencanaan Pengadaan Proyek (Project Procurement Plan) mengacu kepada Prosedur Pengadaan barang dan Jasa (POP Series). Pada saat pelaksanaan Proyek, diharapkan seluruh kebutuhan barang/jasa dapat terpenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Perusahaan. Apabila terjadi kendala....dst
	5.3.8 *Engagement Stakeholder*	tidak ada	Pimpro bersama Fungsi Pemasaran melakukan komunikasi dan bekerja sama dengan Stakeholder serta melaksanakan interaksi dengan metode dan strategi yang telah ditetapkan sesuai Dokumen Rencana Pendekatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan). Dengan proses ini diharapkan agar tujuan dari Stakeholder dapat sejalan dengan kepentingan Proyek yang sedang berjalan. Pimpro dapat mengajukan permintaan perubahan terkait pengelolaan engagement Stakeholder menggunakan Formulir Change Request (BFR-001) apabila dibutuhkan
	Tabel 3. RASCI Matriks Tahap Eksekusi Proyek	tidak ada	ada

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.4 Tahap Pengendalian (*Controlling*)	Tahap pengendalian Proyek ini merupakan kegiatan *monev* (*monitoring & evaluation*) atau (pengawasan & penilaian) serta pelaporan yang dilakukan oleh Fungsi Pengawasan Proyek dan oleh fungsi pendukung lainnya sejak dari tahap inisiasi sampai penutupan.....dst	dihilangkan
	5.4 Tahap Pengawasan dan Pengendalian Proyek (Monitoring & *Controlling*)	tidak ada	Dalam tahap ini terdapat proses-proses yang dilakukan untuk melacak, meninjau, dan mengevaluasi kemajuan dan kinerja Proyek, mengidentifikasi area di mana perubahan pada rencana diperlukan, serta menginisiasi perubahan yang sesuai, pengawasan dan pengendalian bersifat berkelanjutan sepanjang siklus Proyek
	5.4.1 Pemantauan Pembukaan Kode Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek memantau proses pengajuan pembukaan kode Proyek yang dilakukan oleh Fungsi Manajemen Proyek untuk memastikan persetujuan memulai Proyek dapat segera diperoleh sesuai dengan yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak.	Dihilangkan
	5.4.1 Pengawasan dan Pengendalian Proyek (*Monitoring & Controlling Project Work*)	tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek secara berkala memeriksa kemajuan dan kondisi Proyek untuk dibandingkan dengan dokumen PMP. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah Proyek berjalan sesuai dengan rencana dan memenuhi harapan Pelanggan atau tidak. Dengan pengawasan ini memungkinkan Stakeholder untuk memahami kondisi Proyek saat ini, mengenali langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah kinerja Proyek yang muncul, dan memiliki visibilitas terhadap status Proyek di masa depan dengan perkiraan biaya dan jadwal Proyek....dst
	5.4.2 Pemantauan Penunjukan Pimpinan Proyek (Pimpro) dan Penetapan Tim Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek memantau proses penunjukan Pimpro dan penetapan Tim Proyek yang dilakukan oleh Fungsi Manajemen Proyek untuk memastikan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan Proyek dapat segera dialokasikan.	dihilangkan
	5.4.2 Kendali Perubahan Terintegrasi Proyek (*Perform Integrated Change Control*)	tidak ada	Setiap perubahan terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, maupun aspek lain yang memengaruhi sasaran Proyek wajib melalui proses Kendali Perubahan Terintegrasi (Integrated Change Control) dan memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai matriks kewenangan sebelum perubahan tersebut dapat diimplementasikan. Fungsi Pengawasan Proyek mengoordinasikan proses Kendali Perubahan Terintegrasi (Integrated Change Control) dengan memastikan setiap Change Request didokumentasikan, dianalisis, dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Analisis perubahan meliputi dampak terhadap ruang lingkup, jadwal, biaya, mutu, risiko, sumber daya, Kontrak, serta aspek lainnya yang relevan, termasuk kesesuaian dengan batas kewenangan dalam Kontrak yang telah ditetapkan....dst
	5.4.3 Pemantauan Serah Terima Dokumen Perencanaan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek memimpin dan menyelelenggarakan kegiatan serah terima dokumen perencanaan Proyek sehingga dapat dilaksanakan dan didukung oleh semua fungsi terkait.	dihilangkan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.4.3 Kontrol dan Validasi Ruang Lingkup Proyek	tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terkait ruang lingkup Proyek sesuai Dokumen Acuan Ruang Lingkup (Scope Baseline) yang sudah disahkan sebelumnya untuk mengetahui data deliverable yang dihasilkan oleh Tim Proyek sebagai mekanisme utama pencegahan Scope Creep. Apabila dalam kegiatan pengawasan dan validasi ruang lingkup Proyek ini ditemukan hal yang tidak sesuai, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan Formulir Change Request (BFR-001)
	5.4.4 Pemantauan Rapat Perdana (*Kick of Meeting*) Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek memimpin dan menyelenggarakan rapat perdana (*kick of meeting*) Proyek sehingga dapat dilaksanakan dan didukung oleh semua fungsi terkait.	dihilangkan
	5.4.4 Pemantauan Jadwal Proyek	tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan atas jadwal dari Proyek yang sedang berjalan sesuai Dokumen Rencana Manajemen Jadwal Proyek (Project Schedule Management Plan) yang sudah disahkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mengelola perubahan (jika diperlukan) yang mencakup informasi sebagai berikut : 1. Jadwal WBS yang telah diselesaikan dan masih dalam proses pengerjaan Proyek. 2. Prediksi atas jadwal penyelesaian ke depan berdasarkan kondisi yang terjadi saat ini. Fungsi Pengawasan Proyek menetapkan matriks pemantauan termasuk namun tidak terbatas pada milestone dan kurva-s, dimana pemantauan terkait jadwal Proyek ini dilakukan secara mingguan dan bulanan. Berdasarkan pemantauan jadwal Proyek ini, apabila diperlukan, Fungsi Pengawasan Proyek bisa meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan menggunakan Formulir Change Request (BFR-001).
	5.4.5 Pemantauan Kemajuan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek memantau pelaksanaan tugas Pimpro dan dukungan dari struktural Fungsi Manajemen Proyek dalam mengelola pelaksanaan Proyek secara terus menerus untuk memastikan Proyek berjalan sesuai dengan jadwal, anggaran, dan mutu yang sudah ditetapkan. Pimpro harus melaporkan kemajuan dan indikator kinerja Proyek secara berkala ke Fungsi Pengawasan Proyek menggunakan formulir Laporan Kemajuan Proyek (FFR-708).	dihilangkan
	5.4.5 Pemantauan Biaya Proyek	tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan atas anggaran dan biaya dari Proyek yang sedang berjalan sesuai Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Proyek, dan Rencana Arus Kas Proyek yang sudah disahkan sebelumnya dengan tujuan untuk melakukan update terhadap anggaran biaya Proyek serta mengelola perubahannya (jika diperlukan) dalam baseline jadwal dari perencanaan. Fungsi Pengawasan Proyek juga melakukan pemantauan terkait realisasi nilai dan arus kas Proyek sesuai progres yang terdeliver kepada Pelanggan, Proses ini selanjutnya menjadi input untuk proses penagihan yang diatur dalam panduan terpisah.....dst

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.4.6 Pengendalian Mutu Proyek	tidak ada	Fungsi Penjaminan Mutu melakukan kegiatan pengawasan dalam bidang mutu Proyek sejak dari tahap inisiasi sampai penutupan Proyek mengacu pada dokumen petunjuk teknis terkait mutu Proyek. Fungsi Penjaminan Mutu melakukan pemantauan dan pendokumentasian dari hasil pelaksanaan aktivitas manajemen mutu sesuai Dokumen Rencana Manajemen Kualitas (Quality Management Plan) yang sudah disahkan sebelumnya dengan tujuan melakukan penilaian terhadap performa Proyek serta meyakinkan hasil dari setiap aktivitas Proyek telah selesai di tiap WBS dengan baik dan benar serta memenuhi eskpektasi Pelanggan. Fungsi Penjaminan Mutu melakukan pendokumentasian menggunakan Dokumen Pengukuran Pengendalian Mutu Proyek yang berisi rekap atas hasil pelaksanaan aktivitas pengendalian mutu di Proyek. Fungsi Penjaminan Mutu menyusun dokumen deliverable dari Proyek telah diinspeksi, dievaluasi, dan telah memenuhi requirements dari kegiatan internal sebelum diperiksa oleh Pelanggan, dokumen ini salah satunya adalah bagian dari proses Testing and Commisioning (T&C) yang pemeriksaannya dilakukan secara internal. Apabila dalam pemantauan ditemukan hal yang tidak sesuai terkait mutu, Fungsi Penjaminan Mutu bisa meminta Pimpro untuk melakukan permintaan perubahan dengan menggunakan Formulir Change Request (BFR-001). Fungsi Penjaminan Mutu melakukan audit mutu Proyek untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan mutu dari Pelanggan dengan realisasinya pada pelaksanaan Proyek yang bersangkutan. Pelaksanaan audit Proyek mengacu pada Prosedur Audit Internal (QOP-803). Seluruh proses ini mengacu kepada Panduan Mutu Proyek (QOG-001)
	5.4.7 Pemantauan Risiko Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek memantau pelaksanaan tugas Pimpro dan dukungan dari struktural Fungsi Manajemen Proyek dalam melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap risiko berdasarkan formulir ***Kajian Risiko Proyek (RFR-002)*** yang telah disusun sebelumnya.....dst	dihilangkan
	5.4.7 Pemantauan Sumber Daya Proyek	tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terkait Sumber Daya Proyek yang dialokasikan dan dikerahkan telah seusai dengan Dokumen Rencana Manajemen Sumber Daya (Resource Management Plan) yang telah disahkan sebelumnya, serta memantau pula rencana pengelolaan sumber daya tersebut dengan membandingkan rencana dan data actual yang telah dilaksanakan. Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terhadap Sumber Daya Proyek dengan mengacu kepada Dokumen Laporan Rutin Pemantauan Sumber Daya. Apabila dalam pemantauan ditemukan hal yang tidak sesuai terkait sumber daya, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan Formulir Change Request (BFR-001)..

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.4.8 Pemantauan Pengendalian & Evaluasi Penyedia Eksternal	Fungsi Pengawasan Proyek memantau pelaksanaan tugas Pimpro untuk melaporkan secara berkala kepada Fungsi Pengadaan terkait pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia *eksternal, subkontraktor* dan/atau *outsourcing*. Mekanisme pemeriksaan dan pelaporannya mengacu pada Prosedur ***Pengendalian dan Evaluasi Penyedia Eksternal (POP-108)***.	dihilangkan
	5.4.8 Pemantauan Komunikasi Proyek	tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terkait informasi yang dibutuhkan oleh Proyek dan Stakeholder sudah memenuhi kebutuhan yang diperlukan, serta memantau juga terkait aliran informasi apakah sudah berjalan optimal sesuai Dokumen Matriks Rencana Komunikasi Internal/Eksternal Proyek (Internal/External Project Communication Matrix Plan) yang sudah disahkan sebelumnya. Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terhadap komunikasi Proyek dengan mengacu kepada Dokumen Laporan Rutin Pemantauan Efektifitas Komunikasi Proyek. Apabila dalam pemantauan komunikasi Proyek ditemukan hal yang tidak sesuai, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan menggunakan Formulir Change Request (BFR-001). **Rapat Tinjauan Proyek** Fungsi Pengawasan Proyek menilai kemajuan dan kinerja suatu Proyek serta melakukan koordinasi dengan fungsi terkait dalam upaya lesson learned, problem solving dan memberikan rekomendasi de-bottlenecking terhadap isu-isu dengan intensitas sesuai dengan kinerja Proyek. Fungsi Pengawasan Proyek dapat menyelenggarakan rapat tinjauan Proyek secara berkala dalam kurun waktu disesuaikan dengan kinerja Proyek. Rapat Tinjauan Proyek dilaksanakan dalam rangka pendalaman isu dari berbagai aspek terkait suatu kendala atau risiko dan pengambilan keputusan bersama untuk mengatasi kendala atau mengendalikan risiko tersebut.....dst
	5.4.9 Pemantauan Audit Mutu Proyek	Fungsi Penjaminan Mutu dapat melakukan audit mutu Proyek untuk memastikan kesesuaian antara persyaratan mutu dari Pelanggan dengan realisasinya pada pelaksanaan Proyek yang bersangkutan. Pelaksanaan audit Proyek mengacu pada Prosedur ***Audit Internal (QOP-803)***.	dihilangkan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.4.9 Pemantauan Risiko & Implementasi K3L Proyek	tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek bersama Fungsi Manajemen Risiko, Fungsi K3, dan Fungsi Pengelolaan Lingkungan Hidup melakukan pemantauan secara berkala terhadap implementasi Project Risk Response dan K3L yang dilakukan oleh Tim Proyek Pemantauan meliputi penelusuran risiko yang telah diidentifikasi oleh Tim Proyek, evaluasi efektivitas tindakan mitigasi yang diambil Tim Proyek, serta penilaian kepatuhan pelaksanaan Tim Proyek terhadap persyaratan K3L. Apabila hasil pemantauan risiko dan implementasi K3L menunjukkan adanya risiko atau kondisi K3L yang memerlukan perubahan terhadap rencana yang telah ditetapkan, Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan Formulir Change Request (BFR-001). Seluruh proses pemantauan risiko dan K3L mengacu pada Prosedur Operasional Pengelolaan Risiko (ROP Series) serta Prosedur Operasional terkait HSE dan Keamanan (VOP Series).
	5.4.10 Pemantauan K3L Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek memantau pelaksanaan tugas Pimpro dalam memastikan Tim Proyek bekerja dalam keadaan aman, sehat dan selamat sesuai dengan perencanaan K3L mengacu kepada *HSE plan* yang telah disusun sebelumnya. .....dst	dihilangkan
	5.4.10 Pemantauan Pengadaan Barang/Jasa Proyek	tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek memantau proses pengadaan yang dilakukan oleh Fungsi Operasional Pengadaan dan Tim Proyek, sesuai Dokumen Perencanaan Pengadaan (Procurement Plan) yang sudah disahkan sebelumnya. Apabila dalam pemantauan ditemukan potensi penyimpangan terkait pemantauan pengadaan barang/jasa yang memerlukan perubahan, maka Fungsi Pengawasan Proyek dapat meminta Pimpro untuk mengajukan permintaan perubahan dengan menggunakan Formulir Change Request (BFR-001). Seluruh proses ini mengacu kepada Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Perusahaan (POP Series).
	5.4.11 Pemantauan Koordinasi Rutin	Pimpro dapat melakukan koordinasi rutin dengan Timnya untuk memperoleh informasi perkembangan kemajuan pekerjaan Proyek. Koordinasi rutin paling tidak dilakukan 1 kali dalam 1 minggu atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan Proyek. Apabila dipandang perlu, maka Fungsi Pengawasan Proyek dapat ikut serta dalam koordinasi rutin tersebut.k Hasil rapat koordinasi rutin (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir Risalah Rapat (CFR-022) yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan salinannya diserahkan kepada peserta rapat, disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).	dihilangkan

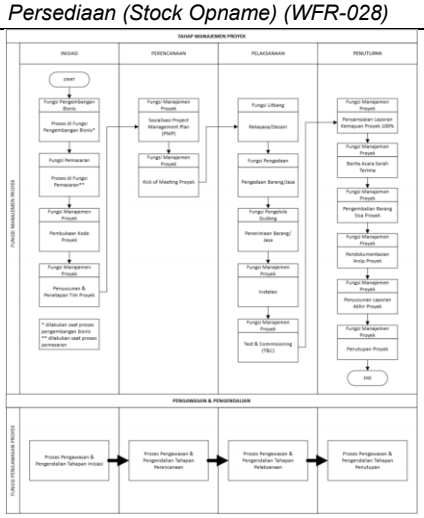
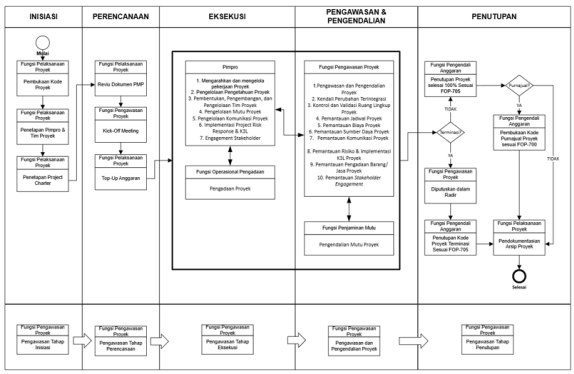
Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.4.11 Pemantauan *Stakeholder Engagement*	Tidak ada	Fungsi Pengawasan Proyek melakukan pemantauan terhadap komunikasi yang dilakukan oleh Tim Proyek dan Fungsi Pemasaran kepada Stakeholder agar sesuai dengan Dokumen Stakeholder Engagement Plan dan Stakeholder Register yang telah disahkan. Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa strategi keterlibatan Stakeholder tetap efektif dan sesuai dengan kondisi Proyek...dst
	Tabel 5. RASCI Matriks Tahap Pengawasan & Pengendalian	Tidak ada	ada
	5.4.12 Pemantauan Rapat Tinjauan Proyek	Fungsi Pengawasan Proyek menilai kemajuan dan kinerja suatu Proyek serta melakukan koordinasi dengan fungsi terkait dalam upaya *problem solving* dan *de-bottlenecking* terhadap isu-isu dengan intensitas sesuai dengan kinerja Proyek.....dst	dihilangkan
	5.4.13 Pemantauan Penagihan	Fungsi Pengawasan Proyek memantau dan membantu proses administrasi kegiatan penagihan yang dilakukan oleh Fungsi Pemasaran, mekanisme terkait penagihan diatur lebih lanjut dalam dokumen petunjuk teknis terkait penagihan proyek.	dihilangkan
	5.5 Tahap Penutupan (*Closing*)	Tahap penutupan Proyek merupakan kegiatan akhir Proyek setelah hasil akhir Proyek beserta dokumentasinya siap diserahterimakan kepada Pelanggan. Tahap ini mencakup kegiatan : Berita Acara Serah Terima (BAST), Laporan Kemajuan Proyek (LKP) 100%, pengembalian barang sisa Proyek, pendokumentasian arsip Proyek, laporan akhir Proyek, dan, penutupan Proyek dengan mengacu kepada Prosedur ***Penutupan Kode Proyek (FOP-705)***.....dst	Tahap penutupan Proyek merupakan kegiatan akhir Proyek yang ditandai dengan dikeluarkannya Laporan Akhir Proyek. Laporan Akhir Proyek berperan penting sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan Proyek dan mencatat setiap pengalaman yang diperoleh selama kegiatan Proyek berlangsung sebagai lessons learned untuk Proyek berikutnya di masa yang akan datang.
	5.5.1 Proyek Selesai 100%	tidak ada	Penutupan Proyek dikarenakan Proyek selesai 100% sesuai ruang lingkup dalam Kontrak, kegiatan penutupan Proyek ini dilakukan dengan mengacu kepada Prosedur Penutupan Kode Proyek (FOP-705).
	5.5.2 Terminasi Proyek	tidak ada	Penutupan Proyek dikarenakan adanya terminasi atau pemutusan Kontrak atas berbagai macam sebab yang dapat diterima oleh kedua belah pihak sebagai berikut : 1. Penyelesaian Kontrak karena Perusahaan mengusulkan pengunduran diri kepada Pelanggan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak. 2. Penyelesaian Kontrak dikarenakan Perusahaan mendapatkan sanksi dari Pelanggan karena pelanggaran terkait klausul Kontrak yang mengakibatkan pemutusan Pekerjaan. 3. Penyelesaian Kontrak karena kondisi dan/atau sebab yang tidak bisa dikontrol seperti adanya force majeur.....dst
	5.5.3 Laporan Akhir Proyek	Fungsi Manajemen Proyek harus menyusun dokumen laporan akhir Proyek yang berisi catatan keberhasilan Proyek dan pembelajaran yang diperoleh selama kegiatan Proyek berlangsung (*lesson learned*).	dihilangkan
	5.5.3 Pembukaan Kode Purnajual Proyek	Tidak ada	Untuk Proyek yang selesai 100% dan dipersyaratkan adanya purnajual dalam Kontrak, dilakukan pembukaan kode Purnajual Proyek dengan mengacu kepada Prosedur Pembukaan Kode Proyek/Program/Transfer Load (FOP-700).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

	5.5.4 Pendokumentasian Arsip Proyek	tidak ada	Tim Proyek dipimpin oleh Pimpro mengumpulkan seluruh dokumentasi yang telah dibuat selama kegiatan Proyek berlangsung dalam bentuk softcopy Proses pengarsipan dokumen mengacu kepada persyaratan dalam Formulir Laporan Dokumentasi Proyek (FFR-710). Seluruh hasil kegiatan yang tercatat dalam Prosedur ini baik berbentuk formulir, risalah rapat, klarifikasi, negosiasi maupun dokumen dan rekaman lainnya, disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002).
	6.0 FORMULIR TERKAIT	• *Formulir Changes Log Proyek (BFR-001)* • *Formulir Pengawasan dan Pengendalian Proyek (BFR-002)* • *Formulir Risalah Rapat (CFR-022)* • *Formulir Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi (CFR-027)* • *Formulir Pengajuan Kode Kegiatan (FFR-706)* • *Formulir Laporan Kemajuan Proyek (FFR-708)* • *Formulir Laporan Dokumentasi Proyek (FFR-710)* • *Checklist Syarat-syarat Dokumen Pengajuan Pembukaan Kode Proyek/Program (FLP-001)* • *Formulir Kajian Risiko Proyek (RFR-002)* • *Formulir Identifikasi dan Penilaian Bahaya-Risiko K3 dan Aspek-Dampak Lingkungan (VFR-015)* • *Formulir Bukti Pengembalian Bahan Sisa Proyek (WFR-010)* • *Formulir Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan (WFR-014)* • *Formulir Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname) (WFR-028)*	• *Formulir Changes Request Proyek (BFR-001);* • *Formulir Risalah Rapat (CFR-022);* • *Formulir Laporan Kemajuan Proyek (FFR-708);* • *Formulir Laporan Dokumentasi Proyek (FFR-710);* • *Formulir Project Risk Register (RFR-002);* • *Formulir Identifikasi dan Penilaian Bahaya Risiko K3 dan Aspek Dampak Lingkungan(VFR-015);* • *Template Project Charter (BOT-001).*
	7.0 ALUR/FLOW		

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:25

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).
