PT. Len Industri (Persero)	Halaman: 1 dari 10
FOP-705 **PENUTUPAN KODE PROYEK/PROGRAM**	Revisi: 11

Disiapkan oleh		Disetujui oleh :	Disahkan Oleh :
Ketua :	**Anggota Tim :**	Management Representative (SEGM SOT)	Direktur Utama
GM Management System & BP Transformation	GM Budgeting & Cost Control		
Tanggal : 27-10-2023	Tanggal : 27-10-2023	Tanggal : 27-10-2023	Tanggal : 30-10-2023
Tanda tangan:	Tanda tangan:	Tanda tangan:	Tanda tangan:
(Syafrudin)	(Rusyadi Azhar H)	(Nurman Setiawan)	(Bobby Rasyidin)

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
01	14-05-2004	Semua halaman terbitan pertama	WJ
02	18-08-2005	Halaman 2, 3, 4 , 5 dan 6	WJ
03	26-06-2006	Halaman 1, 3, 4 dan 5	WJ
04	02-02-2011	Semua Halaman	NH
05	28-03-2013	Semua Halaman	NH
06	30-05-2017	Semua Halaman	YA
07	17-11-2017	Semua Halaman	YA
08	27-12-2019	Halaman 5,7,8	EK
09	16-11-2020	Halaman 4, 8	YL
10	06-04-2021	Halaman 3-5, 9-10	SI
11	27-10-2023	Halaman 3-5, 9-10	SI

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

DAFTAR ISI

DAFTAR REVISI **1**
DAFTAR ISI **2**
1.0 TUJUAN **3**
2.0 RUANG LINGKUP **3**
3.0 DEFINISI **3**
3.1 Proyek 3
3.2 Program 3
3.3 Transfer Load 3
3.4 Laporan Kemajuan Proyek/Program (LKP) 100% 3
3.5 Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST B/J) 4
4.0 DOKUMEN TERKAIT **4**
5.0 PROSEDUR **4**
5.1 Penutupan Kode Proyek / Program 4
6.0 FORMULIR TERKAIT **8**
7.0 ALUR PROSES PENUTUPAN KODE **10**
LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN (*CHANGE MANAGEMENT)* **11**

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

1.0 TUJUAN

- Untuk menganalisis kinerja proyek/program terhadap anggaran yang telah ditetapkan.
- Sebagai masukan langkah-langkah perbaikan untuk proyek/ program/ transfer load selanjutnya.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai acuan proses penutupan kode proyek/program/transfer load dan acuan bagi manajemen dalam menganalisis proyek/program/transfer load yang kode proyek/program/transfer load nya akan ditutup.

3.0 DEFINISI

3.1 Proyek

Meliputi Proyek Bisnis dan Proyek Litbang. Definisi mengacu ke prosedur ***Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700)***.

3.2 Program

Meliputi Program Persediaan Produk Ritel, Program Internal Litbang, Program Eksternal Litbang, Program POC dan Program Investasi Bisnis/Proyek. Definisi mengacu ke prosedur ***Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700).***

3.3 Transfer Load

Meliputi Transfer Load Produk Ritel, Transfer Litbang, Transfer Load Produksi, Transfer Load POC Sistem. Definisi mengacu ke prosedur ***Pembukaan dan Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700).***

3.4 Laporan Kemajuan Proyek/Program (LKP) 100%

Laporan Kemajuan Proyek/Program (LKP) 100% adalah *progress* pekerjaan proyek/program/transfer load yang telah selesai dan tidak ada lagi biaya proyek/program/transfer load yang akan menyerap pagu anggaran.

Laporan Kemajuan Proyek/Program/Transfer Load ini merupakan Laporan Monitoring yang dilaporkan menggunakan ***Laporan Kemajuan Proyek/Program*** (***FFR-708***).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

3.5 Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST B/J)

Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa (BAST B/J) adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi pekerjaan, yang merupakan bukti bahwa barang/jasa yang dikerjakan oleh PT. Len Industri (Persero) sudah diserahkan kepada pemilik proyek.

3.5.1 Berita Acara Serah Terima (BAST 1) Pekerjaan

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi kerja pada akhir pekerjaan utama dari suatu proyek/program.

3.5.2 Berita Acara Serah Terima (BAST 2) Pemeliharaan

Berita Acara Serah Terima Pemeliharaan adalah suatu dokumen yang ditandatangani oleh penerima dan pemberi kerja pada akhir masa pemeliharaan dari suatu proyek/program. Masa pemeliharaan yang dimaksud adalah pemeliharaan yang dilakukan setelah selesainya pekerjaan utama dari suatu proyek/program.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Informasi Terdokumentasi*** (***QOP-812***)
- ***Pembukaan & Revisi Kode Proyek/Program (FOP-700)***
- ***Penanganan Order*** (***SOP-001***)
- ***Internal Order*** (***SOP-002***)
- ***Penanganan Kontrak*** (***SOP-004***)
- ***Syarat-Syarat Dokumen Pengajuan Penutupan Kode Proyek/Program (FLP-03)***
- ***Panduan Proses Bisnis Commercial Project (PRBG-1001)***
- ***Panduan Manajemen Proyek (PMOG-001)***

5.0 PROSEDUR

5.1 Penutupan Kode Proyek / Program

Pimpinan Proyek/Program/Transfer Load setiap bulan membuat ***Laporan Kemajuan Proyek/Program (LKP) (FFR-708)***.

Laporan itu diperiksa oleh Kepala Unit Eselon II terkait dan disetujui oleh Pemberi Kerja. Selain itu, Pimpinan Proyek/Program setiap bulan juga

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

membuat Laporan Persediaan Barang dengan menggunakan ***formulir Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname) (WFR-028)*** yang diperiksa oleh Kepala Unit Eselon II terkait dan disetujui oleh Kepala Unit Eselon I terkait. Setelah disahkan, Pimpinan Proyek/Program mendistribusikan LKP bulanan dan Laporan Persediaan Barang ini kepada:

- Fungsi Perencanaan Perusahaan
- Fungsi Pengendali Anggaran
- Fungsi Keuangan
- Fungsi Akuntansi
- Fungsi Audit Internal
- Kepala Unit Eselon I terkait

Untuk LKP yang sudah mencapai 100% dan atau dibuat pada akhir tahun, selain diperiksa oleh Kepala Unit Eselon II terkait juga harus disetujui oleh Kepala Unit Eselon I terkait dan Pemberi Kerja. Setelah disahkan, Pimpinan Proyek/Program mendistribusikannya kepada:

- Fungsi Perencanaan Perusahaan
- Fungsi Pengendali Anggaran
- Fungsi Keuangan
- Fungsi Akuntansi
- Fungsi Audit Internal

Khusus untuk Program Internal Litbang / Program Eksternal Litbang, setelah LKP 100%, Pimpinan Program diharuskan membuat Laporan Program Internal Litbang / Program Eksternal Litbang. Laporan tersebut dijadikan acuan untuk menentukan nilai HPP produk serta mengetahui penyerapan anggaran program yang akan menjadi nilai investasi prototype. Prototype yang dihasilkan dikendalikan dan menjadi aset PT. Len Industri (Persero).

Setelah LKP mencapai 100%, Pimpinan Proyek/Program melakukan penyerahan:

1. Barang/jasa kepada pemberi kerja, dengan bukti penyerahan berupa ***formulir Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan dan/atau Pemeliharaan (WFR-014)*** yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

   Formulir BAST yang telah disahkan kemudian didistribusikan oleh Pimpinan Proyek/Program kepada:

   - Fungsi Keuangan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

- Fungsi Akuntansi
- Pemberi Kerja

2. Barang sisa proyek/program kepada Fungsi Pengelola Gudang dengan menggunakan ***formulir Bukti Pengembalian Bahan Sisa Proyek/Sisa Produksi (WFR-010)*** dan melampirkan ***formulir Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname) (WFR-028).***

   Formulir WFR-010 & WFR-028 tersebut didistribusikan kepada:

   - Fungsi Perencanaan Perusahaan
   - Fungsi Pengendali Anggaran
   - Fungsi Keuangan
   - Fungsi Akuntansi
   - Fungsi Audit Internal

3. Lapiran Akhir Proyek/Program

Berdasarkan LKP yang sudah mencapai 100%,

1. Fungsi Pengendali Anggaran membuat ***Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran dan Realisasi Cashflow dari system SAP*** untuk disampaikan kepada Pimpinan Proyek/Program dan Fungsi Audit Internal;
2. Fungsi Akuntansi membuat ***Laporan Laba/(Rugi)*** untuk disampaikan kepada Pimpinan Proyek/Program dan Fungsi Audit Internal.

Untuk setiap proyek/program yang LKPnya telah 100%, Pimpinan Proyek/Program yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan Penutupan Proyek/Program sesuai dengan persyaratan kelengkapan dokumen pada ***Formulir Syarat-Syarat Dokumen Pengajuan Penutupan Kode Proyek / Program (FLP-03)*** dan diserahkan kepada Fungsi Pengendali Anggaran.

Berdasarkan dokumen pengajuan penutupan kode proyek/program yang diterima, Fungsi Pengendali Anggaran melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen. Jika memenuhi persyaratan maka Fungsi Pengendali Anggaran mengadakan Rapat Tinjauan Penutupan Proyek/Program dan mengusulkan:

1. Penutupan Kode Proyek/Program;
2. Penetapan stok bebas berdasarkan ***formulir Bukti Pengembalian Bahan Sisa Proyek/Sisa Produksi (WFR-010),***

kepada Direktur terkait dan hasilnya dicatat dalam ***formulir Tinjauan Penutupan Proyek/Program (FFR-713).*** Atas persetujuan Direktur terkait,

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

Fungsi Pengendali Anggaran menutup pagu anggaran proyek/program tersebut dan menetapkan barang sisa proyek/program sebagai stok bebas.

Setelah pagu anggaran proyek ditutup, Pimpinan Proyek dapat mengajukan pembukaan kode proyek untuk after sales / masa pemeliharaan proyek terkait (jika di dalam kontrak terdapat klausul masa pemeliharaan proyek).

Berdasarkan data ***Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran, Realisasi Cash Flow*** dan ***Laporan Laba/(Rugi)***, Fungsi Audit Internal melakukan analisa terhadap proyek/program yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Proyek rugi, dengan nilai proyek tidak dibatasi.
2. Proyek laba dengan nilai ≥ Rp. 1 Milyar, dengan kondisi:
   - Realisasi biaya melebihi pagu anggaran ≥ 2,5 % dari nilai kontrak neto.
   - Pergeseran antar mata anggaran ≥ 25 % dari pagu anggaran semula.
3. Terdapat material sisa proyek.
4. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menyebabkan perusahaan dikenakan denda atas keterlambatan tersebut.

Bila salah satu atau semua kondisi tersebut terjadi pada proyek/program yang bersangkutan maka:

- Fungsi Keuangan membuat laporan *cash in* proyek/program
- Saldo piutang proyek/program dan saldo hutang ke *supplier* dan menyerahkan ke Fungsi Audit Internal untuk bahan tinjauan
- Unit SPI/Renper mengadakan tinjauan penutupan proyek/program dan hasilnya dicatat dalam formulir ***Tinjauan Penutupan Proyek/Program*** (***FFR-713***)

Pihak-pihak terkait yang dilibatkan dalam Rapat Tinjauan Penutupan Kode Proyek/Program ialah:

- Direktur terkait
- Direktur Keuangan & SDM
- Fungsi Pemasaran (untuk program persediaan produk ritel/program POC)
- Fungsi Manajemen Proyek (untuk Proyek Bisnis/Litbang/Transfer Load POC)
- Fungsi Layanan Purna Jual (untuk Transfer Load Produk Ritel)
- Fungsi Litbang (untuk Proyek/Program/Transfer Load Litbang)

  Fungsi Produksi (untuk Transfer Load Produksi/Rekayasa Produk)
- Fungsi Pengembangan Bisnis (untuk Program Investasi)

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

- Fungsi Audit Internal
- Fungsi Perencanaan Perusahaan
- Fungsi Pengendali Anggaran
- Fungsi Akuntansi
- Fungsi Keuangan
- Fungsi Pengelola Gudang
- Pimpinan Proyek/Program

Masalah yang dibahas dalam Rapat Tinjauan Penutupan Proyek/Program adalah:

- Realisasi penyerapan anggaran
- Laba/rugi proyek/program
- *Cash Flow*, saldo piutang dan saldo hutang ke *supplier*
- Barang sisa proyek/program
- Penentuan Umur Manfaat Ekonomi berdasarkan formulir **Monitoring Program Pengembangan Produk (FFR-722)** yang ditentukan oleh fungsi Pengembangan Bisnis, Pengembangan Teknologi dan Akuntansi.
- Status Keberhasilan Program Pengembangan ditinjau dari :
    - Aspek teknis berupa kesesuaian terhadap TOR
    - ASpek Bisnis berupa kesesuaian terhadap Bussiness Plan (kajian terakhir).

Hasil tinjauan penutupan proyek dicatat dalam formulir ***Tinjauan Penutupan Proyek/Program*** (***FFR-713***) dan dilaporkan ke Direksi, serta didistribusikan kepada pihak yang terlibat dalam tinjauan penutupan proyek/program.

5.2 Penerapan Aplikasi ERP-SAP Untuk Penutupan Kode Proyek/Program

Dalam proses Penutupan Kode Proyek/Program juga diselaraskan dengan ***Panduan Proses Bisnis Commercial Project*** **(PRBG-1001)** yang terkait dengan Penerapan ERP-SAP. Terdapat beberapa tindakan (action) yang diminta oleh aplikasi ERP-SAP untuk melakukan proses Penutupan Kode Proyek/Program. Penjelasan mengacu kepada proses PS-BP-08 *Project Closing* yang ada pada aplikasi ERP-SAP.

6.0 FORMULIR TERKAIT


- ***Berita Acara Serah Terima Pekerjaandan/atau Pemeliharaan (WFR-014)***
- ***Laporan Kemajuan Proyek/Program*** (***FFR-708***)

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

- ***Rincian Anggaran Proyek (RAP)*** (***UA-01a***)
- ***Laporan Laba/(Rugi) Proyek***
- ***Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran*** / ***Realisasi Cash Flow Proyek***
- ***Tinjauan Penutupan Proyek/Program*** (***FFR-713***)
- ***Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname) (WFR-028)***
- ***Bukti Pengembalian Bahan Sisa Proyek/Sisa Produksi (WFR-010)***
- ***Laporan Akhir Proyek/Program***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

7.0 ALUR PROSES PENUTUPAN KODE

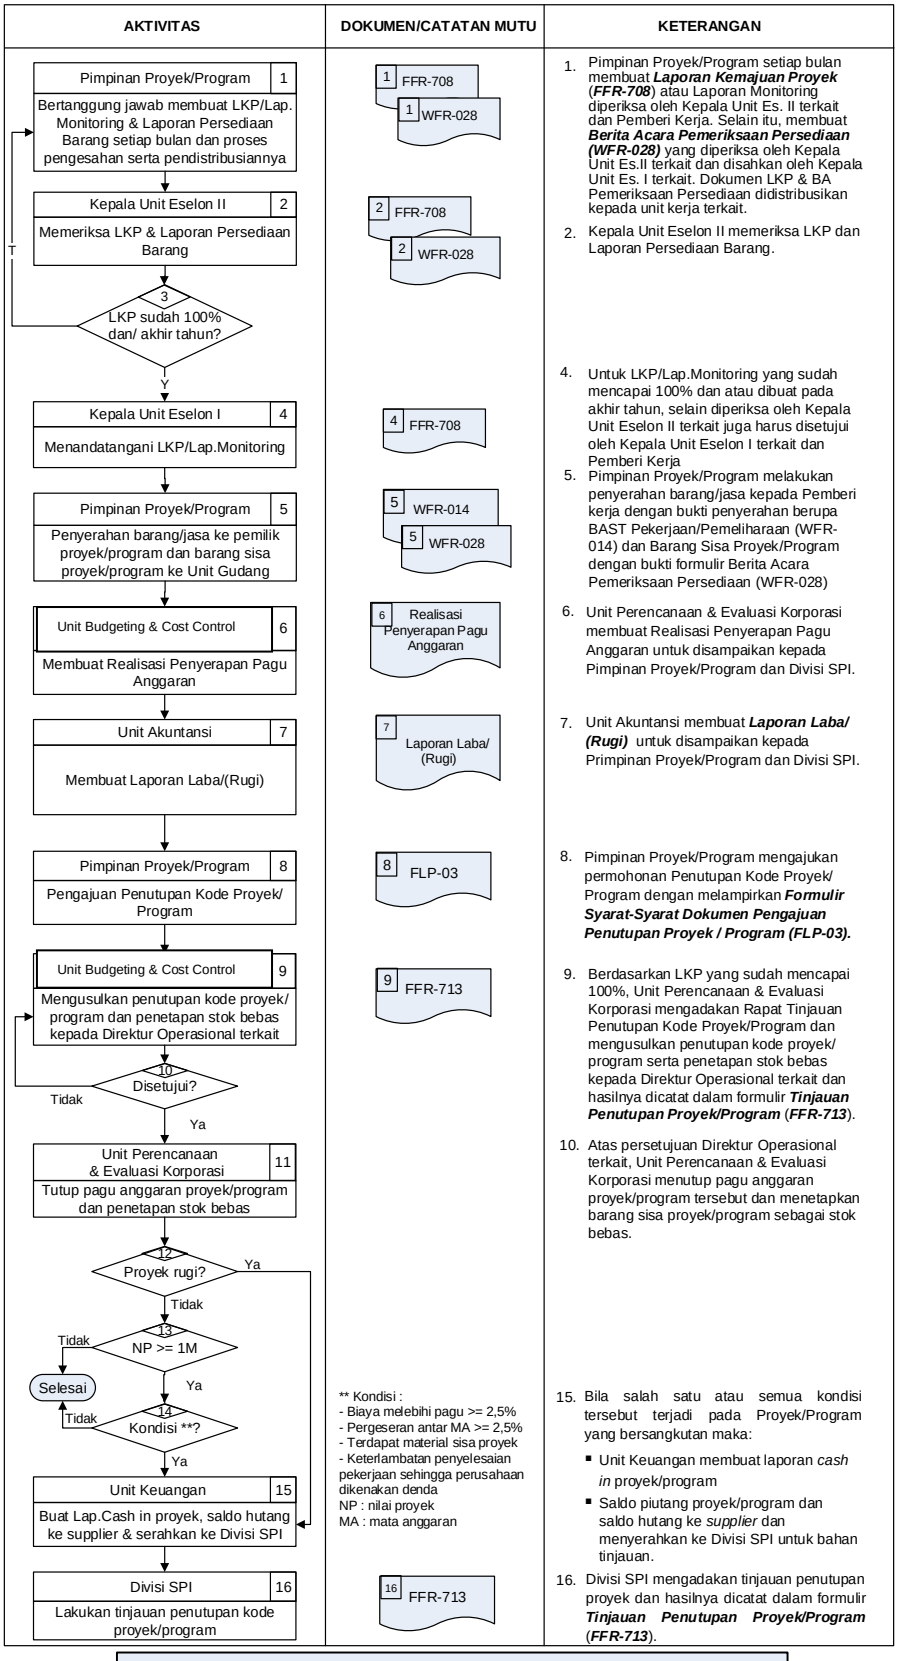

Flowchart FFC-705 : Penutupan Kode Proyek / Program

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27

LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN (*CHANGE MANAGEMENT)*

No	Poin Perubahan	FOP-705 rev 10 (Lama)	FOP-705 rev 11 (Baru)	Dasar Revisi
1	Perubahan Nomenklatur Unit Kerja	Unit Perencaan dan Evaluasi Korporasi	Unit Pengendali Anggaran	Perubahan Struktur Organisasi sesuai SK No. 209/SKEP/DU/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 tentang Perubahan Struktur Organisasi

No	Poin Perubahan	FOP-705 rev 9 (Lama)	FOP-705 rev 10 (Baru)	Dasar Revisi
1	Bab 3 Definisi (Halaman 3)	Definisi: • Proyek • Program • Laporan Kemajuan Proyek/ Program Tidak ada definisi : • Transfer Load	Revisi Definisi : • Proyek • Program • Laporan Kemajuan Proyek/ Program Penambahan Definisi: • Transfer Load	Perubahan Struktur Organisasi sesuai SK No : 038/SKEP/DU/I/2021 Tentang Struktur Organisasi dan Tupoksi dan SK No. 039/SKEP/DU/I/2021 tentang Kebijakan Transisi Organisasi serta SK No.079_27 April 2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tupoksi
2	Bab 5 Penutupan Kode Proyek/Program	Belum ada penjelasan LKP untuk Program Investasi, Program Persediaan Produk Ritel, Transfer Load Produk Retail	Penambahan penjelasan LKP untuk Program Investasi, Program Persediaan Produk Ritel, Transfer Load Produk Retail,	

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:27
