PT Len Industri (Persero)	Halaman 1 dari 17
SOP-004 **PENANGANAN KONTRAK**	Revisi: **15**

Disusun oleh :		Direviu oleh :	Disetujui oleh :
SVP Bid Management Tanggal : 26-12-2024 Tanda Tangan : (Totom Hamdan)	**GM Business Process management** Tanggal : 30-12-2024 Tanda Tangan : (Yunika Sopandi)	**Management Representative** Tanggal : 06-01-2025 Tanda Tangan : (Nurman Setiawan)	**Direktur Bisnis & Kerjasama** Tanggal : 09-01-2025 Tanda Tangan : (Wahyu Sofiadi)
SVP Marketing & Sales Center Tanggal : 27-12-2024 Tanda Tangan : (Khanestyo)			

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
14	8-12-2022	Penyelarasan Nomenklatur Organisasi berdasarkan SK. NO. 209-SKEP-DU-VI-2021	SH
15	09-01-2025	Penyelarasan Nomenklatur Organisasi berdasarkan SK. NO. 144-SKEP-DU-VII-2024	IS

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi Lenio untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

DAFTAR ISI

1.0 TUJUAN 3
2.0 RUANG LINGKUP 3
3.0 DEFINISI 3
3.1 Kontrak 3
3.2 Sirkuler 4
3.3 Tinjauan Kontrak 4
3.4 Uji Kelayakan Anti Penyuapan 4
3.5 Penyelenggara Rapat Tinjauan 4
3.6 Pemimpin Rapat Tinjauan 4
3.7 Peninjau Rapat Tinjauan 4
3.8 Perwakilan Struktural 4
3.9 Perusahaan 4
3.10 Pelanggan 4
3.11 Project Income Statement (PIS) 4
4.0 DOKUMEN TERKAIT 4
5.0 PROSEDUR/ISI 5
5.1 Tinjauan Kontrak & Pengesahan Kontrak 5
5.1.1 Tinjauan Kontrak – Teknis 6
5.1.2 Tinjauan Kontrak – *Costing* 7
5.1.3 Tinjauan Kontrak – *Go* 8
5.1.3.1 Persetujuan Kontrak Kelas Kecil 9
5.1.3.2 Tinjauan Kontrak – Go Kelas Sedang 9
5.1.3.3 Tinjauan Kontrak - Go Kelas Besar 10
5.1.4 Hasil Tinjauan Kontrak – *Go* 11
5.2 Tanda Tangan Kontrak 11
5.3 Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data 12
6.0 FORMULIR TERKAIT 13
7.0 ALUR / FLOW 14
8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN 15

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).	Business Process Management BM, MSC, PDC, PMO, EPP, CS Januari - 2025

1.0 TUJUAN

Menjamin penyelesaian Kontrak dapat terlaksana dengan tepat waktu, efektif dan efisien serta menguntungkan Perusahaan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai acuan bagi perusahaan untuk meninjau dan menyepakati draft Kontrak dan sebagai acuan bagi pelaksana proyek/pekerjaan serta fungsi terkait dalam merealisasikan setiap Kontrak yang diterima.

3.0 DEFINISI

3.1 Kontrak

Kontrak adalah persyaratan yang secara resmi telah disetujui oleh perusahaan dan pelanggan. Kontrak dapat berupa *purchase order* (PO), surat perintah kerja (SPK), *confirmation order* atau surat perjanjian yang telah disetujui dan telah mendapat kesepakatan antara pelanggan dengan perusahaan.

3.2 Penyelenggara Rapat Tinjauan

Penyelenggara Rapat Tinjauan adalah pihak yang mengundang, membuka, menutup rapat, melakukan aktivitas administrasi rapat seperti membuat daftar hadir rapat, membuat notulensi rapat, sirkuler notulensi rapat, mengarsipkan dan memonitor tindak-lanjut keputusan rapat.

3.3 Pemimpin Rapat Tinjauan

Pemimpin Rapat Tinjauan adalah pihak yang memimpin jalannya rapat tinjauan, mengarahkan dan membuat keputusan atas isu-isu yang terjadi dalam tinjauan.

3.4 Peninjau Rapat Tinjauan

Peninjau Rapat Tinjauan adalah fungsi yang diundang rapat tinjauan untuk memberikan masukan terhadap aspek yang dibahas, serta membubuhkan parafnya di dalam formulir tinjauan.

3.5 Perwakilan Struktural

Perwakilan Struktural adalah staf yang ditunjuk untuk mewakili struktural yang berhalangan hadir dalam rapat tinjauan. Staf yang ditunjuk memiliki wewenang yang sama dengan atasannya dan memiliki kompetensi yang dibutuhkan sehingga dapat memberikan pendapat dan keputusan sesuai aspek yang menjadi tanggung jawabnya untuk ditinjau.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Penunjukkan perwakilan harus disampaikan oleh struktural yang berhalangan kepada Penyelenggara Rapat Tinjauan sebelum rapat tinjauan berlangsung. Staf yang ditunjuk tersebut harus berbeda dengan staf yang menyusun dokumen yang akan ditinjau.

3.6 Perusahaan

Perusahaan adalah PT Len Industri (Persero) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 442 Bandung.

3.7 Pelanggan

Pelanggan adalah pihak (perusahaan atau lembaga atau organisasi; internal atau (eksternal) yang memberikan proyek dan akan membayar atas produk, jasa, atau hasil kerja dari proyek tersebut.

3.8 Project Income Statement (PIS)

PIS merupakan rencana anggaran biaya proyek yang dibuat untuk memperkirakan berapa biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proyek yang mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung proyek.

3.9 Sirkuler

Dokumen yang dikirimkan kepada beberapa orang di beberapa fungsi untuk menyampaikan pesan untuk diperiksa agar disetujui dan ditandatangani.

3.10 Tinjauan Kontrak

Tinjauan Kontrak adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk meninjau seluruh persyaratan dan lingkup pekerjaan di dalam draft Kontrak. Tinjauan Kontrak juga dilakukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan semua kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Kontrak.

3.11 Uji Kelayakan Anti Penyuapan

Uji Kelayakan Anti Penyuapan adalah proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkat risiko penyuapan yang bertujuan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang terkait dengan transaksi, proyek/aktivitas, rekanan/mitra bisnis, dan personel tertentu.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Memo terkait Peningkatan Aspek Keamanan Data Pada Tinjauan;***
- ***Memo Penyesuaian Penentuan Klasifikasi Proyek;***
- ***Nota Pembaharuan Pemetaan Fungsi Generik terhadap Unit Aktual;***
- ***Surat Keputusan Direksi tentang Struktur Organisasi PT Len Industri (Persero);***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

- ***Surat Keputusan Direksi tentang Fungsi & Tugas Pokok Organisasi PT Len Industri (Persero);***
- ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002);***
- ***Prosedur Uji Kelayakan SMAP (GOP-1103);***
- ***Prosedur Kajian Risiko Proyek (ROP-911);***
- ***Prosedur Pemilihan Mitra Kerjasama (SOP-008);***

5.0 PROSEDUR/ISI

5.1 Tinjauan Kontrak & Pengesahan Kontrak

Apabila calon Pelanggan telah menyetujui harga atau biaya yang ditawarkan, atau Perusahaan telah diputuskan sebagai pemenang tender, Fungsi Pemasaran membahas *draft* Kontrak dengan calon Pelanggan.

Draft Kontrak harus ditinjau untuk meyakinkan bahwa berbagai persyaratan telah jelas, baik dari aspek legal, aspek keuangan, aspek risiko, dan lain-lain, dan Perusahaan mampu untuk memenuhi semua persyaratan yang tertera dalam Kontrak tersebut.

Fungsi Pemasaran memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penanganan Kontrak dan bertanggungjawab memastikan apabila terjadi penyuapan harus dilaporkan kepada Perusahaan/Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan.

Tinjauan Kontrak dibagi menjadi 3 (tiga) lingkup, yaitu :
- Tinjauan Kontrak – Teknis
- Tinjauan Kontrak – *Costing*
- Tinjauan Kontrak – *Go*

Fungsi Pengawasan Pra Proyek dapat memutuskan agar rapat Tinjauan Kontrak – Teknis dan/atau *Costing* dilaksanakan secara Sirkuler pada kondisi :
- Dokumen terkait Kontrak (persyaratan dari calon Pelanggan dan proposal penawaran dari Perusahaan) sudah ditinjau pada rapat Tinjauan Order.
- Tidak ada syarat dan ketentuan khusus yang diusulkan oleh Perusahaan dalam proposal penawaran.
- Tidak ada perubahan dokumen terkait Kontrak yang akan ditandatangani.

Meskipun dilakukan secara Sirkuler, seluruh usulan/pendapat serta keputusan dan kesepakatan dalam rapat tinjauan harus dicatat pada formulir ***Tinjauan Kontrak - Teknis (SFR-006)*** dan formulir ***Tinjauan Kontrak - Costing (SFR-021)***.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.1.1 Tinjauan Kontrak – Teknis

Rapat Tinjauan Kontrak – Teknis diselenggarakan untuk mengevaluasi **semua aspek non-keuangan** oleh fungsi-fungsi terkait sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, untuk memastikan risiko-risiko akibat *contractual requirements* pada dokumen terkait Kontrak sudah dapat dikendalikan. Adapun aspek-aspek yang dievaluasi dalam Tinjauan Kontrak – Teknis meliputi namun tidak terbatas pada aspek-aspek sebagai berikut :

- Aspek Legal
- Aspek Risiko Proyek

Terkait tinjauan aspek legal teknis yang harus dibahas dan menjadi perhatian seluruh peserta dalam Rapat Tinjauan Kontrak-Teknis mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam formulir ***Tinjauan Kontrak - Teknis (SFR-006)***.

Terkait aspek risiko teknis, peserta tinjauan harus membahas program mitigasi risiko proyek yang ditetapkan dalam formulir ***Kajian Risiko Proyek (RFR-002)***, serta poin-poin terkait aspek risiko yang tercantum dalam formulir ***Tinjauan Kontrak - Teknis (SFR-006)***.

Rapat Tinjauan Kontrak – Teknis dihadiri oleh para peserta dari fungsi-fungsi seperti tercantum pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Teknis

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek
2	Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek
3	Pendukung Pemapar	• Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Rekayasa Sistem • Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek • Eselon I/II Fungsi Pengadaan (Perencanaan)
4	Peninjau Aspek Legal Teknis	Eselon I/II Fungsi Legal
5	Peninjau Aspek Risiko	Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko

Fungsi Pengawasan Pra Proyek dapat mengundang Narasumber dari fungsi lain jika diperlukan seperti yang tercantum pada Tabel 2, untuk membahas aspek terkait jika :

- Terdapat perubahan aspek-aspek terkait;
- Risiko tinggi pada aspek tersebut;
- Sebagai tindak lanjut atas pembahasan aspek tertentu pada Tinjauan Order– Teknis yang belum tuntas.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Tabel 2. Narasumber rapat Tinjauan Kontrak – Teknis

No.	Peran	Peserta
1	Narasumber Aspek Tata Kelola	Eselon II Fungsi Tata Kelola
2	Narasumber Aspek Bisnis	Eselon I/II Fungsi Pengembangan Bisnis
3	Narasumber Aspek Mutu	Eselon II Fungsi Penjaminan Mutu
4	Narasumber Aspek Ketersediaan Sumber Daya	Eselon I/II Fungsi SDM
5	Narasumber Aspek Produksi (jika ada)	• Eselon I/II Fungsi Rekayasa Pra Produksi • Eselon I/II Fungsi Rendal Produksi
6	Narasumber Aspek K3L & Sosial	Eselon I/II Fungsi K3L

Narasumber aspek lain dapat diundang apabila diperlukan oleh Pemimpin rapat Tinjauan Kontrak - Teknis.

Struktural yang berhalangan hadir harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada Subbab 3.5.

Hasil Tinjauan Kontrak – Teknis (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir ***Tinjauan Kontrak - Teknis (SFR-006)*** yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada peserta tinjauan. Seluruh formulir disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke prosedur ***Informasi Terdokumentasi (COP-002)***.

Fungsi Perencanaan Proyek melakukan pembaharuan risiko proyek pada formulir ***Kajian Risiko Proyek (RFR-002)*** berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Kontrak – Teknis.

5.1.2 Tinjauan Kontrak – *Costing*

Rapat Tinjauan Kontrak – Costing diselenggarakan untuk mengevaluasi aspek keuangan oleh fungsi-fungsi terkait sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Adapun aspek yang dievaluasi meliputi namun tidak terbatas pada :

- Aspek Keuangan - Anggaran
- Aspek Keuangan - Pendanaan

Terkait tinjauan aspek legal *costing* yang harus dibahas dan menjadi perhatian seluruh peserta dalam Rapat Tinjauan Kontrak-*Costing* mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam formulir ***Tinjauan Kontak - Costing (SFR-021)***.

Rapat Tinjauan Kontrak – *Costing* dihadiri oleh para peserta seperti tercantum pada Tabel 3 berikut :

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Tabel 3. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Costing

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek
2	Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek
3	Pendukung Pemapar	• Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Pengadaan (Perencanaan)
4	Peninjau Aspek Keuangan	• Eselon I/II Fungsi Keuangan • Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran
5	Peninjau Aspek Risiko	Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko

Nilai-nilai yang dibahas pada Tinjauan Kontrak - *Costing* adalah nilai tanpa PPN (pajak pertambahan nilai).

Hasil rapat Tinjauan Kontrak-*Costing* (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir ***Tinjauan Kontrak-Costing (SFR-021)*** yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh peserta tinjauan.

Formulir tersebut disimpan selama selang waktu tertentu dengan mengacu ke prosedur ***Informasi terdokumentasi (COP-002)***.

5.1.3 Tinjauan Kontrak – *Go*

Rapat Tinjauan Kontrak – *Go* diselenggarakan untuk pengambilan keputusan oleh Direksi berdasarkan data yang valid dari aspek komersial (harga jual/nilai kontrak, HPP, dan laba) dengan memperhatikan hasil peninjauan di tahap sebelumnya serta mitigasi risiko dan strategi efisiensinya. Nilai-nilai yang dibahas adalah nilai tanpa PPN.

Dalam hal Perusahaan melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendapatkan kontrak, maka batasan Tinjauan Kontrak - *Go* ditentukan berdasarkan porsi Perusahaan dari nilai Kontrak yang didapatkan. Pemilihan mitra kerjasama ini mengacu ke prosedur ***Pemilihan Mitra Kerjasama (SOP-008).***

Rapat Tinjauan Kontrak – Go diselenggarakan berdasarkan klasifikasi Kontrak seperti tercantum pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Kelas Kontrak / Tinjauan Kontrak-Go

No	Nilai Kontrak	Kelas Kontrak	Tinjauan Kontrak Go
1	< Rp 25 Milyar	Kelas Kecil	Tidak dilakukan Tinjauan
2	Rp 25 Milyar – Rp. 100 Milyar	Kelas Sedang	Kelas Sedang
3	> Rp 100 Milyar	Kelas Besar	Kelas Besar

Nilai kontrak tersebut adalah tanpa PPN

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.1.3.1 Persetujuan Kontrak Kelas Kecil

Dalam hal nilai Kontrak kurang dari Rp 25 miliar, nilai tersebut adalah nilai tanpa PPN. Fungsi Pemasaran dan Fungsi Pengawasan Pra Proyek langsung meminta persetujuan kepada direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran untuk persetujuan berdasarkan pertimbangan dari Tinjauan Kontrak - Teknis & *Costing* yang sudah dilakukan dan divalidasi.

Persetujuan oleh direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran menggunakan formulir ***Persetujuan Order/Kontrak Kecil (SFR-024)***.

5.1.3.2 Tinjauan Kontrak – Go Kelas Sedang

Tinjauan Kontrak - *Go* kelas sedang dilakukan apabila nilai Kontrak diatas Rp 25 miliar sampai dengan 100 miliar, nilai tersebut adalah nilai tanpa PPN.

Tinjauan Kontrak - Go kelas sedang harus dihadiri oleh para peserta seperti tercantum pada tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Go Kelas Sedang

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin Rapat Tinjauan	Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran
2	Peninjau Aspek Keuangan dan Ketersediaan Sumber Daya	Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM*
3	Peninjau Aspek Teknis, Manajemen Proyek, Pengadaan, dan Produksi (apabila ada)	Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi*
4	Peninjau Aspek Risiko dan Tata Kelola	Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola*
5	Penyelenggara & Pemapar Resume Tinjauan Kontrak - Teknis & *Costing*	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek
6	Pendukung Pemapar Rapat Tinjauan	• Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek • Eselon I/II Fungsi Pengadaan (Perencanaan) • Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran • Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek • Eselon I/II Fungsi Keuangan • Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko

Keterangan :
** minimal salah satu direksi*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Rapat Tinjauan Kontrak – *Go* kelas sedang dapat terselenggara jika telah mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh fungsi-fungsi terkait dan sedikitnya 2 (dua) orang direksi, yaitu (1) Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran sebagai pemimpin rapat tinjauan, serta (2) Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan/Pengendali Anggaran/SDM, dan/atau Direktur yang membidangi Fungsi Perencanaan Proyek/Rekayasa Sistem/Pengadaan/Manajemen Proyek, dan/atau Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko/Tata Kelola sebagai peninjau aspek.

5.1.3.3 Tinjauan Kontrak - Go Kelas Besar

Tinjauan Kontrak - *Go* kelas besar dilakukan apabila nilai Kontrak diatas Rp 100 miliar, nilai tersebut adalah nilai tanpa PPN.

Tinjauan Kontrak - *Go* kelas besar harus dihadiri oleh para peserta seperti tercantum pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Go Kelas Besar

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin Rapat Tinjauan	Direktur Utama
2	Penyelenggara Rapat Tinjauan	Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran*
3	Peninjau Aspek Keuangan dan Ketersediaan Sumber Daya	Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM**
4	Peninjau Aspek Teknis, Manajemen Proyek, Pengadaan, dan Produksi	Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi**
5	Peninjau Aspek Risiko dan Tata Kelola	Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola **
6	Penyelenggara dan Pemapar Resume Tinjauan Kontrak – teknis & *costing*	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek***
7	Pendukung Pemapar Rapat Tinjauan	• Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek • Eselon I/II Fungsi Pengadaan (Perencanaan) • Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran • Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek • Eselon I/II Fungsi Keuangan • Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko

Keterangan :
** Pihak yang mengundang, membuka dan menutup rapat*
*** Minimal salah satu direksi*
**** Pihak yang melakukan aktivitas administrasi rapat seperti membuat daftar hadir rapat, membuat notulensi rapat, mengarsipkan dan memonitor tindak-lanjut keputusan rapat.*

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Rapat Tinjauan Kontrak – *Go* kelas besar dapat terselenggara jika telah mencapai kuorum, yaitu dihadiri oleh fungsi-fungsi terkait dan sedikitnya 3 (tiga) orang direksi, yaitu (1) Direktur Utama sebagai pemimpin rapat tinjauan, (2) Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran sebagai penyelenggara rapat tinjauan, serta (3) Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan/Pengendali Anggaran/SDM, dan/atau Direktur yang membidangi Fungsi Perencanaan Proyek/Rekayasa Sistem/Pengadaan/Manajemen Proyek, dan/atau Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko/Tata Kelola sebagai peninjau aspek.

5.1.4 Hasil Tinjauan Kontrak – *Go*

Direksi bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pengawasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan Perusahaan. Direksi mempertimbangkan hasil Uji Kelayakan SMAP apakah pada proyek tersebut dapat menimbulkan penyuapan dan kerugian bagi Perusahaan.

Hasil Rapat Tinjauan Kontrak – *Go* (termasuk keputusan, seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam formulir ***Risalah Rapat (CFR-022)***, yang diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada peserta tinjauan.

Formulir tersebut disimpan selama selang waktu tertentu mengacu ke prosedur ***Informasi Terdokumentasi (COP-002).***

5.2 Tanda Tangan Kontrak

Kontrak ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut :

- Kontrak kelas kecil ditandatangani oleh direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran dengan memberikan tembusan kepada direksi yang lain;
- Kontrak kelas sedang ditandatangani oleh direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran (paraf oleh eselon I fungsi terkait, eselon II fungsi terkait, dan eselon II Fungsi Legal);
- Kontrak kelas besar ditandatangani oleh Direktur Utama (paraf oleh eselon I fungsi terkait, eselon II fungsi terkait, dan Eselon II Fungsi Legal).

Dalam hal terdapat persyaratan dari pelanggan, yang mengharuskan Kontrak ditandatangani oleh salah satu direksi, maka dapat dilakukan oleh direktur terkait (paraf oleh eselon I fungsi terkait, eselon II fungsi terkait, dan eselon II Fungsi Legal).

Setelah Kontrak ditandatangi oleh direksi dan Pelanggan, Fungsi Pemasaran menyerahkan berkas Kontrak asli kepada Fungsi Sekretaris Perusahaan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan bisa melakukan distribusi salinan Kontrak ke fungsi terkait yang membutuhkan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.3 Penentuan Klasifikasi Proyek & Penunjukan Pimpinan Proyek

Setelah Kontrak ditanda-tangani, Fungsi Perencanaan Proyek harus menentukan klasifikasi proyek, hasil penetapan klasifikasi proyek dicatat dan didokumentasikan pada formulir ***SFR-022 Matriks Penentuan Kelas Proyek & Pimpro*** untuk ditetapkan oleh Fungsi SDM. Kemudian Fungsi Manajemen Proyek merekomendasikan calon pimpinan proyek kepada Fungsi SDM agar dapat diajukan dan disetujui oleh direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Proyek.

5.4 Pembukaan Kode Proyek

Apabila Kontrak telah ditandatangani dan semua rencana realisasi proyek telah disepakati, maka Fungsi Manajemen Proyek melakukan Pembukaan Kode Proyek sesuai dengan prosedur ***Pembukaan dan Revisi Kode Proyek / Program*** (***FOP-700***). Fungsi Manajemen Proyek menginformasikan kebutuhan *transfer load* ke Fungsi terkait dengan mengacu pada prosedur ***Penanganan Program & Transfer Load*** (***SOP-002***) (bila ada).

5.5 Pembuatan Jaminan Pelaksanaan & Jaminan Uang Muka

Fungsi Pemasaran membuat jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan untuk diserahkan kepada Pelanggan, pembuatan dan penyerahan jaminan ini dipantau oleh Fungsi Pengawasan Pra Proyek.

5.6 Penagihan Uang Muka

Fungsi Pemasaran melakukan penagihan uang muka kepada Pelanggan, proses penagihan uang muka kepada Pelanggan ini dipantau oleh Fungsi Pengawasan Pra Proyek.

5.7 Rapat Perdana dan Serah Terima Dokumen

Fungsi Pengawasan Pra Proyek menghadiri kegiatan rapat perdana dan serah terima dokumen dari tim tender ke tim proyek yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Fungsi Pengawasan Proyek, mekanisme terkait rapat perdana dan serah terima dokumen mengacu kepada prosedur ***Manajemen Proyek (BOP-001)***.

5.8 Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data

Pada dasarnya setiap informasi sensitif (termasuk *costing*) harus dijaga dari akses pihak lain (termasuk fungsi-fungsi terkait). Setiap peredaran dokumen dalam rangka pelaksanaan tinjauan Order/Kontrak/ Adendum harus dalam format PDF.

Setiap peredaran dokumen yang terkait *costing* terutama *Project Income Statement (PIS)* harus ditandai *watermark* tertentu untuk memudahkan penelusuran sumber kebocoran data. Penyimpanan dokumen diupayakan hanya pada komputer, *server*, dan *cloud* milik perusahaan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LENCI untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 [illegible]

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Peredaran dokumen diupayakan dilakukan melalui saluran komunikasi data yang aman dan *traceable.* Khusus fungsi berikut diberikan hak akses dokumen dalam lingkup terbatas dalam format non PDF sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugasnya seperti tercantum pada tabel 14 berikut :

Tabel 14. Fungsi yang Mendapatkan Hak Akses PIS Non PDF

No.	Fungsi	Kebutuhan	Lingkup Akses Informasi
1	Fungsi Pemasaran	Pemasaran dan Penjualan	Copy Value
2	Fungsi Pengadaan (Perencanaan)	Pengadaan	HPS/Harga Perkiraan Sendiri
3	Fungsi SDM	Penempatan SDM proyek	Kelas proyek
4	Fungsi Manajemen Risiko	Pengelolaan Risiko Proyek	Kelas proyek
5	Fungsi Pengawasan Pra Proyek	Perencanaan Proyek	Akses Penuh
6	Fungsi Pengendali anggaran	Kendali Anggaran Proyek	Akses Penuh
7	Fungsi Keuangan	Pengelolaan Keuangan Proyek	Copy Value

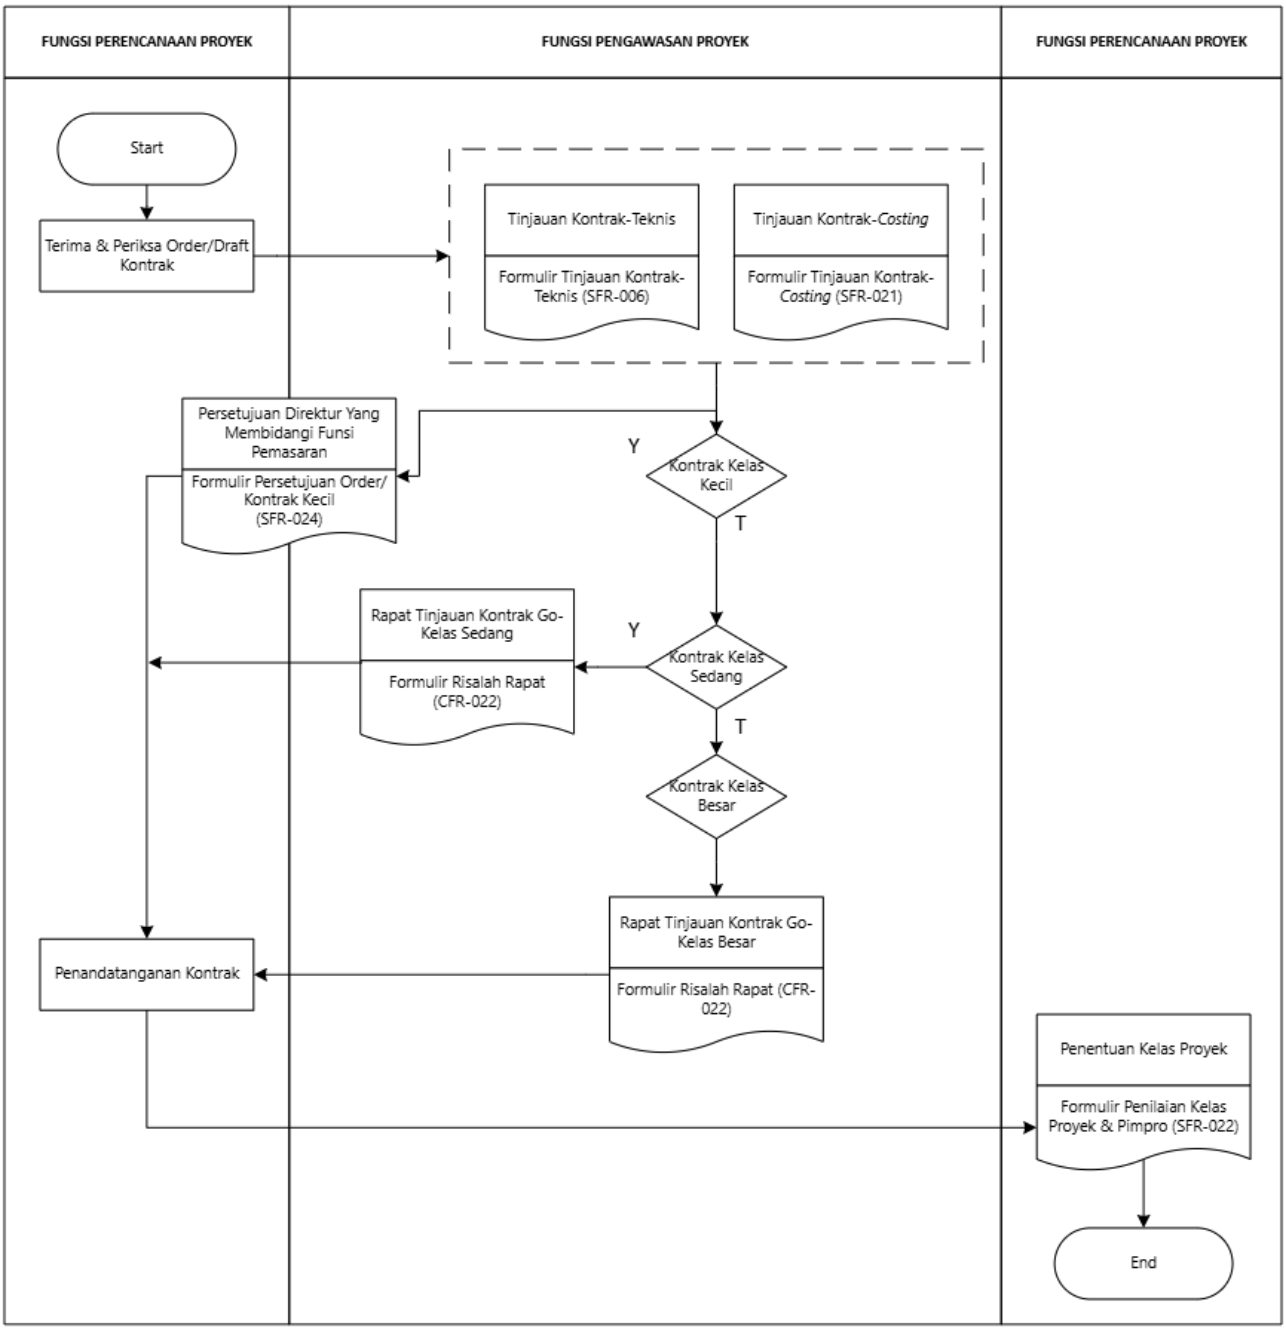
6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***Risalah Rapat (CFR-022)***
- ***Kajian Risiko Proyek (RFR-002)***
- ***Tinjauan Kontrak – Teknis*** (***SFR-006***)
- ***Tinjauan Kontrak – Costing*** (***SFR-021***)
- ***Matriks Penentuan Kelas Proyek & Pimpro (SFR-022)***
- ***Persetujuan Order/Kontrak Kecil (SFR-024)***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.0 ALUR/FLOW

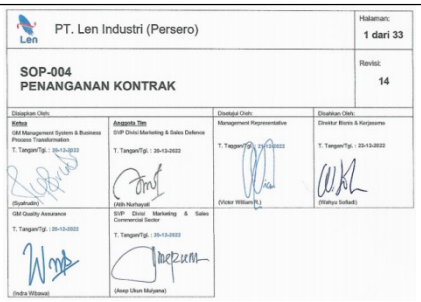
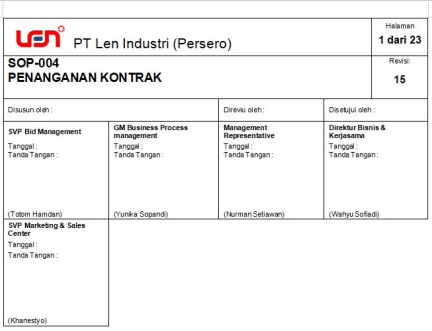


Flowchart SFC-001 : Penanganan Kontrak

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).	Business Process Management BM, MSC, PDC, PMO, EPP, CS Januari - 2025

8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN

<table>
<tr><th>No</th><th>BAB dan SUB BAB</th><th>Versi Lama</th><th>Versi Baru</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Cover tanda-tangan dan Judul</td><td> 
PT. Len Industri (Persero)
Halaman: 1 dari 33
SOP-004
PENANGANAN KONTRAK
Revisi: 14</td><td> 
PT Len Industri (Persero)
Halaman 1 dari 23
SOP-004
PENANGANAN KONTRAK
Revisi: 15
Disusun oleh : | Direviu oleh : | Disetujui oleh :
SVP Bid Management — (Totom Hamdan)
GM Business Process management — (Yunika Sopandi)
Management Representative — (Nurman Setiawan)
Direktur Bisnis & Kerjasama — (Wahyu Sofiadi)
SVP Marketing & Sales Center — (Khanestyo)</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Pembahasan aspek legal tinjauan Kontrak-Teknis</td><td>Tidak ada</td><td>Aspek-aspek legal yang harus dibahas dan menjadi perhatian dalam Rapat Tinjauan Kontrak-Teknis mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam formulir Tinjauan Kontak - Teknis (SFR-006).</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Pembahasan aspek risiko tinjauan Kontrak-Teknis</td><td>Tidak ada</td><td>Terkait aspek risiko teknis, peserta tinjauan harus membahas program mitigasi risiko proyek dan formulir Kajian Risiko Proyek (RFR-002), poin-poin terkait aspek risiko tersebut tercantum dalam formulir Tinjauan Kontak - Teknis (SFR-006).</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Tabel peserta tinjauan Kontrak-teknis</td><td>Tabel Peserta Tinjauan Kontrak - Teknis
<table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Tanggung Jawab Pada Rapat Tinjauan</th></tr><tr><td>1</td><td>Eselon I/II Unit Pemasaran</td><td>Penyelenggara Rapat Tinjauan</td></tr><tr><td>2</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Perusahaan</td><td>Pemimpin Rapat Tinjauan</td></tr><tr><td>3</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Proyek</td><td>Pemapar Tinjauan</td></tr><tr><td>4</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Pengadaan Proyek</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr><tr><td>5</td><td>Eselon II Unit Legal</td><td>Peninjau Aspek Legal</td></tr><tr><td>6</td><td>Eselon II Unit Manajemen Risiko</td><td>Peninjau Aspek Risiko</td></tr><tr><td>7</td><td>Eselon I/II Unit Manajemen Proyek</td><td>Pengamat dan Menerima Dokumen dari Unit Perencanaan Proyek</td></tr><tr><td>8</td><td>Eselon I/II Unit Pengadaan</td><td>Pengamat dan Menerima Dokumen dari Unit Perencanaan Pengadaan Proyek</td></tr></table></td><td>Tabel 1. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Teknis
<table><tr><th>No.</th><th>Peran</th><th>Peserta</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemapar Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendukung Pemapar</td><td>• Eselon I/II Fungsi Pemasaran
• Eselon I/II Fungsi Litbang
• Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek
• Eselon I/II Fungsi Pengadaan</td></tr><tr><td>4</td><td>Peninjau Aspek Legal Teknis</td><td>Eselon I/II Fungsi Legal</td></tr><tr><td>5</td><td>Peninjau Aspek Risiko</td><td>Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>4</td><td>Tabel narasumber tinjauan Kontrak-teknis</td><td>Tabel Narasumber Tinjauan Kontrak -Teknis
<table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Tanggung Jawab Pada Rapat Tinjauan</th></tr><tr><td>1</td><td>Eselon I/II Unit Litbang</td><td>Narasumber Aspek Rekayasa</td></tr><tr><td>2</td><td>Eselon I/II Unit Pengembangan Bisnis</td><td>Narasumber Aspek Bisnis</td></tr><tr><td>3</td><td>Eselon II Penjaminan Mutu</td><td>Narasumber Aspek Mutu</td></tr><tr><td>4</td><td>Eselon I/II Unit Produksi</td><td>Narasumber Aspek Produksi</td></tr><tr><td>5</td><td>Eselon I/II Sumber Daya Manusia</td><td>Narasumber Aspek Ketersediaan Sumber Daya</td></tr><tr><td>6</td><td>Eselon II K3L</td><td>Narasumber Aspek K3L & Sosial</td></tr><tr><td>7</td><td>Eselon II Unit Tata Kelola</td><td>Narasumber Aspek Tata Kelola (termasuk Anti Penyuapan)</td></tr></table></td><td>Tabel 1. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Teknis
<table><tr><th>No.</th><th>Peran</th><th>Peserta</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemapar Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendukung Pemapar</td><td>• Eselon I/II Fungsi Pemasaran
• Eselon I/II Fungsi Litbang
• Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek
• Eselon I/II Fungsi Pengadaan</td></tr><tr><td>4</td><td>Peninjau Aspek Legal Teknis</td><td>Eselon I/II Fungsi Legal</td></tr><tr><td>5</td><td>Peninjau Aspek Risiko</td><td>Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td>Narasumber Aspek Lain Tinjauan Kontrak- Teknis</td><td>Tidak ada</td><td>Narasumber aspek lain bisa diundang apabila diperlukan oleh Pemimpin rapat Tinjauan Kontrak - Teknis.</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Tabel peserta tinjauan Kontrak-Costing</td><td>Tabel Peserta Tinjauan Kontrak - Costing
<table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Tanggung Jawab Pada Rapat Tinjauan</th></tr><tr><td>1</td><td>Eselon I/II Unit Pemasaran</td><td>Penyelenggara Rapat Tinjauan</td></tr><tr><td>2</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Perusahaan</td><td>Pemimpin Rapat Tinjauan</td></tr><tr><td>3</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Proyek</td><td>Pemapar Tinjauan</td></tr><tr><td>4</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Pengadaan Proyek</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr><tr><td>5</td><td>Eselon I/II Unit Pengendali Anggaran</td><td>Peninjau Aspek Keuangan - Anggaran</td></tr><tr><td>6</td><td>Eselon I/II Unit Keuangan</td><td>Peninjau Aspek Keuangan - Pendanaan</td></tr><tr><td>7</td><td>Eselon I/II Unit Pengawas Proyek</td><td>Pengamat dan Menerima Dokumen dari Unit Pemasaran & Unit Perencanaan Proyek</td></tr></table></td><td>Tabel 3. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Costing
<table><tr><th>No.</th><th>Peran</th><th>Peserta</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek</td></tr><tr><td>2</td><td>Pemapar Rapat Tinjauan</td><td>Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek</td></tr><tr><td>3</td><td>Pendukung Pemapar</td><td>• Eselon I/II Fungsi Pemasaran
• Eselon I/II Fungsi Pengadaan</td></tr><tr><td>4</td><td>Peninjau Aspek Keuangan</td><td>• Eselon I/II Fungsi Keuangan
• Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran</td></tr><tr><td>5</td><td>Peninjau Aspek Legal Costing</td><td>Eselon I/II Fungsi Legal</td></tr><tr><td>6</td><td>Peninjau Aspek Risiko</td><td>Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Pembahasan aspek legal tinjauan Kontrak-costing</td><td>Tidak ada</td><td>Terkait tinjauan aspek legal costing yang harus dibahas dan menjadi perhatian seluruh peserta dalam Rapat Tinjauan Kontrak-Costing mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam formulir Tinjauan Kontak - Costing (SFR-021).</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Tabel Kelas Kontrak</td><td>Tidak ada</td><td>Tabel 4. Kelas Kontrak / Tinjauan Kontrak-Go
<table><tr><th>No</th><th>Nilai Kontrak</th><th>Kelas Kontrak</th><th>Tinjauan Kontrak Go</th></tr><tr><td>1</td><td>< Rp 25 Milyar</td><td>Kelas Kecil</td><td>Tidak dilakukan Tinjauan</td></tr><tr><td>2</td><td>Rp 25 Milyar – Rp. 100 Milyar</td><td>Kelas Sedang</td><td>Kelas Sedang</td></tr><tr><td>3</td><td>> Rp 100 Milyar</td><td>Kelas Besar</td><td>Kelas Besar</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

<table>
<tr><td>10</td><td>Persetujuan Kontrak kelas kecil</td><td>Dalam hal nilai kontrak kurang dari Rp 25 Miliar, Unit Pemasaran langsung meminta persetujuan kepada Direktur Bisnis & Kerjasama untuk persetujuan berdasarkan pertimbangan dari Tinjauan Kontrak - Teknis & Costing yang sudah dilakukan dan divalidasi.</td><td>Dalam hal nilai Kontrak kurang dari Rp 25 miliar, nilai tersebut adalah nilai tanpa PPN. Fungsi Pemasaran dan Fungsi Pengawasan Pra Proyek langsung meminta persetujuan kepada direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran untuk persetujuan berdasarkan pertimbangan dari Tinjauan Kontrak - Teknis & Costing yang sudah dilakukan dan divalidasi.

Persetujuan oleh direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran menggunakan formulir Persetujuan Order/Kontrak Kecil (SFR-024).</td><td></td></tr>
<tr><td>11</td><td>Tabel peserta tinjauan Kontrak GO-kelas sedang</td><td>Tabel Peserta Tinjauan Kontrak - Go Kelas Sedang
<table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Tanggung Jawab Pada Rapat Tinjauan</th></tr><tr><td>1</td><td>Direktur Bisnis & Kerjasama</td><td>Pemimpin Rapat Tinjauan</td></tr><tr><td>2</td><td>Direktur Keuangan & SDM / Direktur Teknologi *</td><td>Peninjau Aspek Keuangan, Ketersediaan Sumber Daya, Pengadaan, Risiko, Tata Kelola, Legal, Teknis, Produksi, Manajemen Proyek</td></tr><tr><td>3</td><td>Eselon I/II Perencanaan Perusahaan</td><td>Pemapar Hasil Tinjauan Teknis & Costing</td></tr><tr><td>4</td><td>Eselon I/II Unit Pemasaran</td><td>Penyelenggara Rapat Tinjauan</td></tr><tr><td>5</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Proyek</td><td>Pemapar Rapat Tinjauan</td></tr><tr><td>6</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Pengadaan Proyek</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr><tr><td>7</td><td>Eselon I/II Unit Pengendali Anggaran</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr><tr><td>8</td><td>Eselon I/II Unit Keuangan</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr><tr><td>9</td><td>Eselon I/II Unit Manajemen Proyek</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr></table>Keterangan :
* minimal salah satu Direksi</td><td>Tabel 5. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Go Kelas Sedang
<table><tr><th>No.</th><th>Peran</th><th>Peserta</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemimpin Rapat Tinjauan</td><td>Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran</td></tr><tr><td>2</td><td>Peninjau Aspek Keuangan dan Ketersediaan Sumber Daya</td><td>Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM*</td></tr><tr><td>3</td><td>Peninjau Aspek Teknis, Manajemen Proyek, Pengadaan, dan Produksi (apabila ada)</td><td>Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi*</td></tr><tr><td>4</td><td>Peninjau Aspek Risiko dan Tata Kelola</td><td>Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola*</td></tr><tr><td>5</td><td>Penyelenggara & Pemapar Resume Tinjauan Kontrak - Teknis & Costing</td><td>Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek</td></tr><tr><td>6</td><td>Pendukung Pemapar Rapat Tinjauan</td><td>• Eselon I/II Fungsi Pemasaran
• Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek
• Eselon I/II Fungsi Pengadaan (Perencanaan)
• Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran
• Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek
• Eselon I/II Fungsi Keuangan
• Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko</td></tr></table>Keterangan :
* minimal salah satu direksi</td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>Tabel peserta tinjauan Kontrak GO-kelas besar</td><td>Tabel Peserta Tinjauan Kontrak - Go Kelas Besar
<table><tr><th>No</th><th>Peserta</th><th>Tanggung Jawab Pada Rapat Tinjauan</th></tr><tr><td>1</td><td>Direktur Utama</td><td>Pemimpin Rapat Tinjauan</td></tr><tr><td>2</td><td>Direktur Bisnis & Kerjasama</td><td>Penyelenggara Rapat Tinjauan *</td></tr><tr><td>3</td><td>Direktur Keuangan & SDM / Direktur Teknologi / Direktur Strategi Bisnis & Portfolio **</td><td>Peninjau Aspek Keuangan, Ketersediaan Sumber Daya, Pengadaan, Risiko, Tata Kelola, Legal, Teknis, Produksi, Manajemen Proyek</td></tr><tr><td>4</td><td>Eselon I/II Perencanaan Perusahaan</td><td>Pemapar Hasil Tinjauan Teknis & Costing</td></tr><tr><td>5</td><td>Eselon I/II Unit Pemasaran</td><td>Penyelenggara Rapat Tinjauan ***</td></tr><tr><td>6</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Proyek</td><td>Pemapar Tinjauan</td></tr><tr><td>7</td><td>Eselon I/II Unit Perencanaan Pengadaan Proyek</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr><tr><td>8</td><td>Eselon I/II Unit Pengendali Anggaran</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr><tr><td>9</td><td>Eselon I/II Unit Keuangan</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr><tr><td>10</td><td>Eselon I/II Unit Manajemen Proyek</td><td>Pendukung Pemapar</td></tr></table>Keterangan :
* Pihak yang mengundang, membuka dan menutup rapat
** minimal salah satu Direksi
*** Pihak yang melakukan aktivitas administrasi rapat seperti mebuat daftar hadir rapat, membuat notulensi rapat, mengarsipkan dan memonitor tindak-lanjut keputusan rapat</td><td>Tabel 6. Peserta Rapat Tinjauan Kontrak – Go Kelas Besar
<table><tr><th>No.</th><th>Peran</th><th>Peserta</th></tr><tr><td>1</td><td>Pemimpin Rapat Tinjauan</td><td>Direktur Utama</td></tr><tr><td>2</td><td>Penyelenggara Rapat Tinjauan</td><td>Direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran*</td></tr><tr><td>3</td><td>Peninjau Aspek Keuangan dan Ketersediaan Sumber Daya</td><td>Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan dan SDM**</td></tr><tr><td>4</td><td>Peninjau Aspek Teknis, Manajemen Proyek, Pengadaan, dan Produksi</td><td>Direktur yang membidangi Fungsi Rekayasa Sistem, Pengadaan, Manajemen Proyek, dan Produksi**</td></tr><tr><td>5</td><td>Peninjau Aspek Risiko dan Tata Kelola</td><td>Direktur yang membidangi Fungsi Manajemen Risiko dan Tata Kelola **</td></tr><tr><td>6</td><td>Penyelenggara dan Pemapar Resume Tinjauan Kontrak – teknis & costing</td><td>Eselon I/II Fungsi Pengawasan Pra Proyek***</td></tr><tr><td>7</td><td>Pendukung Pemapar Rapat Tinjauan</td><td>• Eselon I/II Fungsi Pemasaran
• Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek
• Eselon I/II Fungsi Pengadaan (Perencanaan)
• Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran
• Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek
• Eselon I/II Fungsi Keuangan
• Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko</td></tr></table>Keterangan :
* Pihak yang mengundang, membuka dan menutup rapat
** Minimal salah satu direksi
*** Pihak yang melakukan aktivitas administrasi rapat seperti membuat daftar hadir rapat, membuat notulensi rapat, mengarsipkan dan memonitor tindak-lanjut keputusan rapat.</td><td></td></tr>
<tr><td>13</td><td>Tanda-tangan Kontrak</td><td>Kontrak ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut :

▪ Kontrak sampai dengan Rp 100 Miliar ditandatangani oleh Direktur Bisnis & Kerjasama (Paraf oleh Kepala Unit Eselon I terkait, Paraf Kepala Unit Eselon II terkait, dan Paraf Kepala Unit Eselon II Legal).

Dalam hal terdapat persyaratan dari pelanggan yang mengharuskan Kontrak ditandatangani oleh salah satu Direksi, maka dapat dilakukan oleh Direktur Bisnis & Kerjasama/Direktur Teknologi/Direktur Strategi Bisnis & Portofolio/Direktur Keuangan & SDM (Paraf oleh Kepala Unit Eselon I terkait, Paraf Kepala Unit Eselon II terkait, dan Paraf Kepala Unit Eselon II Legal).
▪ Kontrak di atas Rp 100 Miliar ditandatangani oleh Direktur Utama (Paraf oleh Kepala Unit Eselon I terkait, Paraf Kepala Unit Eselon II terkait, dan Paraf Kepala Unit Eselon II Legal).</td><td>Kontrak ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut :
▪ Kontrak kelas kecil ditandatangani oleh direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran dengan memberikan tembusan kepada direksi yang lain;
▪ Kontrak kelas sedang ditandatangani oleh direktur yang membidangi Fungsi Pemasaran (paraf oleh eselon I fungsi terkait, eselon II fungsi terkait, dan eselon II Fungsi Legal);
▪ Kontrak kelas besar ditandatangani oleh Direktur Utama (paraf oleh eselon I fungsi terkait, eselon II fungsi terkait, dan Eselon II Fungsi Legal).

Dalam hal terdapat persyaratan dari pelanggan, yang mengharuskan Kontrak ditandatangani oleh salah satu direksi, maka dapat dilakukan oleh direktur terkait (paraf oleh eselon I fungsi terkait, eselon II fungsi terkait, dan eselon II Fungsi Legal).

Setelah Kontrak ditandatangi oleh direksi dan Pelanggan, Fungsi Pemasaran menyerahkan berkas Kontrak asli kepada Fungsi Sekretaris Perusahaan.

Fungsi Sekretaris Perusahaan bisa melakukan distribusi salinan Kontrak ke fungsi terkait yang membutuhkan.</td><td></td></tr>
<tr><td>14</td><td>Serah terima dokumen Kontrak</td><td>Jika Kontrak telah ditanda-tangani Perusahaan dan Pelanggan selanjutnya dilakukan serah terima sebagai berikut :

■ Kontrak asli disimpan oleh Fungsi Sekretaris Perusahaan.
■ Salinan dokumen Kontrak terkait teknis diserahkan kepada Fungsi Pemasaran, Fungsi Pengawasan Pra Proyek, Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Litbang dan/atau Fungsi Rekayasa Sistem, Fungsi Pengadaan, Fungsi Pengawasan Proyek, dan Fungsi Manajemen Proyek.
■ Salinan dokumen Kontrak terkait keuangan diserahkan kepada Fungsi Pemasaran, Fungsi Pengawasan Pra Proyek, Fungsi Perencanaan Proyek, Fungsi Keuangan, Fungsi Pengendali Anggaran, dan Fungsi Pengawasan Proyek.</td><td>Tidak ada</td><td></td></tr>
<tr><td>15</td><td>Penentuan Klasifikasi Proyek</td><td>Setelah penandatangan kontrak, maka Kepala Unit Kerja Pelaksana Proyek merekomendasikan Calon Pimpinan Proyek kepada Direktur yang membawahinya untuk mendapatkan persetujuan.</td><td>Setelah Kontrak ditanda-tangani, Fungsi Perencanaan Proyek harus menentukan klasifikasi proyek, hasil penetapan klasifikasi proyek dicatat dan didokumentasikan pada formulir SFR-022 Matriks Penentuan Kelas Proyek & Pimpro untuk ditetapkan oleh Fungsi SDM. Kemudian Fungsi Manajemen Proyek merekomendasikan calon pimpinan proyek kepada Fungsi SDM agar dapat diajukan dan disetujui oleh direktur yang membawahi Fungsi Manajemen Proyek.</td><td></td></tr>
<tr><td>16</td><td>Pembukaan Kode Proyek</td><td>Tidak ada</td><td>Apabila Kontrak telah ditandatangani dan semua rencana realisasi proyek telah disepakati, maka Fungsi Manajemen Proyek melakukan Pembukaan Kode Proyek sesuai dengan prosedur Pembukaan dan Revisi Kode Proyek / Program (FOP-700). Fungsi Manajemen Proyek menginformasikan kebutuhan transfer load ke Fungsi terkait dengan mengacu pada prosedur Penanganan Program & Transfer Load (SOP-002) (bila ada).</td><td></td></tr>
<tr><td>17</td><td>Pembuatan Jaminan Pelaksanaan & Jaminan Uang Muka</td><td>Tidak ada</td><td>Fungsi Pengawasan Pra Proyek melakukan pemantauan terhadap pembuatan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka yang dilakukan oleh Fungsi Pemasaran, mekanisme pembuatan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka mengacu kepada panduan penanganan Jaminan Proyek (BOG-001).</td><td></td></tr>
</table>

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

18	Penagihan Uang Muka	Tidak ada	Fungsi Pengawasan Pra Proyek melakukan pemantauan terhadap penagihan uang muka yang dilakukan oleh Fungsi Pemasaran, mekanisme penagihan uang muka mengacu kepada panduan ***penanganan Penagihan Proyek (BOG-002)***.	
19	Rapat Perdana dan Serah Terima Dokumen	Tidak ada	Fungsi Pengawasan Pra Proyek menghadiri kegiatan rapat perdana dan serah terima dokumen dari tim tender ke tim proyek yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Fungsi Pengawasan Proyek, mekanisme terkait rapat perdana dan serah terima dokumen mengacu kepada prosedur ***Manajemen Proyek (BOP-001)***.	
20	Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data	Tidak ada	Pada dasarnya setiap informasi sensitif (termasuk *costing*) harus dijaga dari akses pihak lain (termasuk fungsi kerja lain). Setiap peredaran dokumen dalam rangka pelaksanaan tinjauan Order/Kontrak/ Adendum harus dalam format PDF. Setiap peredaran dokumen yang terkait *costing* terutama *Project Income Statement (PIS)* harus ditandai *watermark* tertentu untuk memudahkan penelusuran sumber kebocoran data. Penyimpanan dokumen diupayakan hanya pada komputer, *server*, dan *cloud* milik perusahaan. Peredaran dokumen diupayakan dilakukan melalui saluran komunikasi data yang aman dan *traceable*.	
21	Tabel Hak Akses PIS Non PDF	Tidak ada	*Tabel 14. Fungsi Kerja yang Mendapatkan Hak Akses PIS Non PDF* No. / Fungsi Kerja / Kebutuhan / Lingkup Akses Informasi 1 / Fungsi Pemasaran / Pemasaran dan Penjualan / Aspek *costing* tertentu sesuai dengan kebutuhan 2 / Fungsi Pengadaan / Pengadaan / HPS/Harga Perkiraan Sendiri 3 / Fungsi SDM / Penempatan SDM proyek / Kelas proyek 4 / Fungsi Manajemen Risiko / Pengelolaan Risiko Proyek / Kelas proyek 5 / Fungsi Perencanaan Proyek / Eksekusi Perencanaan Proyek / Akses Penuh 6 / Fungsi Pengendali Anggaran / Monitoring Anggaran / Akses Penuh 7 / Fungsi Keuangan / Monitoring Anggaran / Copy Value 8 / Fungsi Pengawasan Pra Proyek / Perencanaan Proyek / Akses Terbatas	

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).
