PT Len Industri (Persero)	Halaman **1 dari 11**
SOP-009 **PENANGANAN ADENDUM KONTRAK**	Revisi: **00**

Disusun oleh :		Direviu oleh :	Disetujui oleh :
SVP Marketing & Sales Center Tanggal : 21-10-2025 Tanda Tangan : (Rita Dwi Handayani)	**SVP Project Deployment Center** Tanggal : 22-10-2025 Tanda Tangan : (Alfian Mahendra)	**Management Representative** Tanggal : 23-10-2025 Tanda Tangan : (Muhamad Daud Fahreza)	**Direktur Bisnis & Kerjasama** Tanggal : 24-10-2025 Tanda Tangan : (Irwan Ibrahim)
Plt. SVP Project Management Office Tanggal : 21-10-2025 Tanda Tangan : (Dani Rukmana)	**SVP Engineering & Project Planning** Tanggal : 22-10-2025 Tanda Tangan : (Laksono Widyo Isworo)	**GM Business Process Management** Tanggal : 23-10-2025 Tanda Tangan : (Yunika Sopandi)	

DAFTAR REVISI

No Revisi	Tanggal revisi	Halaman yang terkait	Paraf
00	24-10-2025	Semua halaman terbitan pertama	IS

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

DAFTAR ISI

1.0 TUJUAN 2
2.0 RUANG LINGKUP 2
3.0 DEFINISI 2
3.1 Adendum Kontrak 2
3.2 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2
3.3 Harga Pokok Penjualan (HPP) / Cost of Goods Sales (COGS) 2
3.4 Kontrak 3
3.5 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 3
3.6 Tinjauan Adendum Kontrak 3
3.7 Uji Kelayakan SMAP 3
3.8 Penyelenggara Rapat Tinjauan 3
3.9 Pemimpin Rapat Tinjauan 3
3.10 Peninjau Rapat Tinjauan 3
3.11 Perwakilan Struktural 4
3.12 Perusahaan 4
3.13 Pelanggan 4
3.14 Project Income Statement (PIS) 4
3.15 Proyek 4
3.16 Rapat Tinjauan 4
3.17 Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) 4
4.0 DOKUMEN TERKAIT 5
5.0 PROSEDUR/ISI 5
5.1 Tinjauan Adendum Kontrak 5
5.1.1 Rapat Tinjauan Adendum Kontrak 5
5.1.2 Rapat Tinjauan Anggaran Biaya Tambah (ABT) Adendum 7
5.2 Penandatanganan Adendum Kontrak 8
5.3 Penyimpanan Adendum Kontrak 8
5.4 Perubahan Anggaran 8
5.5 Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data 8
5.6 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) 9
6.0 FORMULIR TERKAIT 9
7.0 ALUR / FLOW 10
8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN 11

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

1.0 TUJUAN

Menjamin penyelesaian Adendum Kontrak secara tepat waktu, efektif, efisien dan menguntungkan Perusahaan.

2.0 RUANG LINGKUP

Prosedur ini dipergunakan sebagai acuan bagi Perusahaan dalam meninjau dan menyepakati draft Adendum Kontrak, serta sebagai acuan bagi pelaksana Proyek/pekerjaan dan fungsi kerja dalam merealisasikan setiap Adendum Kontrak yang terjadi.

3.0 DEFINISI

3.1 Adendum Kontrak

Adendum Kontrak merupakan perubahan, modifikasi, atau tambahan resmi terhadap ketentuan Kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Adendum Kontrak ini dapat mencakup perubahan dalam ruang lingkup pekerjaan, jadwal, harga, atau persyaratan lainnya yang relevan dengan Proyek.

3.2 Anggaran Biaya Tambahan (ABT)

Anggaran Biaya Tambahan (ABT) adalah alokasi dana ekstra yang diperlukan di luar anggaran awal untuk mengakomodir kebutuhan tak terduga atau perubahan dalam proyek. Biaya tambahan ini biasanya muncul akibat perubahan lingkup pekerjaan, peningkatan harga bahan dan/atau jasa, atau adanya kebutuhan mendesak yang sebelumnya tidak terencana.

Anggaran Biaya Tambahan (ABT) diperlukan untuk memastikan proyek tetap berjalan lancar dan memenuhi target waktu serta kualitas tanpa mengorbankan aspek penting lainnya.

3.3 Harga Pokok Penjualan (HPP) / Cost of Goods Sales (COGS)

Harga Pokok Penjualan (HPP) / Cost of Goods Sold (COGS) adalah total biaya langsung yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau penyediaan jasa yang dijual oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. HPP/COGS mencakup semua biaya yang terkait langsung dengan proses produksi, seperti biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang berhubungan langsung dengan produksi barang.

Dalam konteks bisnis, HPP/COGS merupakan komponen penting dalam menghitung laba kotor, karena laba kotor diperoleh dari selisih antara total pendapatan penjualan dengan HPP/COGS. Mengetahui HPP/COGS membantu perusahaan dalam menentukan harga jual yang kompetitif sekaligus memastikan bahwa penjualan menghasilkan keuntungan yang memadai.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.4 Kontrak

Kontrak adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak atau lebih untuk menciptakan kewajiban dalam penyediaan produk, jasa, atau hasil dalam suatu Proyek.

3.5 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

SMAP adalah sistem manajemen yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani risiko penyuapan.

3.6 Tinjauan Adendum Kontrak

Tinjauan Adendum Kontrak adalah proses evaluasi dan analisis terhadap perubahan yang diusulkan dalam Kontrak untuk memastikan bahwa modifikasi tersebut sesuai dengan persyaratan Proyek, mengelola risiko, serta memenuhi ketentuan hukum dan administratif yang berlaku.

3.7 Uji Kelayakan SMAP

Uji Kelayakan SMAP adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko penyuapan dalam suatu kegiatan, transaksi, Proyek, atau hubungan bisnis.

3.8 Penyelenggara Rapat Tinjauan

Penyelenggara Rapat Tinjauan adalah pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan rapat, termasuk mengundang peserta, membuka dan menutup rapat, serta mengelola administrasi rapat. Tugasnya mencakup pembuatan daftar hadir, notulensi, Sirkuler notulensi, pengarsipan, dan pemantauan tindak lanjut keputusan rapat.

3.9 Pemimpin Rapat Tinjauan

Pemimpin Rapat Tinjauan adalah pihak yang memimpin jalannya rapat, mengarahkan diskusi, dan mengambil keputusan terhadap isu-isu yang muncul selama rapat tinjauan.

3.10 Peninjau Rapat Tinjauan

Peninjau Rapat Tinjauan adalah pihak yang diundang untuk memberikan masukan terkait aspek yang dibahas serta membubuhkan paraf pada formulir terkait.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

3.11 Perwakilan Struktural

Perwakilan Struktural adalah staf yang ditunjuk untuk mewakili struktural yang berhalangan hadir dalam rapat tinjauan. Staf yang ditunjuk harus memiliki wewenang yang setara dengan atasannya serta kompetensi yang memadai agar dapat memberikan pendapat dan keputusan sesuai dengan aspek yang menjadi tanggung jawabnya dalam tinjauan.

Penunjukan perwakilan harus disampaikan oleh struktural yang berhalangan kepada Penyelenggara Rapat Tinjauan sebelum rapat berlangsung. Selain itu, staf yang ditunjuk tidak boleh merupakan penyusun dokumen yang akan ditinjau.

3.12 Perusahaan

Perusahaan adalah PT Len Industri (Persero) yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 442 Bandung.

3.13 Pelanggan

Pelanggan adalah individu atau organisasi yang menerima dan menggunakan produk, layanan, atau hasil yang dihasilkan dari suatu Proyek.

3.14 Project Income Statement (PIS)

Project Income Statement (PIS) adalah rencana anggaran biaya Proyek yang disusun untuk memperkirakan total biaya yang dibutuhkan dalam penyelesaian Proyek, mencakup biaya langsung dan tidak langsung.

3.15 Proyek

Proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau hasil yang unik.

3.16 Rapat Tinjauan

Rapat Tinjauan adalah rapat yang diselenggarakan untuk meninjau, mengevaluasi, dan menilai kinerja, proses, atau hasil dari suatu kegiatan/proyek, guna memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan.

3.17 Sistem Enterprise Resource Planning (ERP)

Sistem Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sebuah sistem perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengintegrasikan proses bisnis yang penting.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

ERP berfungsi untuk menyatukan data dan memfasilitasi alur kerja yang standar di berbagai departemen, seperti keuangan, sumber daya manusia, rantai pasokan, manufaktur, dan layanan pelanggan. Dengan adanya ERP, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, konsistensi data, serta mempermudah pengambilan keputusan karena data tersedia secara terpusat dan real-time.

4.0 DOKUMEN TERKAIT

- ***Memorandum Direktur Bisnis dan Kerjasama Nomor : 004/M/DB/IV/2022 perihal Peningkatan Aspek Keamanan Data Pada Tinjauan Order/Kontrak;***
- ***Nota Management Representative Nomor : 003/N/UN/II/2024 perihal Pembaharuan Pemetaan Fungsi Generik terhadap Unit Aktual;***
- ***Keputusan Direksi Nomor : 037/SKEP.HC/DU/II/2025 tentang Struktur Organisasi PT Len Industri (Persero) beserta Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi;***
- ***Prosedur Manajemen Proyek (BOP-001);***
- ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002);***
- ***Prosedur Uji Kelayakan SMAP (GOP-1103);***
- ***Prosedur Kajian Risiko Proyek (ROP-911);***

5.0 PROSEDUR/ISI

5.1 Tinjauan Adendum Kontrak

Apabila ada perubahan terhadap Kontrak, yang terdiri atas adanya perubahan dari syarat & ketentuan awal serta biaya, dapat diusulkan oleh pihak eksternal yaitu Pelanggan maupun pihak internal Perusahaan.

Fungsi Manajemen Proyek dan/atau Fungsi Pemasaran dapat mengajukan kelayakan Adendum Kontrak dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Fungsi Pengawasan Proyek dan Fungsi Perencanaan Proyek, hasil koordinasi terkait kelayakan Adendum tersebut didokumentasikan dalam ***Formulir Risalah Rapat (CFR-022).***

Apabila dari hasil koordinasi kelayakan tersebut dinyatakan bisa dilanjut ke proses Adendum, maka Fungsi Pengawasan Proyek dapat langsung menyelenggarakan Rapat Tinjauan Adendum Kontrak.

Namun apabila dinyatakan tidak layak Adendum maka proses dinyatakan selesai, dan apabila usulan tersebut dari eksternal maka Fungsi Pemasaran memberikan informasi kepada Pelanggan bahwa Adendum tidak dapat dilanjutkan.

5.1.1 Rapat Tinjauan Adendum Kontrak

Rapat Tinjauan Adendum Kontrak dilakukan untuk mengevaluasi berbagai aspek yang berubah dari Kontrak yang telah disepakati sebelumnya oleh berbagai fungsi yang terkait. Evaluasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa risiko akibat *contractual requirements* dalam Adendum Kontrak dapat dikendalikan.

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:57

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Adapun aspek-aspek yang dievaluasi dalam Rapat Tinjauan Adendum Kontrak meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Aspek Teknis;
- Aspek Costing;
- Aspek Legal;
- Aspek Risiko Proyek;
- Aspek Anggaran;
- Aspek Keuangan.

Rapat Tinjauan Adendum Kontrak dihadiri oleh para peserta dari fungsi terkait seperti tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 1. Peserta Rapat Tinjauan Adendum Kontrak

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin & Penyelenggara Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek
2	Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek
3	Pendukung Pemapar	• Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek
4	Peninjau Aspek Legal	Eselon I/II Fungsi Legal
5	Peninjau Aspek Risiko	Eselon I/II Fungsi Manajemen Risiko
6	Peninjau Aspek Keuangan	• Eselon I/II Fungsi Keuangan • Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran
7	Peninjau Aspek Teknis	Eselon I/II Fungsi Rekayasa Sistem

Pemimpin Rapat Tinjauan dapat mengundang narasumber dari fungsi lain untuk membahas aspek lainnya sesuai dengan Tabel berikut, apabila:

1. Terdapat perubahan pada aspek-aspek terkait;
2. Terdapat risiko tinggi pada aspek-aspek tersebut.

Tabel 2. Narasumber Rapat Tinjauan Adendum Kontrak

No.	Peran	Peserta
1	Narasumber Aspek Mutu	Eselon II Fungsi Penjaminan Mutu
2	Narasumber Aspek Ketersediaan Sumber Daya Manusia	Eselon I/II Fungsi SDM
3	Narasumber Aspek K3L & Sosial	Eselon II Fungsi K3L
4	Narasumber Aspek Tata Kelola (termasuk Anti Penyuapan)	Eselon II Fungsi Tata Kelola
5	Narasumber Aspek Pengadaan	Eselon I/II Fungsi Pengadaan

Struktural yang berhalangan hadir dalam Rapat Tinjauan Adendum Kontrak harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada Definisi 3.11.

Rapat Tinjauan Adendum Kontrak juga melakukan peninjauan terkait ada atau tidaknya perubahan HPP, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LENS untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

a. Apabila tidak terdapat kenaikan HPP, maka proses dilanjutkan pada Subbab 5.2 Penyusunan Draft Adendum Kontrak;
b. Namun apabila terdapat kenaikan HPP, maka Fungsi Pengawasan Proyek menyelenggarakan Rapat Tinjauan Anggaran Biaya Tambah (ABT) sesuai dengan Subbab 5.1.2 Rapat Tinjauan Anggaran Biaya Tambah (ABT).

Hasil Rapat Tinjauan Adendum Kontrak (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam ***Formulir Tinjauan Adendum Kontrak (SFR-025)*** Formulir ini diparaf oleh seluruh peserta rapat dan disampaikan dalam bentuk salinan kepada seluruh fungsi terkait sesuai dengan daftar peserta Rapat Tinjauan Adendum serta narasumber yang terlibat.

Fungsi Manajemen Proyek melakukan *updating* risiko Proyek pada ***Formulir Project Risk Register (RFR-002)*** berdasarkan hasil bahasan pada Rapat Tinjauan Adendum Kontrak.

Formulir-formulir tersebut disimpan selama selang waktu tertentu dengan mengacu pada ***Prosedur Informasi Terdokumentasi (COP-002)***.

5.1.2 Rapat Tinjauan Anggaran Biaya Tambah (ABT) Adendum

Rapat Tinjauan Anggaran Biaya Tambah (ABT) Adendum dihadiri oleh fungsi sesuai Tabel berikut :

Tabel 3. Peserta Rapat Tinjauan Anggaran Biaya Tambah (ABT) Adendum

No.	Peran	Peserta
1	Pemimpin Rapat Tinjauan	Direktur yang menandatangani Kontrak awal
2	Peninjau Aspek Keuangan	Direktur yang membidangi Fungsi Keuangan
3	Penyelenggara Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Pengawasan Proyek
4	Pemapar Rapat Tinjauan	Eselon I/II Fungsi Manajemen Proyek
5	Pendukung Pemapar	• Eselon I/II Fungsi Pemasaran • Eselon I/II Fungsi Perencanaan Proyek • Eselon I/II Fungsi Pengendali Anggaran • Eselon I/II Fungsi Keuangan

Penyelenggara Rapat Tinjauan dapat mengundang Direksi lain, dan narasumber dari fungsi lain apabila dibutuhkan. Struktural yang berhalangan hadir dalam rapat tinjauan ini harus mendelegasikan kepada Perwakilan Struktural sesuai dengan ketentuan pada Definisi 3.11.

Hasil Rapat Tinjauan Anggaran Biaya Tambah (ABT) Adendum (termasuk seluruh usulan dan pendapat) dicatat dalam ***Formulir Risalah Rapat (CFR-022)***.

Berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Anggaran Biaya Tambah (ABT) Adendum, maka dapat diambil keputusan sebagai berikut :

a. Apabila ABT Adendum tidak disetujui, maka Fungsi Manajemen Proyek didampingi Fungsi Pemasaran melakukan negosiasi ulang kepada Pelanggan ;
b. Namun jika ABT Adendum disetujui, proses dilanjutkan sesuai bab 5.2 Penandatangan Adendum Kontrak.

Dokumen tidak terkontrol apabila cetak aplikasi Lens. Untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

5.2 Penandatanganan Adendum Kontrak

Berdasarkan hasil Rapat Tinjauan Adendum Kontrak dan Rapat Tinjauan ABT Adendum (apabila ada), Fungsi Manajemen Proyek didukung oleh Fungsi Pemasaran dan Fungsi Legal melakukan penyusunan/revisi draft Adendum Kontrak.

Selanjutnya, Fungsi Manajemen Proyek bersama Fungsi Pemasaran dan Fungsi Legal, melakukan pembahasan draft Adendum Kontrak yang telah disusun bersama Pelanggan.

Setelah draft Adendum Kontrak disepakati oleh Pelanggan, selanjutnya dilakukan proses tanda tangan Adendum Kontrak, dimana Adendum Kontrak ditandatangani oleh Direktur Perusahaan yang menandatangani Kontrak awal (paraf pejabat Eselon I fungsi terkait, paraf pejabat Eselon II fungsi terkait, dan paraf pejabat Eselon I Fungsi Legal).

Adendum Kontrak yang telah ditandatangani oleh Direktur Perusahaan, selanjutnya diproses oleh Fungsi Pemasaran untuk memperoleh tanda tangan dari Pelanggan.

5.3 Penyimpanan Adendum Kontrak

Adendum Kontrak asli yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (Perusahaan dan Pelanggan) selanjutnya diserahkan oleh Fungsi Pemasaran kepada Fungsi Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya, Fungsi Sekretaris Perusahaan dapat mendistribusikan salinan Adendum Kontrak tersebut kepada :

a. Fungsi Pengawasan Proyek;
b. Fungsi Manajemen Proyek;
c. Fungsi terkait yang memerlukan.

5.4 Perubahan Anggaran

Apabila ada perubahan PIS akibat Adendum Kontrak tersebut selanjutnya Fungsi Pengawasan Proyek mengkoordinir proses perubahan anggaran pada Sistem ERP Perusahaan bersama Fungsi Perencanaan Proyek dan Fungsi Pengendali Anggaran.

5.5 Pembatasan Akses Informasi Sensitif & Peningkatan Keamanan Data

Setiap informasi sensitif (termasuk *costing*) harus dijaga agar tidak dapat diakses oleh pihak lain, termasuk fungsi terkait. Selain itu, setiap peredaran dokumen dalam rangka pelaksanaan tinjauan harus dilakukan dalam format PDF.

Setiap peredaran dokumen yang terkait dengan *costing*, terutama *Project Income Statement* (PIS), harus diberikan *watermark* khusus untuk memudahkan penelusuran apabila terjadi kebocoran data. Penyimpanan dokumen harus dilakukan hanya pada komputer, *server*, dan *cloud* milik Perusahaan. Peredaran dokumen harus dilakukan melalui saluran komunikasi data yang aman dan dapat ditelusuri (*traceable*).

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenQ untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

Fungsi tertentu diberikan hak akses terbatas terhadap dokumen dalam format non-PDF, sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugasnya, sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Fungsi Kerja yang Mendapatkan Hak Akses PIS Non PDF

No.	Fungsi Kerja	Kebutuhan	Lingkup Akses Informasi
1	Fungsi Pemasaran	Pemasaran dan Penjualan	Aspek *costing* tertentu sesuai dengan kebutuhan
2	Fungsi Pengadaan	Pengadaan	HPS/Harga Perkiraan Sendiri
3	Fungsi SDM	Penempatan SDM Proyek	Kelas Proyek
4	Fungsi Manajemen Risiko	Pengelolaan Risiko Proyek	Kelas Proyek
5	Fungsi Perencanaan Proyek	Perencanaan Proyek	Akses Penuh
6	Fungsi Pengendali Anggaran	Monitoring Anggaran	Akses Penuh
7	Fungsi Keuangan	Monitoring Anggaran	Copy Value

5.6 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di lingkungan perusahaan pada proses penanganan Adendum kontrak ini.


6.0 FORMULIR TERKAIT

- ***Risalah Rapat (CFR-022)***
- ***Project Risk Register (RFR-002)***
- ***Tinjauan Adendum Kontrak (SFR-025)***

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

7.0 ALUR / FLOW

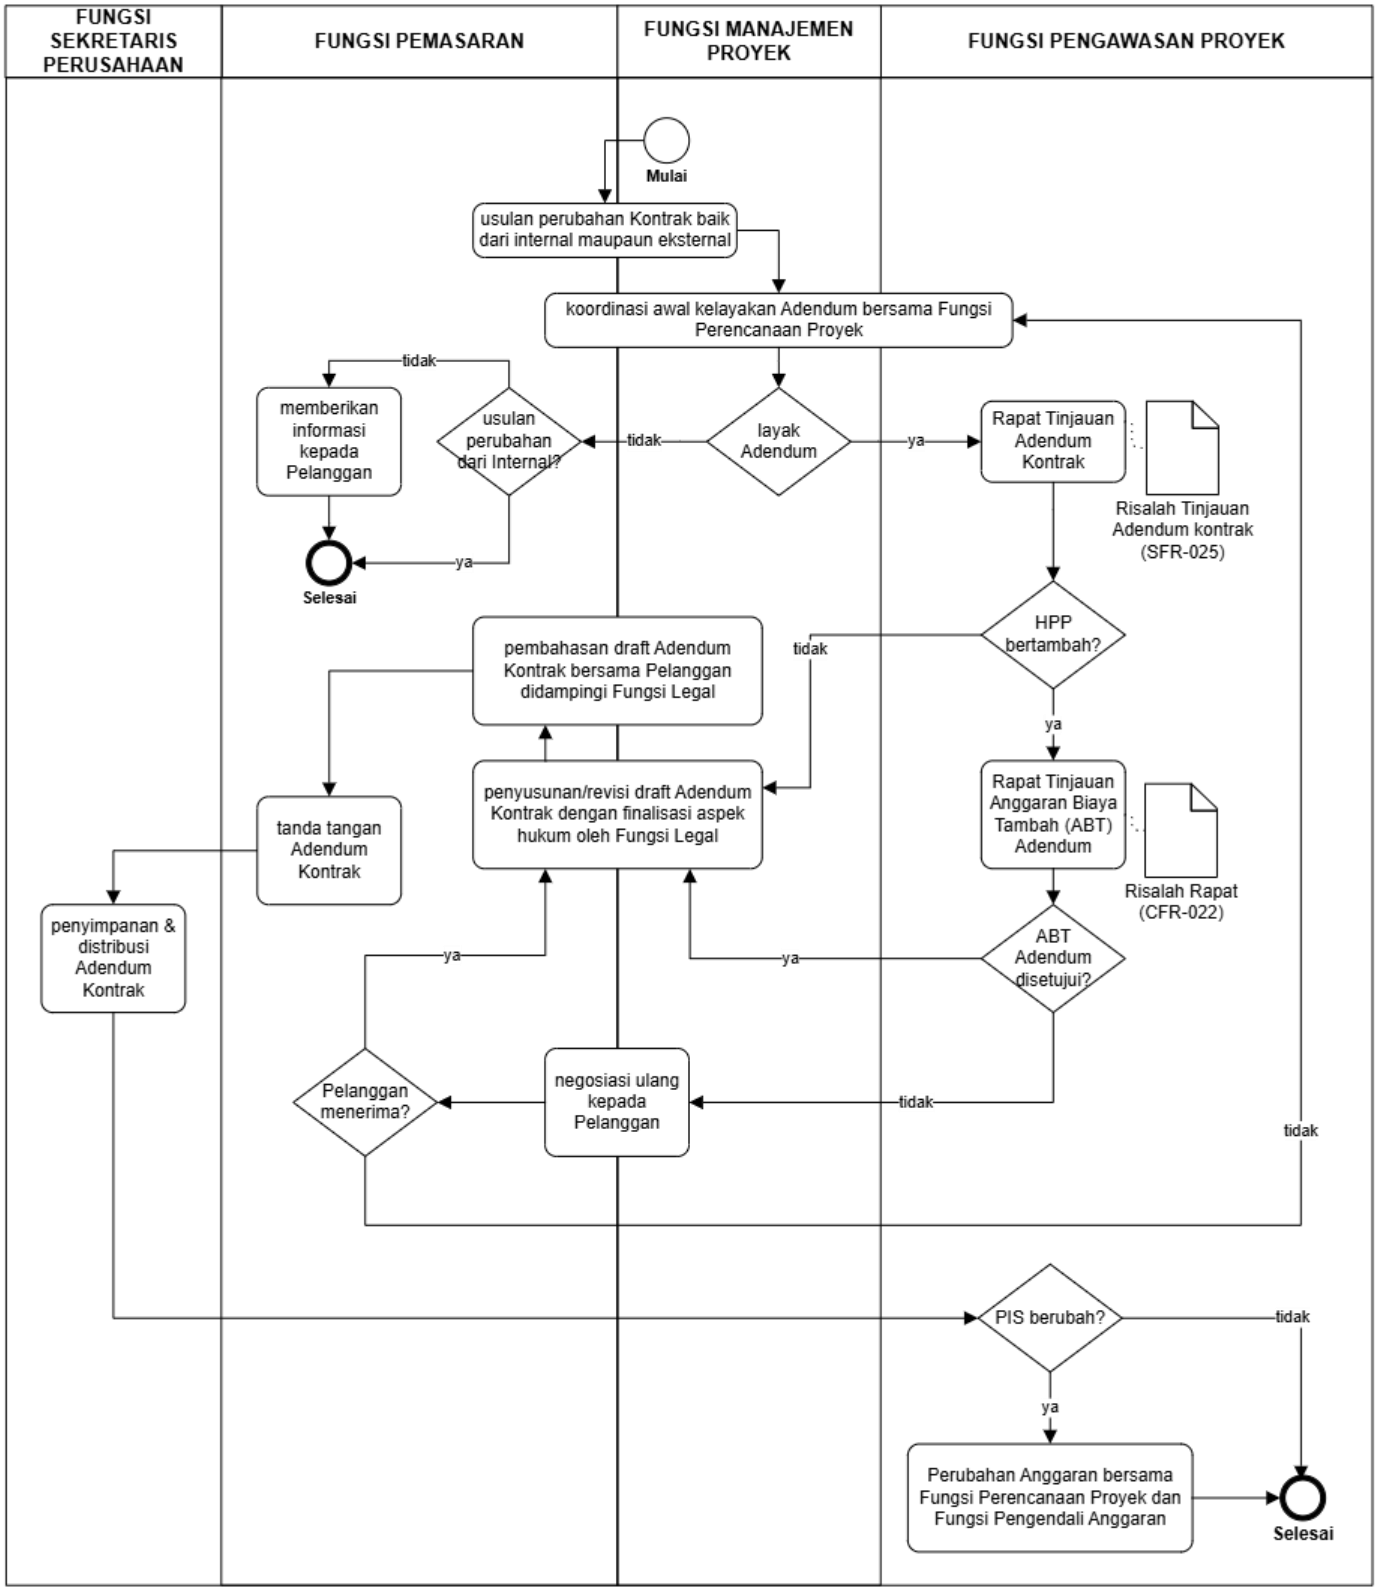

Flowchart : Penanganan Adendum Kontrak

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).

8.0 LAMPIRAN MATRIKS PERUBAHAN

No.	BAB dan SUB BAB	Versi Lama	Versi Baru	Keterangan

Dokumen tidak terkontrol, silahkan buka aplikasi LenO untuk melihat versi terbaru
26 OKT 2026 09:31

Semua informasi yang tercantum di dalam dokumen ini bersifat rahasia, hanya digunakan dalam lingkungan internal Perusahaan (*Internal Use*). Dilarang memperbanyak sebagian maupun seluruhnya, tanpa ijin tertulis dari PT Len Industri (Persero).
